

PODER LEGISLATIVO



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO
SUR

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº **170** PERÍODO LEGISLATIVO **2008**

EXTRACTO P.E.P - NOTA Nº 321/08 Adjuntando informe requerido
mediante Resolución de Cámara Nº 263/08 (solic. al P.E.P
informe s/ obras paralizadas y otros ítems).

Entró en la Sesión **20/11/2008**

Girado a la Comisión **CB**
Nº:

Orden del día Nº:



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur

República Argentina

PODER LEGISLATIVO
SECRETARIA LEGISLATIVA

05 NOV 2008

MESA DE ENTRADA
Nº 170

PODER LEGISLATIVO
PRESIDENCIA

7599

04.11.08

HORA: 18:50

FIRMA: [Firma]



321

NOTA Nº

GOB

USHUAIA, - 4 NOV. 2008

SEÑOR VICEPRESIDENTE 1º:

Tengo el agrado de dirigirme a Ud. en mi carácter de Gobernadora de la Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, con el objeto de remitirle en contestación a la Resolución Nº 263/08 de la Legislatura Provincial, Nota Nº 3051/08, Letra: MO y SP, emitida por la Secretaría de Coordinación y Control de Gestión, dependiente del Ministerio de Obras y Servicios Públicos, con la correspondiente documental mencionada en la misma, en un total de catorce (14) fs., e Informe S.L.y T. Nº 1766/08.

Sin otro particular, saludo al señor Vicepresidente 1º con atenta y distinguida consideración.

AGREGADO: Soporte Informático.-

[Firma manuscrita]

MARIA FABIANA RÍOS
GOBERNADORA

AL SR. VICEPRESIDENTE 1º

A CARGO DEL PODER LEGISLATIVO

Dr. Manuel RAIMBAULT

S _____ D.:

Recibido, 04/11/08.

Por el Sr. Dr. Manuel Raimbault

[Firma manuscrita]

Dr. MANUEL RAIMBAULT
Legislador
a cargo de la Presidencia
Poder Legislativo

Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur, dependientes de la Argentina



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

SECRETARÍA LEGAL Y TÉCNICA

"2008 - AÑO DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS"



USHUAIA, 31 OCT 2008

SEÑORA GOBERNADORA

S _____ / _____ D.-

Remito documentación que fuera recepcionada en esta Secretaría Legal y Técnica, dando respuesta a lo solicitado mediante Resolución N° 263/08 de la Cámara Legislativa de la Provincia, dada en sesión Ordinaria del día 18 de Septiembre de 2008, consistente en: Nota N° 3051/08, Letra: MO y SP, emitida por la Secretaría de Coordinación y Control de Gestión, dependiente del Ministerio de Obras y Servicios, con la correspondiente documental mencionada en la misma, en un total de catorce (14) fs.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en la Ley Pcial. N° 650, se acompaña soporte magnético conteniendo la información suministrada.

En consecuencia, correspondería remitir dicha información a la Legislatura de la Provincia.

1/5 INFORME S.L. y T. N° 1466 /08.

Dr. Eduardo Raúl Olivero
Secretario Legal y Técnico



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e

Islas del Atlántico Sur

República Argentina

MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS

"2008- AÑO DE LA ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS"



Nota n° 3051 /08
Letra MO y SP


Ref.: Resolución n° 263/08

USHUAIA, 30 OCT 2008

SECRETARIA LEGAL Y TECNICA


Dando cumplimiento a la nota n° 438/08 Letra S.L.y T. adjunto se remite la información requerida conforme siguiente detalle:

- Dirección de Certificaciones: 8 (ocho) planillas
- Dirección General de Obras Públicas: Informe n° 253/08, con 1 (una) planilla anexa.
- Informe n° 166/08 – UEP MO SP – PRO ME BA Provincial.
- Soporte Magnético (CD) conteniendo toda la información antes mencionada.


Hoy, Jorge PESARINI
Secretario Coord. y Control
de Gestión
M.O. y S.P.

SECRETARIA LEGAL Y TECNICA		L
ENTRADA:		F
30 OCT. 2008		
SALIDA:		31 OCT 2008

EXPT.	N°	OBRA	EMPRESA	MONTO CONTRATO	FECHA INICIO	PLAZO EJEC.	FECHA FINALIZ	N°	Importe CERTIF.	FALTANTE EJECUTAR	% Ejecutado	MONTO ACUMUL.	gastos Imprud.	Estado de Obra	Cantid. personal	Partida Presup.
7019/94	278	NUEVO PUERTO CALETA LA MISION	ORMAS ANDRADE GUTIERREZ	43156929,38	20-09-96	180 dias y 30 meses		28	28108171,00	15.048.758,38	65%	28108171,00	14452724,84	PARALIZADA		S/P
6677/94	254	NUEVO HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE	SITRA S.A	6.600.479,80	14-09-04	24 meses		1	270.975,55	3.581.079,98	45,75%	3.019.399,84		Neutralizada desde 01/01/08	17	s/partida 2008
13965/04								2	271.508,87							
15851/04								3	249.821,16							
17576/04								4	182.762,75							
660/05								5	195.487,15							
3527/05								6	209.060,23							
8608/05								7	116.800,70							
10142/05								8	111.512,39							
12898/05								9	127.492,79							
13499MO/05								10	142.777,75							
14999MO/05								11	159.907,78							
16823MO/05								12	118.443,88							
18146MO/05								13	137.011,33							
19517MO/05								14	33.010,78							
22948MO/05								15	30.708,48							
3498MO/06								16	48.556,30							
4428MO/06								17	97.927,84							
6204MO/06								18	69.149,05							
8118MO/06								19	19.543,68							
9979MO/06								20	11.495,13							
11543MO/06								21	16.366,05							
16032MO/07								22	120.107,42							
17786MO/07								23	137.986,04							
19552MO/07								24	77.018,96							
21462MO/07								25	65.188,00							
771mo/08																
3498MO/06	254	ADICIONALES NUEVO HOSPITAL REGIONAL RIO GRANDE	SITRA S.A	105.947,87				15	41.871,72	18.242,43	82,78%	87.706,44		Neutralizada desde 01/01/08	17	s/partida 2008
4428MO/06								16	27.522,63							
6204MO/06								17	3.801,17							
8118MO/06								18	3.644,98							
17786MO/07								22	10898,38							
19552MO/07								23	366,56							
841/04	64	COLEGIO PROVINCIAL JOSE MARTI 2da. ETAPA	CZELADA HECTOR M.	2.124.256,75	26-11-04	240 dias								E/I RESCISION		
16763/04								A.F	318.638,61	572.551,20	73,05%	1.661.706,55				
272/05								1	166.208,12							
3994/05								2	160.196,06							
7178/05								3	59.248,17							
10580/05								4	100.944,48							
41329/05								5	65.141,17							
13806XX/05								6	59.122,31							
								7	66.411,08							



MARIO JAIME PINTO
Director de Certificaciones
M.O.S.P


EXPT.	Nº.	OBRA	EMPRESA	MONTO CONTRATO	FECHA INICIO	PLAZO EJEC.	FECHA FINALIZ	Nº	Importe CERTIF.	FALTANTE EJECUTAR	% Ejecutado	MONTO ACUMUL.	gastos Imprud.	Estado de Obra	Cantid. personal	Partida Presup.
15406XX/05								8	35.482,94							
17590XX/05								9	48.674,12							
19205XX/05								10	47.580,11							
19637XX/05								11	92.862,94							
149XX/06								12	53.030,30							
153XX/06								13	28.194,71							
4971XX/07								14	568.918,03							
2173/04	76	PINTURA JARDIN DE INFANTES N° 3 RIO GRANDE	BERCETCHE VICTOR	45 077,02	15-09-04	30 dias		1	36.086,87	8.980,16	80,06%	36.086,87		PARALIZADA		S/P
14186/04																
10820/04	87	NUEVO EDIFICIO CENTRO DE SALUD N°1 USHUAIA	ARTECO S.A	644 290,38	21-12-04	120 DIAS		A.F.	128.858,08	106.793,22	83,42%	637.497,16		Neutralizada desde 30/04/07		S/P
028/05								1	69.523,18							
3460/05								2	10.878,80							
6924/05								3	61.983,39							
9019/05								4	89.247,24							
10916/05								5	107.251,32							
12708/05								6	32.230,19							
14258XX/05								7	64.262,06							
16017XX/05								8	27.508,77							
6803MO/06								9	27.959,30							
316XX/07								10	9.808,88							
2073XX/07								11	7.898,00							
3702XX/07								12	4.895,48							
5968XX/07								13	16.592,45							
9106XX/07								14	7.659,48							
10820/04	87	ADICIONAL	ARTECO S.A	52 464,00				10	715,00	26.481,78	49,56%	26.002,22		Neutralizada desde 30/04/07		S/P
316XX/07								11	9.402,24							
2073XX/07								12	4.895,49							
3702XX/07								13	3.530,00							
5968XX/07								14	7.659,49							
9106XX/07										28.926,00	0,00%			SIN INICIO		S/P
5898/04	90	TRABAJOS VARIOS 60VIVIENDAS TIRA 8 CASA 40	PATAGONIA CONSTRUC.	28 926,00	20-12-04	45 dias										
4829/04	91	AMPLIACIÓN DEFENSA CIVIL LAGO ESCONDIDO - USH	PATAGONIA OBRAS	293 749,00	20-12-04	120 dias		A.F.	58.749,80	116.170,00	60,79%	178.579,00		Neutralizada desde 02/09/06	19	S/P
15765/04								1	13.765,00							
5734/05								2	24.880,00							
8812XX/05								3	67.292,00							
10158/05								4	18.685,00							
13367MO/05								5	31.487,00							
14685XX/05								6	21.440,00							
16164MO/05								7	-4.500,00							
9982XX/07								8	5.570,00							
9982XX/07																
14094/04	99	READECUACION EDILICIAS ESCUELA LOS ANDES	SEGOVIA INGENIERIA S.A	259 818,22	25-02-05	90 DIAS		A.F.	77.945,47	25.630,00	90,14%	234.188,22		Trámite de Economía FINALIZADA		
17574/04								1	79.735,00							
9625/05								2	97.030,15							
11104/05																

MARIO JAIME PINTO
Director de Certificaciones
M.O.S.P.



EXPTÉ.	Nº.	OBRA	EMPRESA	MONTO CONTRATO	FECHA INICIO	PLAZO EJEC.	FECHA FINALIZ	Nº	Importe CERTIF.	FALTANTE EJECUTAR	% Ejecutado	MONTO ACUMUL.	gastos Imprud.	Estado de Obra	Cantid. personal	Partida Presup.
13048/05 18631XX/05								3 4	46.878,09 10.544,96							
12159/03 17447/04 6148/05 8089/05 11324/05 12888/05	100	COLOCACION DE ADOQUINES EN AREAS DE AIUMA	CAT MAG S.A.	166.604,75	28-12-04	60 dias		A.F 1 2 3 4	33.320,95 76.742,51 6.002,88 1.696,55 9.461,54	73.701,27	55,76%	92.903,48		PARALIZADA		S/P
12055/04 13742MO/05	112	AMPL. Y REFAC. CENTRO DE SALUD Nº 4 - USHUAIA	ECOMAT S.R.L.	269.897,23	23-05-05	120 dias		A.F	53.979,45	269.897,23	0,00%			SIN INICIO		S/P
13951/04 12746/05	113	J.M. SOBRAL-PINTURA INT.Y TRABAJOS VS. USHUAIA	EME S.R.L.	312.989,32	18-05-05	60 dias		A.F 1	62.597,86 221.675,16	91.314,16	70,83%	221.675,16		PARALIZADA		
16842XX/04	125	E.P.E.M Nº 4 RIO GRANDE ADICIONAL COMPLEMENTARIA	SEGOVIA ING	2.020.788,65 399.463,78 159.034,00		90 dias		A.F	606.236,80			2.020.788,65		TERMINADA CERTIF. E/T PAGOS A CTA		
14035MO/05 4432MO/06 6485MO/06 7947MO/06 11022MO/06 11583MO/06 13517ME/06 14375XX/06 16162XX/06 18857MO/06 20553MO/06 967MO/07 2350MO/07 4138MO/07 6357MO/07 11342MO/07 11668MO/07 12953MO/07 15003MO/07 17162MO/07 19039MO/07 19553MO/07 21441mo/07 700MO/08 6553MO/08 8164MO/08 10715mo/08	131	ESCUELA DE HOTELERIA Y GASTRONOMIA	PETROCON S.A.	4.435.323,87	08-02-06	18 MESES		A.F 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26	665.298,58 107.511,83 189.732,73 245.421,71 203.195,97 113.568,59 162.840,99 76.087,40 174.152,84 200.569,65 170.468,37 107.818,49 159.066,73 213.919,02 302.263,89 335.211,47 215.042,37 246.637,20 109.448,50 125.562,31 186.181,90 193.185,08 123.111,56 29.928,00 141.298,74 64.643,2 89.951,16	148.703,28	96,65%	4.286.620,59		Neutralizada desde 01/07/08	18	9030 421

MARIO JAIME PINTO
Director de Certificaciones
M.O.S.P.






EXPT.	N°	OBRA	EMPRESA	MONTO CONTRATO	FECHA INICIO	PLAZO EJEC.	FECHA FINALIZ	N°	Importe CERTIF.	FALTANTE EJECUTAR	% Ejecutado	MONTO ACUMUL.	gastos Imprud.	Estado de Obra	Cantid. personal	Partida Presup.
14001MO/06	182	REFACCION SERVICIO DE LABORATORIO TIRA 7 HRU	SUR CONSTR S R L	130 442,51	03-01-07	20 dias		A.F	19.586,38	10.313,20	92,09%	120.129,31			17	
2152XX/07								1	16.375,36							
3925XX/07								2	29.637,15							
6323XX/07								3	44.880,42							
9463XX/07								4	1.992,31							
11764XX/07								5	27.264,07							
12294mo/06	184	REPARAC. VS. COLEGIO PROVINCIAL LOS ANDES USH	NAVARRO LUIS GONZALO	40 394,76	04-01-07	45 dias		A.F	6.059,21	4.412,00	89,08%	35.982,76		Neutralizada desde 31/03/07	1	S/P
4047XX/07								1	34.744,76							
5965XX/07								2	1.238,00							
16309MO/06	189	INTERV.06/07 REFACCIONES VS. ESCUELA N°1 USHU	CONSTRUCTORA tdf	247 937,23	23-01-07	45 dias	08-03-07	A.F	37.190,58	80.080,34	67,70%	167.846,88			4	S/P
734mo/07								1	19.383,00							
2138XX/07								2	95.635,80							
4163XX/07								3	52.828,09							
6555XX/07																
11734MO/06	191	VEREDAS ESCUELA 9 y 24 y DEPOSITO ESC. 9 USHUAIA	MATTEO A CARLOS	335 000,00 312 500,00	24-01-07	60 dias	01-12-07	A.F	50.250,00	40.846,32	86,93%	271.664,88		PARALIZADA	5	S/P
135mo/07								1	132.617,62							
2493XX/07								2	111.766,75							
4206XX/07								3	11.667,31							
6665XX/07								4	15.603,00							
8719XX/07																
17658MO/06	192	EDIFICIO ENSEÑANZA INICIAL B° RIO PIPO - USHUAIA	INVERSUR SRL	2 575 946 75	04-06-07	120 dias		A.F	901.581,36	1.843.643,69	28,43%	732.303,06		Neutralizada desde 01/07/07	32	S/P
13430XX/07								1	732.303,06							
11284MO/06	195	REFACCIONES CASA 130 INTEVU XIV USHUAIA	MATTEO ANGEL CARLOS	96 500,00	27-02-07	30 dias		A.F	14.475,00	86.485,95	10,38%	10.014,05		Neutralizada desde 22/03/07	1	S/P
6663XX/07								1	10014,05							
17787XX/06	198	CENTRO DE SALUD N° 2 - USHUAIA	PATAGONIA OBRAS	395 306,23	26-02-07	120 dias	25-06-07	A.F	59.295,93	322.179,88	18,50%	73.126,35		NEUTRALIZADA		S/P
21336MO/06								1	45.426,60							
6645XX/07								2	16.875,80							
11461XX/07								3	10.823,95							
11462XX/07																
16815MO/06	202	INTERVENCION 06/07 REF. y CAMBIO SOLADO ESC.39	PATAGONIA OBRAS	376 016,10	07-05-07	45 dias	14-12-07	A.F	56.402,42	367.696,10	2,21%	8.320,00		NEUTRALIZADA	26	S/P
1387mo/07								1	8.320,00							
11831mo/07																
9721MO/06	203	TRABAJOS DE CONSERV. EN EL MHN CAPILLA CANDEL.	SOSA ANTONIO	443 877,40	08-05-07	180 dias	03-11-07	A.F	66.581,61	170.928,88	61,49%	272.947,52		Neutralizada desde 01/12/07	5	UGG 9019
11591MO/07								1	35.164,11							
13556MO/07								2	35.878,55							


MARIO JAJUE PINTO
Director de Certificaciones
M.O.S.P.

EXPT.	N°.	OBRA	EMPRESA	MONTO CONTRATO	FECHA INICIO	PLAZO EJEC.	FECHA FINALIZ	N°	Importe CERTIF.	FALTANTE EJECUTAR	% Ejecutado	MONTO ACUMUL.	gastos Imprud.	Estado de Obra	Cantid. personal	Partida Presup.
14957MO/07								3	30.189,98							
16574MO/07								4	55.737,04							
17907MO/07								5	58.884,01							
19822MO/07								6	37.927,71							
21788MO/07								7	19.366,08							
12157MO/08	204	EVACUACION DE EFLUENTES CLOACALES ESC.AGR.	SOSA ANTONIO	230.835,60		180 dias		A.F	34.625,34	230.835,60				SIN INICIO	8	S/P
17353MO/08	206	GINNASIO ESCUELA 31 -USHUAIA	SEGOVIA INGENIERIA	4.180.825,00	27-02-08	365 dias	25-02-09	A.F	838.165,00	3.453.204,12	17,40%	727.620,98		Neutralizada desde 01/06/08	8	S/P
2747MO/07								1	120.807,99							
3270xx/08								2	188.434,38							
4896XX/08								3	360.830,29							
6558XX/08								4	59.948,22							
8727XX/08																
20362MO/08	208	PULIDO DE PISOS ESC. PROV. JUANA MANSO	SUR CONSTRUCTORA	380.956,60	20-03-07	45 dias	07-04-08	A.F	380.956,60	22.713,93	94,04%	358.242,67		PARALIZADA		
4915MO/07								1	61.229,80							
6238XX/07								2	20.300,00							
8452XX/07								3	42.300,00							
13041XX/07								4	63.200,00							
14766XX/07								5	93.274,42							
1507xx/08								6	50.727,89							
3317xx/08								7	27.210,76							
4924xx/08																
19987MO/08	210	AMPLIACION ALCAIDIA - RIO GRANDE	EDERLE CEFERINO	501.922,80	21-05-07	120 dias	17-09-07	A.F	75.288,42	246.143,17	50,96%	255.779,63		Neutralizada desde 17/01/08	4	S/P
5500MO/07								1	20.006,84							
13419MO/07								2	30.905,08							
14883MO/07								3	41.173,20							
16349MO/07								4	74.872,08							
17906MO/07								5	88.823,33							
416MO/08																
4962XX/04	211	NUEVO CENTRO DE SALUD N°3 - USHUAIA	PATAGONIA OBRAS	559.921,26		120 dias		A.F	83988,19	559.921,26				SIN INICIO		S/P
16807MO/08	213	INTERVENCION 06/07 ESCUELA N°1 KAYU CHENEN USH.	MARQUEZ SEGUNDO	72.714,52	23-04-07	45 dias		A.F	10.907,18	38.253,54	50,14%	36.460,98		PARALIZADA	1	S/P
5583MO/07								1	36.460,98							
12037XX/07																
3990MO/08	214	HUELLA N°7 DE CIRCUNV. EN TURBERA YAC.CEMINARIO	FURLOTTI y MANSILLA s h	72.734,75		30 dias				72.734,75	0,00%					
3991MO/08	215	HUELLA N°3,4 Y 5 MEJ.TRAZA EXIST. TURBERA VALDEZ	FURLOTTI y MANSILLA s h	190.957,20	08-05-07	30 dias				15.514,32	91,88%	175.442,88		Neutralizada		
12212MO/07																
3992MO/08	216	HUELLA N°2 CONCES.MINERAS DE ORDOÑEZ-MANCARDO	FURLOTTI y MANSILLA s h	50.656,06						50.656,06	0,00%			SIN INICIO		
39987MO/08	217	HUELLA N°9 DE CIRC.EN TURBERA YACIM. TEUBER D.	FURLOTTI y MANSILLA s h	72.794,20		30 dias				72.794,20	0,00%			SIN INICIO		



MARIO JAURE PINTO
Director de Certificaciones
M.O.S.P.

EXPTÉ.	Nº.	OBRA	EMPRESA	MONTO CONTRATO	FECHA INICIO	PLAZO EJEC.	FECHA FINALIZ	Nº	Importe CERTIF.	FALTANTE EJECUTAR	% Ejecutado	MONTO ACUMUL.	gastos Imprud.	Estado de Obra	Cantid. personal	Partida Presup.
3989MO/06	218	HUELLA N°8 DE CIRC.EN TURBERA YACIM.OLDENBURG	FURLOTTI y MANSILLA s.h	72.794,20		30 dias				72.794,20	0,00%			SIN INICIO		
17682mo/06	219	AMPLIACION ESCUELA N° 6 LAGO ESCONDIDO	CONSTRUCTORA TDF	828.292,75	08-05-08	150 dias	04-10-08			807.899,80	2,49%	20.692,95		Neutralizada desde 02/06/08		
2257MO/07								A.F.	124.243,91							
8098XX/08								1	20.592,95							
667MO/07	221	SALA DE DERIVACIONES HANGAR AERONAUTICA A.I.U.M.A	GUILLIN MARCELA	35.615,17		45 dias				35.615,17	0,00%	0,00		SIN INICIO		
3993MO/06	223	HUELLA N°1 CONCES.MINERAS DE ORDOÑEZ-MANCARDO	FURLOTTI y MANSILLA s.h	50.856,06	08-05-07	30 dias				50.856,06	0,00%	0,00		Neutralizada desde 11/05/07		
19668MO/06	224	AMPLIACION CONSULTORIOS EXTERNOS H.R.U.	GIRO CONSTR. S.A.	8.397.908,00		365 dias				8.397.908,00	0,00%	0,00			123	UGG 4530 INC 042 S/P
17537MO/07								A.F.	1.259.686,20							
3025XX/03	225	CENTRO DE SALUD TOLHUIN - ACCESO PRINCIPAL	JD CONSTRUCC. SACIFIA	59.323,70	01-09-07					59.323,70	0,00%	0,00		EJECUTADA SIN CERT.		
18764MO/06	226	REFAC. EN ESCUELA, ANEXO I QUINCHO Y COMEDOR DE PC	CONSTRUCC. BET-EL SRL	101.707,00		30 dias				101.707,00	0,00%	0,00		SIN INICIO		
1344MO/07	227	AMPL. S.U.M. AREA ADMIN. ESC. N° 5 JM BEAUVOIR TOLHU	MOLINA JAIME EDUARDO	328.093,80	Constat. 16/08/07 100%			1	295.046,45	33.047,35	89,93%	295.046,46		PARALIZADA	2	UGG 9063 INC 042
21440mo/07																
18757MO/07	01/08	REFAC.VARIAS ESC. N° 22 JIN 7 Y CAAD - USHUAIA	MATTEO ANGEL C.	192.576,00	22-01-08	45 dias 30 dias +	06-03-08 05-04-08	1	22.810,81	118.114,40	38,67%	74.461,80		Tramite de rescisión	5	
1411xx/08								2	24.324,19							
3215xx/08								3	21.143,50							
4957XX/08								4	2.507,32							
6455xx/08								5	3.589,81							
7829xx/08								6	65,97							
10410xx/08																
18758MO/07	02/08	REFAC.VARIAS ESC. N° 15 Y JIN 8 - USHUAIA	KEFREN CONSTR SRL	123.753,30	22-01-08	45 dias	06-03-08	1	52.069,55	0,00	100,00%	123.753,30		TERMINADA	7	UGG 9009 INC 042
1423XX/08								2	57.455,90							
3056XX/08								3	14.227,85							
8503MO/08																
18780MO/07	03/08	REFAC.VARIAS ESC. N° 16 DR. ARTURO BASS - USHUAIA	MATTEO ANGEL C	145.700,00	22-01-08	45 dias 30 dias +	06-03-08 05-04-08	1	22.705,09	104.708,63	28,13%	40.990,37		Tramite de rescisión	5	
1355xx/08								2	11.190,28							
3273xx/08								3	7.095,00							
6678xx/08																
18763MO/07	05/08	REFAC.VARIAS ESC. N° 3, 13 Y N° 34 - USHUAIA	KEFREN CONSTR SRL CON EC DEM ADIC.	271.161,93 259.313,00	22-01-08	45 dias	06-03-08	1	34.078,60	0,00	100,00%	259.313,00		TERMINADA		
1424XX/08								2	145.696,20							
3057XX/08								3	79.538,20							
21634MO/07	11/08	RE-ACONDIC.EDIFICIOS PUBLICOS ESC. GRUPO 3 R. GDE.	OCISER S.A	428.523,00	21-02-08	30 dias 20 dias +	21-03-08 09-04-08	1	313.287,92	0,00	100,00%	428.523,00		TERMINADA	4	UGG 9002 INC 042
3357mo/08								2	115.235,08							



MARIO JAIME PINTO
Director de Certificaciones
M.O.S.P.

EXYTE.	N°.	OBRA	EMPRESA	MONTO CONTRATO	FECHA INICIO	PLAZO EJEC.	FECHA FINALIZ	N°	Importe CERTIF.	FALTANTE EJECUTAR	% Ejecutado	MONTO ACUMUL.	gastos Imprud.	Estado de Obra	Cantid. personal	Partida Presup.
21635MO/07 3368mo/08	12/08	RE-ACONDIC.EDIFICIOS PUBLICOS ESC. GRUPO 4 R. GDE.	LETTERIO CIFALA	406 982,70	21-02-08	30 dias 20 dias +	21-03-08 09-04-08	1	200 485,52 205 497,18	0,00	100,00%	406 982,70		TERMINADA	2	UGG 9003 INC 042
18784MO/07	13/08	AMPLIACION DEPOSITO Y ARCHIVO ESCUELA N° 9 - USH.	GARCIA PATRICIA E	25 268,00	27-02-08	45 DIAS				0,00	0,00%	0,00		Trámite de rescisión	1	
2728MO/07	15/08	AMPL. AREA SALUD MENTAL/PAC. CRONICOS H.R.R.G.	SITRA S.A	2.966 403,33	25-04-08	12 meses	25-04-09	A.F.	444 960,50	2.546 926,95	14,14%	419 474,38		Neutralizada Desde el 20/06	17	S/P
6596MO/08 8278MO/08 9334MO/08								1 2 3	224 972,07 174 893,73 19 608,58							
21636MO/07 4482mo/08	17/08	RE-ACONDIC.EDIFICIOS PUBLICOS ESC. GRUPO 5 R. GDE.	MAKE	361 772,00	05-03-08	30 dias	03-04-08	1	206 820,08	154 961,92	57,17%	206 820,08		EJECUCION	2	UGG 9004 INC 042
1704MO/07 11544MO/07	18/08	ESC. N° 16 AMPLIACION COMEDOR Y BIBLIOTECA USH.	SEGOVIA ING	1 052 506,91		270 dias		A.F.	157 876,04	0,00	0,00%	0,00		SIN INICIO	12	UGG 9016 INC 042
21637MO/07 6118MO/08	20/08	RE-ACONDIC.EDIFICIOS ESCOLARES GRUPO 6 R. GDE.	TRANSCONTROL	412 168,00	15-03-08	30 dias 20 dias +	13-04-08 30-05-08	1 2	129 527,63 42 359,88	240 280,46	41,70%	171 887,65		EJECUCION	8	UGG 9005 INC 042

MARIO JAIME PINTO
Director de Certificaciones
M.O.S.P.





Gobernación de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina
MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS PÚBLICOS
DIRECCIÓN GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS



Cde. Nota N°438/08.-
Letra: S. L. y T.
(Inf. N° 253./08) - Insp.
S/Obras paralizadas.-

Ushuaia, 24 de octubre de 2008.-

Sr. Director Gral.
Arqº. Héctor DOMINGUEZ.

Dando cumplimiento a lo requerido por el señor Subsecretario de O.P.Z.S., se ha extractado del listado suministrado por la Dirección de Certificaciones la información concerniente a las obras en las que tiene intervención esta Dirección y se ha confeccionado una planilla en la cual, a modo complementario, se responde respecto de lo solicitado por la Legislatura en:

- Punto 1) Se identificaron las obras que se encuentran a la fecha inconclusas y/o sin inicio.
- Punto 4) Se indicaron los motivos por los cuales no se continua a la fecha con la ejecución de la obra.
- Punto 5) Se indican las fechas desde y hasta cuando se han neutralizado los plazos de obra, y de finalización de los plazos de obra.
- Punto 7) Se indica en cual obra existe presentación de reclamo por gastos improductivos e intereses. La cual esta siendo analizada en este Ministerio.
- Punto 8) Habiéndose efectuado una sola presentación el monto a la fecha es único.
- Punto 10) Se reitera lo consignado en punto 7.
- Punto 11) Se indica que esta información esta consignada en los formularios AFIP 931, que son presentados mensualmente por las contratistas en la Dirección de Certificaciones al momento de presentar las Actas de Medición.

M.M.O. Jorge Omar DELGADO
Director de Inspección
Dirección Gral. de Obras Públicas
M.O. y S.P.

Señor Subsecretario
O.P.Z.S.

Munro Jorge A. Pelacios

Elaboro en su honoraria y consigno el
informe precedente.


Arqº DOMINGUEZ HECTOR A.
DIRECTOR GENERAL DE OBRAS PÚBLICAS

DIRECCION DE INSPECCION - D.G.O.P. MO Y SP							IMPRODUCTIVOS PRESENTADOS	
Numero	Expte	OBRA	MONTO	EMPRESA	ESTADO DE LA OBRA	MOTIVOS		
64	841/XX/04	COLEGIO PROVINCIAL JOSE MARTI 2DA ETAPA	\$ 2.124.256,75	OZELADA HECTOR M.	Contrato Rescindido.	Por Culpa del Contratista según Decreto N° 2171/08		
87	10.820/04	NUEVO EDIFICIO CENTRO DE SALUD N°1	\$ 644.290,38	ARTECO S.A	Neutralizada hasta el 30/09/07.	Sin Reinicio por reclamo de la contratista de reformular el contrato ante la desactualización los precios unitarios.		No presentados a la fecha
		NUEVO EDIF. CENTRO DE SALUD N°1- ADICIONAL	\$ 52.464,00		Sin reinicio desde el 01/10/07			
91	4.829/04	AMPLIACION DEFENSA CIVIL LAGO ESCONDIDO	\$ 293.749,00	PATAGONIA OBRAS	Neutralizada hasta el 06/11/07 Sin Reinicio desde 07/11/07	Sin Reinicio por inacción de la Empresa.		
100	12159/03	COLOC. ADOQUINES EN AREAS AJUAMA	\$ 166.604,75	CAT. MAG. S.A.	Neutralizada desde el 14/05/05 sin reinicio.	Sin fecha definida para el Reinicio.		
112	12055/xx/04	AMPLIACION Y REFACC. CENTRO SALUD N°4	\$ 269.897,23	ECOMAT S.R.L.	Neutralizada desde el 27/05/05 sin reinicio.	Sin fecha definida para el Reinicio.		
113	13951/04	J.M. SOBRAL PINTURA INT Y TRABAJOS VS	\$ 312.989,32	EME S.R.L.	Neutralizada desde el 21/12/05 sin reinicio.	Sin fecha definida para Reinicio.		
182	14001-MO-06	REFACCION SERVICIO DE LABORATORIO TIRA 7	\$ 130.442,51	SUR CONSTRUCTORA	Plazo Vencido desde el 28/06/08	Por inacción de la empresa.		
184	12234/MO/06	REPARACIONES VARIAS CP LOS ANDES	\$ 40.394,76	NAVARRO LUIS GONZALO	Neutralizada desde el 31/03/07 Sin Reinicio.	Sin Reinicio por inacción de la Empresa.		
191	11734/MO/06	VEREDAS ESCUELA N°9 Y 24 Y DEPOSITO ESC. 9	\$ 335.000,00	MATTEO ANGEL	E/T de Rescisión de contrato	Por inacción de la empresa.		
192	17658/MO/06	EDIFICIO ENSEÑANZA INICIAL RIO PIPO USHUAIA	\$ 2.575.946,75	INVERSUR S.R.L.	Neutralizada desde 01/01/07 sin Reinicio.	Sin Reinicio por inconvenientes en pagos de Anticipos Financiero y Certificado de Obra.		
195	11.264/MO/06	REFACCIONES CASA 130 INTEVU	\$ 96.500,00	MATTEO ANGEL	Neutraliza desde el 22/03/07 Sin Reinicio.	Por superposición de obras		
198	17767/XX/04	CENTRO DE SALUD N°2 USHUAIA	\$ 395.306,23	PATAGONIA OBRAS	Neutralizada desde el 01/09/07 Sin reinicio	Reclamo de gastos improductivos e intereses por mora en pago de Certificado de obra	Gastos Improductivos: \$88.034,74 Intereses: \$9.368,59	
202	16.815/MO/06	INTERV. 06/07 REFACC. CAMBIO SOLADO ESC39	\$ 376.016,10	PATAGONIA OBRAS	Neutralizada hasta 14/12/07 Sin Reinicio desde el 15/12/07	Por inacción de la Empresa		
206	17.353/MO/06	GINNASIO ESCUELA N°31			Neutralizada Hasta el 30/09/08 Sin Reinicio Desde el 01/10/08	Sin Reinicio por inacción de la Empresa. Por demoras en pagos de Certificados de obra		
208	20.362/MO/06	PULIDO DE PISOS Y REFACC. VAS. ESC. N°31	\$ 4.180.825,00	SEGOVIA INGENIERIA S.A.	Plazo Vencido Desde el 08/04/08	Por inacción de la empresa		
211	4962/XX/04	SINUEVO EDIFICIO CENTRO DE SALUD N°3	\$ 556.921,26	PATAGONIA OBRAS	Sin Inicio.	Sin inicio por inacción de la Empresa y falta de partida presupuestaria		
213	18807/MO/06	INTERV. 06/07 ESC. N°1 KAYU CHENEN REFAC. INT	\$ 72.714,52	MARQUEZ (CONO SUR)	Neutralizada desde el 31/07/07 sin reinicio.	Definición de aplicación o no de multa en curso		
219	17682/MO/06	AMPLIACION ESC. N°6 LAGO ESCONDIDO	\$ 828.292,75	CONSTRUCTORA TDF	Neutralizada Hasta el 30/09/08 Sin Reinicio Desde el 01/10/08	Por inacción de la Empresa, que ha solicitado extensión de neutralización y reclamo intereses en pago de certificado de obra	Se solicito reformular el reclamo por errores en su formulación	
221	667/MO/07	SALA DE DERIVACIONES HANGAR AERONAUTICA	\$ 35.615,17	GULLIN MARCELA	E/T de Rescisión de contrato	Por inacción de la Empresa		
224	19599/MO/06	AMPL. CONSULTORIOS EXT. H.R.U.	\$ 8.397.908,00	GIRO CONSTRUCCIONES	Sin Inicio.	Sin inicio por inconvenientes en pago de anticipo financiero y falta de partida		
01/08	18.757/MO/07	REF. VS. ESC. N°22- JARDIN N°7 Y C.A.D.	\$ 192.576,00	MATTEO ANGEL	E/T de Rescisión de contrato	De común acuerdo con la Empresa		
03/08	18760/MO/07	REFACC. VS. ESCUELA N°16 DR. ARTURO BASS	\$ 145.700,00	MATTEO ANGEL	E/T de Rescisión de contrato	Por inacción de la Empresa		
13/08	18764/MO/07	AMPLIACION DEPOSITO Y ARCHIVO ESC. N°9	\$ 25.268,00	GARCIA PATRICIA E.	Rescisión de Contrato.	Por inacción de la Empresa		
18/08	1704/MO/07	AMPL. COMEDOR Y BIBLIOTECA ESCUELA N°16	\$ 1.052.506,91	SEGOVIA INGEN. S.A.	Sin Inicio.	Sin Inicio, permiso de Obra en trámite		

Nota I: el concepto neutralización de plazo implica la suspensión del plazo de la obra de común acuerdo con la empresa contratista.

Nota II: Respecto de gastos improductivos las únicas presentaciones formuladas a la fecha son las indicadas.


M.M.O. Jorge Omar DELGADO
Director de Inspección
Dirección Gral. de Obras Públicas
M.O. y S.P.





Provincia de Tierra del Fuego, Antártica
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

**MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS**
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL



Cde. Nota N° 43/08 -
Letra: S.L. y T.
Inf. N° 44/08 - UEP MO SP
PRO.ME.BA. PROVINCIAL

USHUAIA, 30 de Octubre de 2008.-

Señor
Coordinador Administración Financiera
Lic. Gabriel H. MORONI

Se eleva la presente en respuesta a lo solicitado mediante la Nota del corresponde, indicando que la misma posee fecha de ingreso a esta Unidad Ejecutora Provincial el día 28 de Octubre de 2008.-

A fin de cumplimentar con lo requerido en el artículo 1º.- de la Resolución N° 263/08 de la Legislatura Provincial, se detallan a continuación las Obras contratadas con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos, a través de esta U.E.P., que se encuentran Neutralizadas:

1) **Obra: "CUARTEL DE BOMBEROS VOLUNTARIOS DELEGACIÓN CHACRA II – RÍO GRANDE" - Empresa: JLC CONSTRUCTORA S.A.**

2) Partida presupuestaria: Mayo/2005 = 003 016 105 042 002
Febrero/2007 = 003 013 104 042 002

3) Monto contratado originalmente = \$ 550.313,86
Plazo de finalización original = 180 días
Adicional = \$ 36.759,57

4) y 5) Neutralizada por:
Resolución M.O. y S.P. N° 253/05 – desde el 01/06/05 hasta el 26/08/05 por razones climáticas
Resolución M.O. y S.P. N° 385/05 – desde el 26/08/05 hasta el 01/09/05 por razones climáticas
Reinicio: 01/09/05
Resolución M.O. y S.P. N° 227/06 – desde el 05/05/06 por falta de pago
Reinicio: 03/04/07
Resolución M.O. y S.P. N° 348/07 – desde el 01/06/07 hasta que las condiciones climáticas mejoren
Reinicio: 16/10/07
Resolución M.O. y S.P. N° 32/08 – desde el 18/12/07 por falta de pago

6) El grado de avance a la fecha de la última neutralización es del 54,68 %

7) Importe de carácter de gasto improductivo de la obra: La empresa cotiza en el análisis de precios un 15% de gastos generales.

8) Total en carácter de gasto improductivo: ver respuesta al punto 10

9) Partida presupuestaria a la que se afectaran los gastos improductivos: ver respuesta al punto 10


10) Si esta efectuado el pago por gasto improductivo, o en su caso, detallar monto adeudado teniendo en cuenta los intereses punitivos.

///...1



Provincia de Tierra del Fuego, Antártica
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina

2008 - AÑO DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS



**MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS**
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL

///...2

Con respecto a los puntos que anteceden (8 a 10), cabe indicar que la empresa a la fecha no ha peticionado el pago por el concepto gasto improductivos, motivado en razón de las neutralizaciones obrantes en las actuaciones, las cuales conforme se desprende de la respuesta de los puntos 4 y 5, las mismas obedecen a diversos motivos.

Ello conlleva a determinar la improcedencia en esta instancia de afectar partida presupuestaria, y/o realizar la cuantificación por dicho concepto, toda vez que conforme las normas de aplicación, previamente debe existir un reclamo formal de la empresa y su análisis pormenorizado a los fines de determinar la procedencia, máxime destacando que el concepto que encierra los llamados gastos improductivos o generales tal lo cotiza la empresa, encierra un conjunto de gastos que en atención al avance de obra podrían estar amortizados.

11) Se informa que para los trabajos realizados en el transcurso del mes de Noviembre/2007 (última certificación realizada) se encontraban trabajando once (11) personas.-

1) Obra: "SEDE VECINAL BARRIO EL LIBERTADOR" – Empresa: SUR CONSTRUCTORA S.R.L.

2) Partida presupuestaria: Marzo/2007 = 1 1 1 03 13 104 422

3) Monto contratado originalmente = \$ 275.265,67

Plazo de finalización original = 120 días

Adicional = \$ 17.461,22

4) y 5) Neutralizada por:

Resolución M.O. y S.P. N° 418/08 – desde el 18/07/08 por razones climáticas

Resolución M.O. y S.P. N° 495/08 – desde el 30/09/08 por falta de pago

6) El grado de avance a la fecha de la última neutralización es del 62 %

7) Importe de carácter de gasto improductivo de la obra: Dado no contar con el expediente madre, resulta a la fecha imposible informar el porcentaje cotizado por la empresa en conceto de gastos improductivos y/o generales.

8) Total en carácter de gasto improductivo: ver respuesta al punto 10

9) Partida presupuestaria a la que se afectarán los gastos improductivos: ver respuesta al punto 10

10) Si esta efectuado el pago por gasto improductivo, o en su caso, detallar monto adeudado teniendo en cuenta los intereses punitivos.

Con respecto a los puntos que anteceden (8 a 10), cabe indicar que la empresa a la fecha no ha peticionado el pago por el concepto gasto improductivos, motivado en razón de las neutralizaciones obrantes en las actuaciones, las cuales conforme se desprende de la respuesta de los puntos 4 y 5, las mismas obedecen a diversos motivos.

Ello conlleva a determinar la improcedencia en esta instancia de afectar partida presupuestaria, y/o realizar la cuantificación por dicho concepto, toda vez que conforme las normas de aplicación, previamente debe existir un reclamo formal de la empresa y su análisis pormenorizado a los fines de determinar la procedencia, máxime destacando que el concepto que encierra los llamados gastos improductivos o generales tal lo cotiza la empresa, encierra un conjunto de gastos que en atención al avance de obra podrían estar amortizados.

///...2



Provincia de Tierra del Fuego, Antártica
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina


**MINISTERIO DE OBRAS
Y SERVICIOS PÚBLICOS**
UNIDAD EJECUTORA PROVINCIAL

2008 - AÑO DE ENSEÑANZA DE LAS CIENCIAS



///...3

11) Se informa que para los trabajos realizados en el transcurso del mes de Junio/2008 (última certificación realizada) se encontraban trabajando doce (12) personas.-


Prof. Carlos Ríos Ferreyra
Coordinador Ejecutivo
Unidad Ejecutora Provincial
M.O. Y S.P.

RECIBO
17/17

*La Legislatura de la Provincia de Tierra del Fuego,
Antártida e Islas del Atlántico Sur
República Argentina*

RESUELVE.


Artículo 1º.- Solicitar al Poder Ejecutivo Provincial que, a través del área correspondiente, remita a esta Cámara Legislativa el listado de obras paralizadas detallando lo siguiente:


1. Identifique las obras paralizadas;
2. partida presupuestaria a la que fue afectada cada obra;
3. monto de cada obra y plazo de finalización original;
4. motivo de paralización en cada caso;
5. fecha de paralización y cantidad de tiempo paralizada cada obra;
6. grado de avance de cada obra a la fecha de paralización;
7. importe en carácter de gasto improductivo de cada obra;
8. importe total en carácter de gasto improductivo;
9. partida presupuestaria a la que se afectarán los gastos improductivos de cada obra;
10. si se está efectuando el pago por gasto improductivo a cada empresa; de no ser así, detallar el monto adeudado a la fecha teniendo en cuenta los intereses punitivos;
11. cantidad de personal que las empresas afectaban a estas obras.

Artículo 2º.- Regístrese, comuníquese y archívese.


DADA EN SESIÓN ORDINARIA DEL DÍA 18 DE SEPTIEMBRE DE 2008.

RESOLUCIÓN Nº 263 /08.-


MARTÍN A. ENCHIEME
Secretario Legislativo
Poder Legislativo

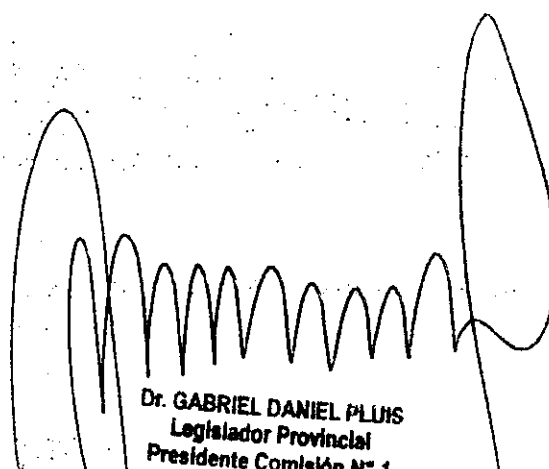
Dr. GABRIEL DANIEL PLUIS
Legislador Provincial
Presidente Comisión Nº 1
ES COPIA FIEL

"Las Islas Malvinas, Georgias, Sandwich del Sur y los Hielos Continentales son y serán Argentinas"


CARLOS G. FERNANDEZ
Director Información y
Documentación Parlamentaria
Poder Legislativo
