

# PODER LEGISLATIVO



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,  
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR  
REPÚBLICA ARGENTINA

## COMUNICACIONES OFICIALES

**Nº: 003**

**PERIODO LEGISLATIVO: 2024**

**Extracto:**

**MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE NOTA 001/24**  
**ADJUNTANDO 4º INFORME TRIMESTRAL DE EJECUCIÓN**  
**DE LA LEY PROVINCIAL Nº 1431**

Entró en la Sesión de: 01 DE MARZO DE 2024

---

---

Girado a la Comisión Nº: CB


---

---

Orden del día Nº:

---

---



Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina  
MINISTERIO JEFATURA DE GABINETE

PODER LEGISLATIVO  
SECRETARÍA LEGISLATIVA  
17 ENE 2024  
MESA DE ENTRADA  
N° 003 Hs: 110 FIRMA

Handwritten signature and initials (017, b19).

NOTA N° 001/2024.-  
LETRA: M.J.G.-

**SRA. PRESIDENTA DE LA LEGISLATURA PROVINCIAL:**

Tengo el agrado de dirigirme a Usted en mi carácter de Viceministro de Coordinación de Gabinete, a cargo del Ministerio Jefatura de Gabinete, y conforme lo establecido en el artículo 4° y 13 inciso 4) de la Ley Provincial N° 1511.

Adjunto a la presente, encontrará el informe trimestral correspondiente a la Ley Provincial N° 1431, que aborda el Programa para el Fortalecimiento de la Infraestructura Educativa. Este informe es respaldado por el expediente electrónico MJG-N-45976-2023, debidamente suscrito por la Ministro de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología.

Sin otro particular, saludo Ud., con atenta y distinguida consideración.


CANALS  
Jorge Alberto  
Firmado digitalmente por  
CANALS Jorge  
Alberto

Esta información se encuentra resguardada en forma digital y/o firmada digitalmente

PASE A SECRETARÍA LEGISLATIVA

USHUAIA 17 de 01 de 24

Damian Alberto Lottler  
Vicepresidente 1° Alc  
Poder Legislativo



*Provincia de Tierra del Fuego, Antártida  
e Islas del Atlántico Sur*  
*República Argentina*

"2023 - 40° ANIVERSARIO DE LA RESTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA"

**MINISTERIO DE EDUCACION, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGIA**

**NRO**  
MECCT-N-45976-2023

**AÑO**  
2023

**FECHA** 24/11/2023

**INICIADOR**

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

SERGIO JAVIER RIZZI

**EXTRACTO**

**Tema:** informe

**Detalle:** -S/ informe 4° trimestre referidos a la Ley N°1431 "Programa de Fortalecimiento de Infraestructura Educativa".

Esta Información se  
encuentra resguardada  
en forma digital y/o  
firmada digitalmente

Firmado Electrónicamente por  
AGENTE RIZZI SERGIO JAVIER  
Gobierno de Tierra del Fuego  
DIRECTOR PROVINCIAL DE PROYECTOS ZONA  
NORTE Y CENTRO  
01/12/2023 15:12

Esta información se  
encuentra resguardada  
en forma digital y es  
firmada digitalmente



Río Grande, 22 de noviembre 2023

Letra: D.P.Z.N.yC

Nota: N° 455/2023

A la  
**Sra. Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología**  
**D.I. Analía Cubino.**

S / D

Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de informar los avances de las obras y servicios, programados a través de la Ley N°1431 "Programa de Fortalecimiento de Infraestructura Educativa" durante el transcurso del cuarto trimestre, que abarca el período desde el 23 de junio del 2023 hasta el 22 de septiembre del 2023.

**E-79023/2023 CAMBIO DE ABERTURAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO A.I.A.S**

Esta obra tiene como objetivo poner en valor las ventanas, puertas de emergencia y puertas de ingreso e internas, solucionando con esto las filtraciones de agua, ingreso de viento y mejorar la estética del cada edificio.

- Los edificios afectados por esta obra son: En Río Grande 18, en Tolhuin 3 y en Ushuaia 24.-
- Al tratarse de una obra por renglones, se firmaron los siguientes contratos:
  - Resolución 116/23: \$ 72.156.990,20
  - Resolución 117/23: \$ 6.705.713,76
  - Resolución 121/23: \$ 43.723.307,06
  - Resolución 122/23: \$ 61.301.217,55
  - Resolución 120/23: \$ 93.43.209,00
  - Resolución 118/23: \$ 49.998.292,19
  - Resolución 119/23: \$ 50.944.701,13
- Tramitado según Expte.: E – 79023 - 2023
- Plazo de ejecución SETENTA Y CINCO (75) DIAS CORRIDOS.
- ESTADO DE OBRA: se encuentra en proceso.

**Resolución 116/23:**

- ✓ RENGLÓN 8- ESCUELA PROVINCIAL N° 23: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 45.20 %.-
- ✓ RENGLÓN 12- COLEGIO PROVINCIAL SOBERANÍA NACIONAL: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 29.14 %.-
- ✓ RENGLÓN 17- GIMNASIO ESCUELA N° 21: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 64,24 %.-

Cuenta con una extensión de plazo, y al 22 de septiembre de 2023 con una suspensión de obra.




Resolución 117/23:

- ✓ RENGLON 7- ESCUELA PROVINCIAL N° 8: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 100%.-

Resolución 121/23:

- ✓ RENGLÓN 1 - JARDÍN DE INFANTES N° 1: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 1,81 %.-
- ✓ RENGLÓN 2- JARDÍN DE INFANTES N° 6: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 0,73 %.-
- ✓ RENGLÓN 3- JARDÍN DE INFANTES N° 9: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 49,16 %.-
- ✓ RENGLÓN 6- JARDÍN DE INFANTES N° 17: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 34,25 %.
- ✓ RENGLÓN 11- COLEGIO PROVINCIAL ANTARTIDA ARGENTINA: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 0,90 %.-
- ✓ RENGLÓN 13- CENTRO TERAPÉUTICO EDUCATIVO: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 14,76.-
- ✓ RENGLÓN 14- CENTRO DE ACTIVIDADES ALTERNATIVAS PARA DISCAPACITADOS: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 1,76%.-
- ✓ RENGLÓN 15- CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE PARA JÓVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 14,96%.-
- ✓ RENGLÓN 16- GIMNASIO ESCUELA N° 2: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 5,82%.-
- ✓ RENGLÓN 18- GIMNASIO CPET: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 64,22%.-  
Cuenta una extensión de plazo, y al 22 de septiembre de 2023 con una suspensión de obra





**Resolución 122/23:**

- ✓ **RENLÓN 4- JARDÍN DE INFANTES N° 11:** Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 68,71%.-
- ✓ **RENLÓN 5- JARDÍN DE INFANTES N° 16:** Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 1.45%.-
- ✓ **RENLÓN 9- ESCUELA PROVINCIAL N° 32:** Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 21.95%.-
- ✓ **RENLÓN 10- ESCUELA PROVINCIAL N° 35:** Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 46,30%.-

Cuenta con una extensión de plazo de obra.

**Resolución 119/23:**

- ✓ **RENLÓN 25- JARDIN DE INFANTES N° 18 - USHUAIA:** Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 100 %.-
- ✓ **RENLÓN 28- ESCUELA N° 3/34 - USHUAIA:** Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 100 %
- ✓ **RENLÓN 29- ESCUELA N° 9 - USHUAIA:** Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 100 %
- ✓ **RENLÓN 40- COLEGIO PROVINCIAL ERNESTO SABATO - USHUAIA:** Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 100 %

**Resolución 142/23:**

- ✓ **RENLÓN 19- JARDIN N°13 - TOLHUIN:** Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 0 %
- ✓ **RENLÓN 20- ESCUELA ESPECIAL N°4 - TOLHUIN:** Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 0 %
- ✓ **RENLÓN 21- CENTRO DE ARTES Y OFICIOS - TOLHUIN:** Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 0 %
- ✓ **RENLÓN 23- JARDÍN DE INFANTES N° 8 - USHUAIA:** Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 90 %
- ✓ **RENLÓN 24- JARDIN DE INFANTES N° 10 - USHUAIA:** Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 0 %
- ✓ **Renlón N° 27:** Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 90 %
- ✓ **RENLÓN 31- ESCUELA N° 15 - USHUAIA:** Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 30%
- ✓ **RENLÓN 32- ESCUELA N° 22 - USHUAIA:** Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 0%
- ✓ **RENLÓN 33- ESCUELA N° 30 - USHUAIA:** Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 0 %
- ✓ **RENLÓN 36- ESCUELA N° 41 - USHUAIA:** Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 0 %
- ✓ **RENLÓN 38- COLEGIO PROVINCIAL EVA DUARTE DE PERON - USHUAIA:** Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 0 %
- ✓ **RENLÓN 39- COLEGIO PROVINCIAL POLIVALENTE DE ARTE - USHUAIA:** Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 0 %
- ✓ **RENLÓN 42- COLEGIO PROVINCIAL OBA - USHUAIA:** Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 50 %



- ✓ RENGLÓN 43- GIMNASIO 640 - USHUAIA: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 0 %
- ✓ RENGLÓN 44- GIMNASIO POLIVALENTE DE ARTES - USHUAIA: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 0 %

**Resolución 212/23:**

- ✓ RENGLÓN 22- JARDÍN DE INFANTES N° 2 - USHUAIA: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 90 %
- ✓ RENGLÓN 26- JARDÍN DE INFANTES N° 19 - USHUAIA: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 90 %
- ✓ RENGLÓN 30- ESCUELA N° 13 - USHUAIA: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 100 %
- ✓ RENGLÓN 34- ESCUELA N° 31 - USHUAIA: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 90 %
- ✓ RENGLÓN 35- ESCUELA N° 39 - USHUAIA: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 90 %
- ✓ RENGLÓN 37- ESCUELA N° 47 - USHUAIA: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 0 %
- ✓ RENGLÓN 41- COLEGIO PROVINCIAL KLOKETEN - USHUAIA: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 90 %
- ✓ RENGLÓN 45- ESCUELA PROVINCIAL N° 24 - USHUAIA: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 50 %

**E- 78772/2022 CAMBIO DE ABERTURAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LA CIUDAD DE RÍO GRANDE Y TOLHUIN**

Esta obra tiene como objetivo poner en valor las ventanas, puertas de emergencia y puertas de ingreso e internas, solucionando con esto las filtraciones de agua, ingreso de viento y mejorar la estética de cada edificio.

- Los edificios afectados por esta obra son: En Río Grande 5, en Tolhuin 1.
- Al tratarse de una obra por renglones, se firmaron los siguientes contratos:

- ✓ Resolución 402 - Renglón 1: \$ 27.837.140,01
- ✓ Resolución 403 - Renglón 2: \$ 49.248.700,26
- ✓ Resolución 404 - Renglón 3 y 4: \$ 48.693.893,20
- ✓ Resolución 405 - Renglón 5: \$ 11.752.691,14
- ✓ Resolución 406 - Renglón 6: \$ 18.069.398,20

**Resolución 402/23:**

RENLÓN 1- ESCUELA PROVINCIAL N° 10: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 75,60%.-  
Cuenta con una extensión de plazo de obra.

**Resolución 403/23:**

RENLÓN 2- ESCUELA PROVINCIAL N° 19: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 43,80%  
Cuenta con una extensión de plazo de obra.





Gobierno de  
Tierra del Fuego  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

"2023- 40° ANIVERSARIO DE LA RESTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - ZONA NORTE

Ministerio de  
Educación,  
Cultura, Ciencia  
y Tecnología



**Resolución 404/23:**

REGLÓN 3- ESCUELA PROVINCIAL N° 21: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 12,87 %.-

REGLÓN 4-ESCUELA ESPECIAL N°2- "CASITA DE LUZ ": Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 1,57 %.-

**Resolución 405/23:**

REGLÓN 5-ESCUELA ESPECIAL N°3- "INTEGRACIÓN PLENA": Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 69.75 %.-

Cuenta con una extensión de plazo, y al 22 de septiembre de 2023 con una suspensión de obra.

**Resolución 406/23:**


REGLÓN 6- ESCUELA PROVINCIAL N° 5- "JOSE MARIA BEAUVOIR": Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 100%.-

**E-80941/202 - REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N° 13 - ALMIRANTE GUILLERMO BROWN**

Esta obra tiene como objetivo intervenir en la demolición y refacción de los techos ubicados en aulas y SUM, reeducación de las baterías de baños de planta baja y planta alta, demolición de tabiques existentes, retiro de artefactos y el nuevo armado de los mismos, con artefactos, revestimientos y carpinterías nuevas. Se prevé también la intervención en la instalación eléctrica general, la instalación de nuevas luminarias y tomacorrientes y de una nueva central de alarma, detectores de humo, de gas, térmicos y de movimientos.

Con todas estas intervenciones se genera un espacio apto y seguro para un buen funcionamiento del edificio. –

- Los edificios afectados por esta obra son: En Ushuaia 1(Una).
- MONTO DEL CONTRATO: \$ 225.052.776,11
- TRAMITADO SEGÚN EXPTE.: E –80941/2022
- INICIO DE OBRA: 26 DE ENERO DE 2023 MEDIANTE RESOLUCIÓN S.I. N° 0046/2023.
- PLAZO DE EJECUCIÓN: SESENTA (60) DÍAS CORRIDOS.
- AVANCE DE OBRA: AL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 TIENE UN AVANCE 95 %.DEBIDO AL COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES, SE OTORGÓ UNA EXTENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN PARA TRABAJAR SÓLO LOS SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS.
- PLAZO DE GARANTÍA CIENTO OCHENTA (180) DÍAS DE CORRIDO.
- EXTENSIÓN PLAZO CONTRACTUAL: CUARENTA (40) DÍAS CORRIDOS, FIJANDO UN PLAZO TOTAL DE 100 (CIEN) DÍAS DE CORRIDO, TRAMITADO MEDIANTE RESOLUCIÓN M.E.C.C.YT. N° 3598/2023
- REDETERMINACIÓN DE PRECIO 1: TRAMITADA MEDIANTE N-19605/2023(EN TRÁMITE)






### **E-82988/2022 - "AMPLIACIÓN - CENTRO DE EDUCACIÓN PERMANENTE PARA JÓVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD -RIO GRANDE"**

Esta obra tiene como objetivo la construcción de dos aulas de usos múltiples, un aula de psicomotricidad, un lugar para portería, dos salas de reuniones y la ampliación del vivero.

- Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 1.
- Monto del contrato: \$ 79.386.654,84
- Tramitado según Expte.: E – 82988/22
- Inicio de obra 01/03/2023 con un plazo de ejecución de CIENTO OCHENTA (180) días.
- Plazo de garantía de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos.
- ESTADO DE OBRA: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 94,42 %.

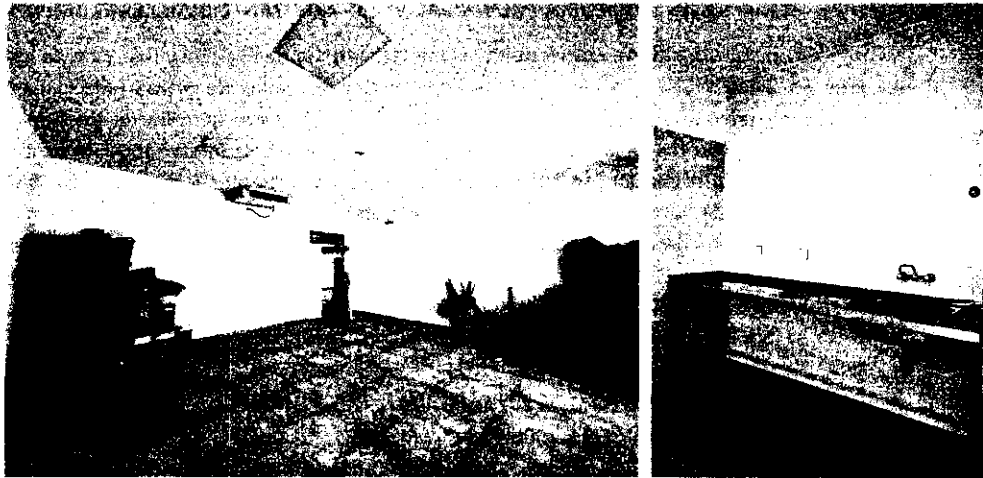

### **E-80349/2022 - "REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS E INSTALACION NUEVA DE GAS - ESCUELA Nº 4 / 43 - RIO GRANDE"**

Esta obra tiene como objetivo intervenir y reacondicionar la sala de máquinas en su totalidad, y con esto lograr un óptimo funcionamiento en los sistemas de provisión de gas, agua fría-caliente y de calefacción.

- Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 1
- Monto del contrato: \$ 35.458.304,71
- Tramitado según Expte.: E – 80349/22
- Inicio de obra 13 /02/2023 con un plazo de ejecución de CUARENTA Y CINCO (45) días.
- Plazo de garantía de CIENTO OCHENTA (180) días de corridos.
- ESTADO DE OBRA: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 75,15%.

Cuenta una extensión de plazo, y al 22 de septiembre de 2023 con una suspensión de obra

### **E-81183/2022 - REFACCIÓN INTEGRAL - SALA DE MÁQUINAS E INSTALACIÓN NUEVA DE GAS Y CALEFACCION - ESCUELA Nº 5 – TOLHUIN.**

Esta obra tiene como objetivo intervenir y reacondicionar la sala de máquinas en su totalidad y realizar el cambio completo del Sistema de calefacción, y con esto lograr un óptimo funcionamiento en los sistemas de provisión de gas, agua fría-caliente y de calefacción y se mejora la seguridad de la institución.

- Los edificios afectados por esta obra son: En Tolhuin 1.
- Monto del contrato: \$ 47.619.206,09
- Tramitado según Expte.: E – 81183/22



- Inicio de obra 07/02/2023 con un plazo de ejecución de NOVENTA (90) días corridos.
- Plazo de garantía de CIENTO OCHENTA (180) días corridos.
- ESTADO DE OBRA: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance del 30%.  
Cuenta una extensión de plazo de obra

#### **E-80297/2022 - "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN EDIFICIOS ESCOLARES DE LA CIUDAD DE RÍO GRANDE Y TOLHUIN"**

Esta obra tiene como objetivo la impermeabilización y puesta en valor de las cubiertas de techos de establecimientos educativos seleccionados. Logrando con ello la impermeabilización de las cubiertas y solucionando problemas históricos de esos edificios.

- Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 12, en Tolhuin 2.
- Monto del contrato: \$ 231.832.194,37
- Tramitado según Expte.: E – 80297/22
- Inicio de obra 03/02/2023 con un plazo de ejecución de SESENTA Y CINCO (75) días.
- Plazo de garantía de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días de corridos.
- ESTADO DE OBRA: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 84,40 %.  
Cuenta una extensión de plazo, y al 22 de septiembre de 2023 con una suspensión de obra

#### **E-84253/2022 - "OBRA INTEGRAL BAÑOS COLEGIO PROVINCIAL COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA – RIO GRANDE"**

Esta obra tiene como objetivo planteamos realizar el reacondicionamiento de los baños y el cambio de aberturas exterior en el establecimiento, para que cumplan con las reglas del buen arte.

- Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 1
- Monto de contrato: \$ 64.306.125,31
- Tramitado según Expte.: 84253/22
- Inicio de obra 02/02/2023 con un plazo de ejecución de CUARENTA Y CINCO (45) días.
- Plazo de garantía de CIENTO OCHENTA (180) días corridos.
- ESTADO DE OBRA: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 95,00 %.  
Cuenta una extensión de plazo de obra

#### **E- 85719/2022 - "REMODELACIÓN DE BAÑOS Y CAMBIOS DE CARPINTERÍAS EN C.P.E.T Ingeniero Fabio Carlos Reiss. RIO GRANDE". -**

Esta obra tiene como objetivo realizar el mejoramiento y remodelación de los baños, y el cambio de carpinterías exteriores en el establecimiento, para que cumplan con las reglas del buen arte.

- Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 1.
- Monto del contrato: \$ 69.123.584,07
- Tramitado según Expte.: E – 85719/22
- Inicio de obra 01/03/2023 con un plazo de ejecución de CUARENTA Y CINCO (45) días.
- Plazo de garantía de CIENTO OCHENTA (180) días corridos.
- ESTADO DE OBRA: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 37%.  
Cuenta una extensión de plazo, y al 22 de septiembre de 2023 con una suspensión de obra



**E-85666/2022 - "CAMBIO DE ABERTURAS Y BAÑOS EN COLEGIO PROVINCIAL HASPEN –PROF. LUIS ADAM FELIPPA"**


Esta obra tiene como objetivo realizar el mejoramiento y remodelación de los baños, y el cambio de carpinterías exterior e interior del establecimiento, para que cumplan con las reglas del buen arte.

- Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 1.
- Monto del contrato: \$ 45.782.015,17
- Nuevo monto de contrato:\$59.454.890,07
- Tramitado según Expte.: E – 85666/22
- Inicio de obra 9/02/2023 con un plazo de ejecución de CUARENTA Y CINCO (45) días.
- Ampliación del plazo CIENTO VEINTISIETE (127) días.-Res. M.E.C.C. y T. N° 4299/2023
- Plazo de garantía de CIENTO OCHENTA (180) días corridos.
- ESTADO DE OBRA: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 90%.  
Cuenta una extensión de plazo, y al 22 de septiembre de 2023 con una suspensión de obra

**E-85724/2022 - REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N °22 "BAHÍA GOLONDRINA" y JARDÍN N°10 "CHOWEN" – USHUAIA.**

Esta obra tiene como objetivo intervenir en la demolición y readecuación de las baterías de baños de planta baja y planta alta, el armado de salas de máquinas (1 por cada establecimiento), la intervención en la instalación eléctrica general, la instalación de nueva luminarias y tomacorrientes, intervención en la instalación de gas. También se realizará la provisión y mano de obra para la pintura interior completa, de las barandas y escaleras exteriores. Con todas estas intervenciones se genera un espacio apto y seguro para un buen funcionamiento del edificio.

- Los edificios afectados por esta obra son: En Ushuaia 1
- MONTO DEL CONTRATO: \$ 136.361.492,02
- TRAMITADO SEGÚN EXPTE.: E –85724/22
- INICIO DE OBRA: 1 DE MARZO DE 2023 MEDIANTE RESOLUCIÓN S.I. N° 0080/2023.
- PLAZO DE EJECUCIÓN: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CORRIDOS.
- AVANCE DE OBRA: EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 TIENE UN AVANCE 47,89%.
- PLAZO DE GARANTÍA CIENTO OCHENTA (180) DÍAS DE CORRIDO.
- EXTENSIÓN PLAZO CONTRACTUAL: CUARENTA Y UNO (45) DÍAS CORRIDOS. E-64251/23
- CERTIFICADO DE OBRA N° 1 MEDICIÓN DEL 10/02/2023 AL 28/02/2023 E-29470/2023, CON UNA SUMA DE \$23.133.059,53 EN TRÁMITE
- CERTIFICADO DE OBRA N° 2 MEDICIÓN DEL 1/03/2023 AL 31/03/2023 E-23981/2023, CON UNA SUMA DE \$9.519.768,89 EN TRÁMITE.

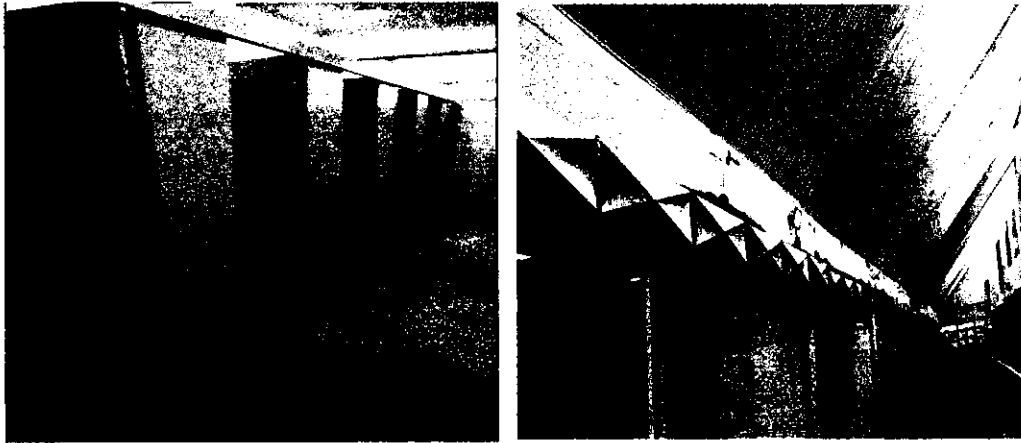

**E-87527/2022 - REFACCIONES INTEGRAL COLEGIO PROVINCIAL DR. JOSE MARIA SOBRAL"- USHUAIA.**

Esta obra tiene como objetivo intervenir en la refacción de las salas de producción de cocinas, la intervención en la instalación eléctrica general, la instalación de nueva luminarias y tomacorrientes. Con todas estas intervenciones se genera un espacio apto y seguro para un buen funcionamiento del edificio.

- Los edificios afectados por esta obra son: En Ushuaia 1
  - MONTO DEL CONTRATO: \$ 47.787.514,93
  - TRAMITADO SEGÚN EXPTE.: E 87527/22
  - INICIO DE OBRA: 07 DE FEBRERO DE 2023 MEDIANTE RESOLUCIÓN S.I. N° 0051/2023.
  - PLAZO DE EJECUCIÓN: CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CORRIDOS.
  - AVANCE DE OBRA: AL 22 DE SEPTIEMBRE 2023 TIENE UN AVANCE 78,13%. DEBIDO AL COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES, SE OTORGÓ UNA EXTENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN PARA TRABAJAR SÓLO LOS SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS.
  - ESTADO DE OBRA: EN ESPERA DE LA APROBACIÓN DE CAMUZZI
  - PLAZO DE GARANTÍA CIENTO OCHENTA (180) DÍAS DE CORRIDO.
- CERTIFICADO DE OBRA N° 1 MEDICIÓN DEL 07/02/2023 AL 28/02/2023 E- 91796/2023, CON UNA SUMA DE \$11.201.565,57 PAGO EN TRÁMITE.





**E-86023/2022 - REFACCIÓN INTEGRAL TALLER COLEGIO TÉCNICO PROV. O.B.A. – USHUAIA.**

Esta obra tiene como objetivo intervenir en el acondicionamiento del piso del área de taller, readecuación de las baterías de baños y el sector de portería, en la instalación eléctrica general y la instalación de nuevas luminarias. Se realizará la construcción de un cielorraso suspendido de PVC en ambos sectores. Con todas estas intervenciones se genera un espacio apto y seguro para un buen funcionamiento del edificio.



- Los edificios afectados por esta obra son: En Ushuaia 1
- MONTO DEL CONTRATO: \$26.080.732,23
- TRAMITADO SEGÚN EXPTE.: E 86053/22
- INICIO DE OBRA: 02 DE MAYO 2023 MEDIANTE RESOLUCIÓN S.I. N° 1173/2023.
- PLAZO DE EJECUCIÓN: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS.
- AVANCE DE OBRA: EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 TIENE UN AVANCE 70%. DEBIDO AL COMIENZO DE LAS ACTIVIDADES, SE OTORGÓ UNA EXTENSIÓN DE PLAZO DE EJECUCIÓN PARA TRABAJAR SÓLO LOS SÁBADOS, DOMINGOS Y FERIADOS.
- PLAZO DE GARANTÍA CIENTO OCHENTA (180) DÍAS DE CORRIDO.
- EXTENSIÓN PLAZO CONTRACTUAL: TREINTA (30) DÍAS CORRIDOS. APROBADO MEDIANTE RESOLUCIÓN M.E.C.Y.T N°4943/2023
- CERTIFICADO DE OBRA N° 1 MEDICIÓN DEL 10/02/2023 AL 28/02/2023 E-91723/2023, CON UNA SUMA DE \$2.141.539,18 PAGO EN TRAMITE.

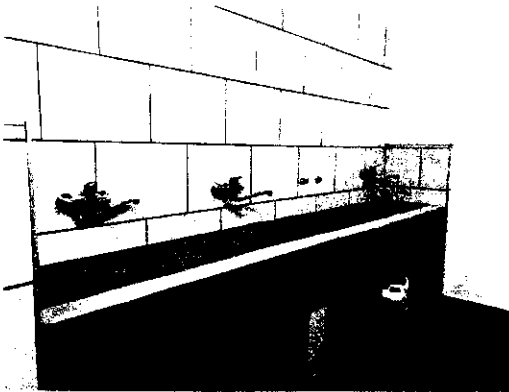


#### **E-7283/2022 - REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N°15 CENTENARIO DE USHUAIA - 1ra. ETAPA**

Esta obra tiene como objetivo intervenir en la realización de un Sistema de calefacción nuevos a través de Calderas por agua caliente y equipos Fan Coil, y reacondicionar y ampliar la sala de máquinas en su totalidad, y con esto lograr un óptimo funcionamiento en los sistemas de provisión de gas y de calefacción. Con esta mejora se genera una mejor prestación del servicio de calefacción, con un sistema más moderno y seguro.

- Los edificios afectados por esta obra son: En Ushuaia 1
- MONTO DEL CONTRATO: \$78.062.325,18
- TRAMITADO SEGÚN EXPTE.: E -7283/22
- INICIO DE OBRA: 09 DE MAYO DE 2023 MEDIANTE RESOLUCIÓN S.A.L N°1172/2023.
- PLAZO DE EJECUCIÓN: TREINTA DIA (30) DÍAS CORRIDOS.

- AVANCE DE OBRA: EL DÍA 22 DE SEPTIEMBRE DE 2023 TIENE UN AVANCE 70%.
- ESTADO DE OBRA: EN TRÁMITE DE SUSPENSIÓN
- PLAZO DE GARANTÍA CIENTO OCHENTA (180) DÍAS DE CORRIDO.



**E-36657/2023 - "REFACCIONES EN JARDÍN DE INFANTES N° 7 "PIEDRA LIBRE" - USHUAIA".**

Esta obra tiene como objetivo restituir la capacidad estructural del suelo y de las cimentaciones del edificio el cual fue comprometido estructuralmente a través del paso de los años como consecuencia de los asentamientos diferenciales que sufrió la estructura, producto de la modificación de la capacidad portante del suelo, generando que el sector de contrapiso de hormigón armado delantero cediera unos 5 cm aproximadamente, provocando roturas en pisos, mamposterías y desprendimiento de cielorrasos, entre otros.

- Los edificios afectados por esta obra son: En Ushuaia 1
- Monto del contrato: : \$131.923.007,39
- Tramitado según expediente:36657/2023
- Plazo de ejecución de CIENTO VEINTE (120) días corrido
- plazo de garantía de CIENTO OCHENTA (180) días corridos.
- ESTADO DE OBRA: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado del 40 %.



Gobierno de  
Tierra del Fuego  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur




"2023- 40° ANIVERSARIO DE LA RESTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - ZONA NORTE

Ministerio de  
Educación,  
Cultura, Ciencia  
y Tecnología

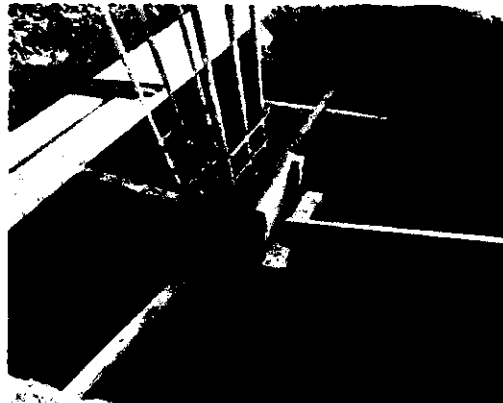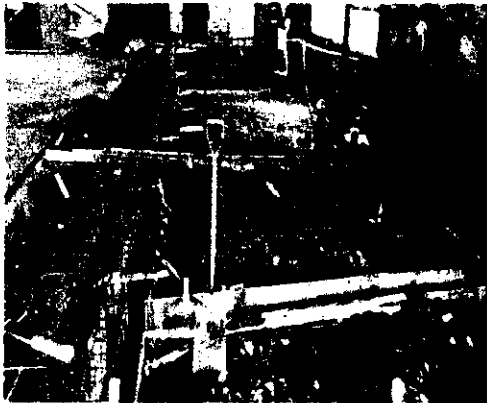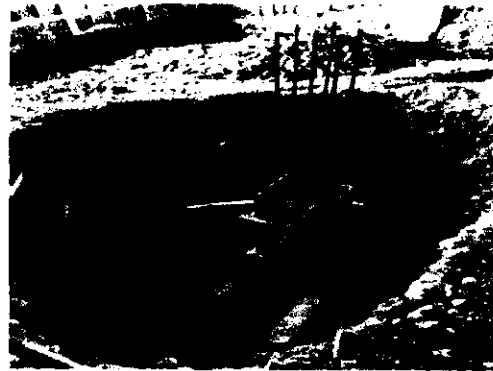

#### **E-35180/2023 - "REFACCIÓN INTEGRAL CENTRO POLIVALENTE DE ARTE DE USHUAIA PROF. INÉS MARÍA BUSTELO" - USHUAIA.**

Esta obra tiene como objetivo lograr canalizar los chorrillos del patio trasero del establecimiento. También se volverá a habilitar la escalera principal del gimnasio de dicho establecimiento. la correcta función de todos los espacios del establecimiento educativo, problemáticas que ponen en riesgo a los alumnos, profesores y demás personas que operan dentro del establecimiento, y que deben ser solucionada de forma inmediata.


- Los edificios afectados por esta obra son: En Ushuaia 1
- Monto del contrato:\$26.610.123,61
- Tramitado según expediente: 35180/2023
- Plazo de ejecución de TREINTA (30) días corridos
- plazo de garantía de CIENTO OCHENTA (180) días corridos
- ESTADO DE OBRA: Al 22 de septiembre de 2023 tiene un avance aproximado de 0 %, ya que el inicio de la obra fue el 1 de septiembre, el porcentaje se verá reflejado en la entrega del primer certificado



### **E-8588/2023 - REMODELACIÓN DE FACHADA Y CAMBIO DE CARPINTERÍAS EN CENTRO EDUCATIVO Y DE FORMACIÓN LABORAL DR. MANUÉL BELGRANO-RÍO GRANDE"-2023**

El objetivo de la obra tiene por finalidad la remodelación de fachada y el cambio de aberturas del Establecimiento Educativo Centro de formación Laboral Dr. Manuel Belgrano, ubicada en Mynkyol 119 en la ciudad de Río Grande, que presenta: Mal estado de ventanas y Puertas interiores deterioradas o en mal estado, falta y oxidación de rejas perimetrales. Y el deterioro de la fachada del establecimiento. Planteamos realizar el mejoramiento de aberturas, reacondicionamiento de la fachada y la reja de la línea municipal, para que cumplan con las reglas del buen arte. La idea es lograr que el edificio se convierta en un espacio más simbólico, actualizando la fachada y las carpinterías. Permitiendo una identificación mayor del mismo e integrarlo al crecimiento barrial.

- Los edificios afectados por esta obra son: 1 En Río Grande
- Monto del contrato: \$46.308.670,07.
- Tramitado según Expte.: E - 8588/2023.
- Plazo de ejecución de TREINTA (30) días corridos.
- Inicio de obra: 1/5/2023.
- ESTADO DE OBRA: Al 22 de septiembre de 2023 se encuentra con un avance de 60%  
Al 22 de septiembre de 2023 la obra se encuentra suspendida.

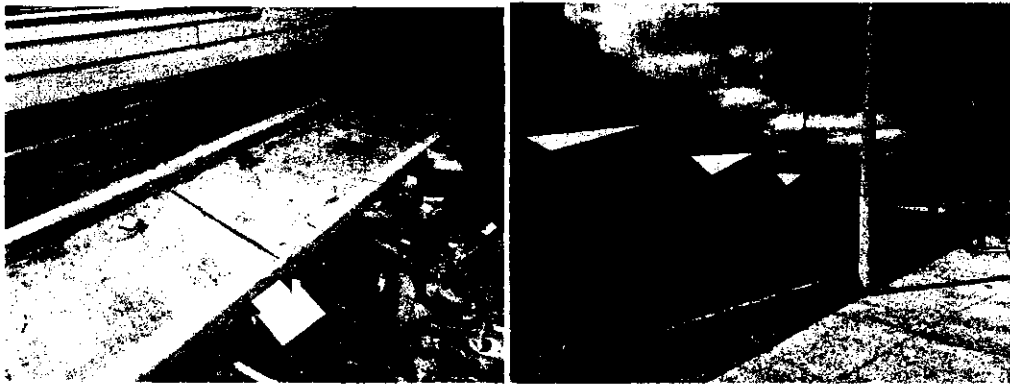

### **E-7464/2023 - REFACCIÓN INTEGRAL - JARDÍN DE INFANTES Nº 9 - RÍO GRANDE – 2023**

El edificio a intervenir es el del JARDIN Nº 9 – "TUTU MARAMBA", de nivel inicial, los mismos tienen por objetivo dar una respuesta a las necesidades educativas de la comunidad actual y las futuras, potencializar al mejoramiento de la calidad de vida, la inclusión urbana y social de sus habitantes. Ubicada en la zona centro de la ciudad de Río Grande, es uno de los principales edificios formativos de nivel inicial de la zona. Para cumplir con su cometido, los servicios generales que conforman el edificio, deben funcionar al 100%, principalmente el sistema de calefacción que tiene como misión mantener las temperaturas de confort acorde a la normativa, sin presentar ningún tipo de interferencia, ya que la aparición de alguna anomalía conlleva a la suspensión y por consiguiente pedidas de días en el calendario anual académico, tema recurrente en estos últimos tiempos, dado el estado del sector a intervenir. Sistema de Calefacción: Por lo antes expuesto se procede a intervenir y reacondicionar la Sala de Máquinas en su totalidad y realizar el cambio completo de las cañerías del Sistema de calefacción del Establecimiento. Rampas de Acceso: El proyecto nace ante a partir de la inclusión de estudiantes con discapacidad al establecimiento y pedido reiterado por parte del equipo directivo provincial de nivel inicial para la creación de una rampa de ingreso al edificio educativo.




- Los edificios afectados por esta obra son: 1 En Rio Grande 1
  - Monto del contrato: \$22.501.578,93.
  - Tramitado según Expte.: E - 7464/2023.
  - Plazo de ejecución de TREINTA (30) días corridos.
  - Inicio de obra: 25/4/2023.
  - ESTADO DE OBRA: Al 22 de septiembre de 2023 se encuentra con un avance de 64 %
- Al 22 de septiembre de 2023 la obra se encuentra suspendida.

#### **E-7458/2023 - REFACCIÓN SALA DE MÁQUINAS E INSTALACIÓN NUEVA DE GAS - COLEGIO TREJO NOEL - TOLHUIN – 2023**

El objetivo de la obra es intervenir y reacondicionar la Sala de Máquinas en su totalidad y realizar el cambio completo del Sistema de calefacción del Sector más antiguo del Establecimiento, y con esto lograr un óptimo funcionamiento en los sistemas de provisión de gas, agua fría-caliente y de calefacción.

- Los edificios afectados por esta obra son: 1 En Rio Grande 1
  - Monto del contrato: \$36.414.993,51.
  - Tramitado según Expte.: E - 7458/2023.
  - Plazo de ejecución de TREINTA (30) días corridos.
  - Inicio de obra: 5/5/2023.
  - ESTADO DE OBRA: Al 22 de septiembre de 2023 se encuentra con un avance de 95%
- Al 22 de septiembre de 2023 la obra se encuentra suspendida.

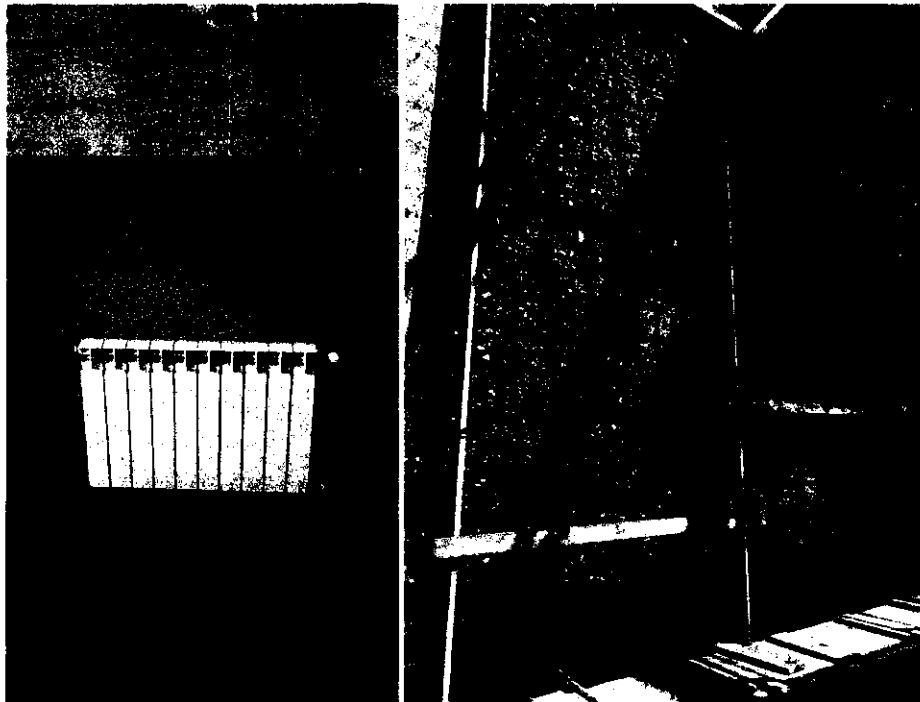

#### **E-9322/2023 - REMODELACIÓN INTERNA - CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL TERCIARIO Nº 35 "PROFESOR JULIAN JOSE GODOY - RIO GRANDE – 2023**

El proyecto de remodelación internas del establecimiento educativo responde a la solicitud por parte de los directivos provincial de nivel terciario para construir 5 (cinco) aulas, una de ellas está destinada para enfermería, remodelar los 4 (cuatro) sanitarios y 2 (dos) cocinas de la salas de profesores, cambio de luminarias y circuitos independientes en las 9 (nueve) aulas existentes, revestir las escaleras con goma antideslizante, la reubicación del aula de tutores, como ampliación del edificio, urbanización que se



encuentra en constante crecimiento, lo que acrecienta la necesidad de dar una mayor cobertura de vacantes para adultos pertenecientes a dicha comunidad. La remodelación consta de 5 (cinco) aulas que se organizan en dos plantas (334,77m<sup>2</sup> superficies) a través de un eje principal de acceso.

- Los edificios afectados por esta obra son: 1 En Rio Grande 1
- Monto del contrato: \$79.043.502,22.
- Tramitado según Expte.: E - 9322/2023.
- Plazo de ejecución de TREINTA (30) días corridos.
- Inicio de obra: 5/5/2023.
- ESTADO DE OBRA: Al 22 de septiembre de 2023 se encuentra con un avance de 36%

Cuenta con una extensión de plazo de obra.

Además de esto, se realizaron compras de materiales e insumos para realizar obras por administración, con personal de la Secretaría de Infraestructura:

#### **ADQUISICIÓN DE PUERTA PARA EL JARDÍN MATERNO INFANTIL 'VEO VEO', DE LA CIUDAD DE USHUAIA"**

- Esta compra tiene como objetivo el reemplazo de la puerta ya que la salida de emergencia se encontraba anulada e inutilizable. La misma forma parte del plan de evacuación como vía principal de escape en cumplimiento con la normativa vigente, Estos trabajos serán supervisados por personal de la subsecretaría de infraestructura zona sur.
- Monto de la compra: \$ 1.395.000,00
- Tramitado según expediente.:82133/22
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 1
- Estado: pagado el 29 de agosto

#### **ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

- Esta compra tiene como objetivo cambiar y/o colocar diversos artefactos eléctricos, debido a que se encuentran sin funcionamiento o faltantes, de los edificios públicos educativos situados en la ciudad de Ushuaia, de esta forma logrando así resolver cualquier inconveniente en casos de emergencia, para mantener en óptimas condiciones todos los espacios públicos educativos, Estos trabajos serán supervisados y realizados por personal de la subsecretaría de infraestructura zona sur.
- Monto de la compra: \$13.288.000,00
- Tramitado según expediente.: 4233/23
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 48
- Estado: pagado el 31 de agosto

#### **ADQUISICIÓN DE FAN COIL, PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.**

- Esta compra tiene como objetivo el normal funcionamiento de calefacción en los establecimientos solicitados, Estos trabajos serán supervisados por personal de la subsecretaría de infraestructura zona sur.
- Monto de la compra: \$17.580.000,00
- Tramitado según expediente.: 40558/23
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 6
- Estado: nota autorización al 22 de septiembre sigue igual

#### **ADQUISICIÓN DE DOS PUERTAS PARA LA ESCUELA PROV. N°39 "MIRADOR DEL OLIVIA"**

- Esta compra tiene como objetivo cambiar las dos puertas que fueron afectadas por un intento de robo en el establecimiento, Estos trabajos serán supervisados y realizados por personal de la subsecretaría de infraestructura zona sur.
- Monto de la compra: \$99.602,00
- Tramitado según expediente.: 42770/23
- Estado: nota autorización, al 22 de septiembre sigue igual.
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 1



#### **ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

- Esta compra tiene como objetivo reparaciones mínimas y de prioridad, en el mantenimiento diario de las instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas, calefacción y carpinterías en general en varias instituciones de la ciudad de Ushuaia, Estos trabajos serán supervisados y realizados por personal de la subsecretaría de infraestructura zona sur.
- Monto de la compra: \$1.978.268,34
- Tramitado según expediente.: 43263/23
- Estado: nota autorización, al 22 de septiembre sigue igual
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 15

#### **ADQUISICIÓN DE BOMBAS CIRCULADORAS PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.**

- Esta compra tiene como objetivo el normal funcionamiento del sistema de agua de dichas instituciones, ya que, con el paso del tiempo, el uso continuo se desgasta la vida útil de los artefactos, Estos trabajos serán supervisados y realizados por personal de la subsecretaría de infraestructura zona sur.
- Monto de la compra: \$2.005.900,00
- Tramitado según expediente.: 44405/23
- Estado: nota autorización, al 22 de septiembre sigue igual
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 5

#### **ADQUISICIÓN DE ABERTURAS PARA LA ESC. ESPECIAL N°1 'KAYÛ CHENÈN', LA ESC. PROV. N° 48 'MUJERES VETERANAS DE GUERRA DE MALVINAS', Y OFICINA DE JUNTA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA Y ADM. DE PERSONAL.**

- Esta compra tiene como objetivo el cambio de ventanas oxidadas, y de mejor calidad para mejor ventilación ya que las que están son de paño fijo, Estos trabajos serán supervisados por personal de la subsecretaría de infraestructura zona sur.
- Monto de la compra: \$2.030.816,00
- Tramitado según expediente.:49236/23
- Estado: nota autorización, al 22 de septiembre sigue igual
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 3

#### **ADQUISICIÓN DE PANELES ACÚSTICOS PARA AULAS DE MÚSICA DEL CENTRO POLIVALENTE DE ARTE USHUAIA "PROF. INÉS MARÍA BUSTELO"**

- Esta compra tiene como objetivo aislar correctamente el sonido; la falta de esta provoca interrupciones constantes que impiden un normal dictado de clases, Estos trabajos serán supervisados por personal de la subsecretaría de infraestructura zona sur.
- Monto de la compra: \$1.701.400,00
- Tramitado según expediente.: 49127/23
- Estado: nota autorización, al 22 de septiembre sigue igual
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 1

#### **ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS**

- Esta compra tiene como objetivo cambiar y/o colocar diversos artefactos eléctricos, debido a que se encuentran sin funcionamiento o faltantes, de los edificios públicos educativos situados en la ciudad de Ushuaia, de esta forma logrando así resolver cualquier inconveniente en casos de emergencia, para mantener en óptimas condiciones todos los espacios públicos educativos, Estos trabajos serán supervisados y realizados por personal de la subsecretaría de infraestructura zona sur.
- Monto de la compra: \$17.431.000,00
- Tramitado según expediente.:52189/23
- Estado: nota autorización, al 22 de septiembre sigue igual
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 48



Gobierno de  
Tierra del Fuego  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

"2023- 40° ANIVERSARIO DE LA RESTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - ZONA NORTE

Ministerio de  
Educación,  
Cultura, Ciencia  
y Tecnología



#### **ADQUISICIÓN DE 1 (UN) TURBOCALEFACTOR PARA LA OFICINA DE P.O.M. y S. EN CALLE KUANIP N°1182**

- Esta compra tiene como objetivo lograr que el sector de mesa de entrada de dicha oficina logre contar con la temperatura adecuada, mayormente los días de temperaturas bajas, el trabajo de instalación será realizado por personal de mantenimiento de esta Subsecretaría.
- Monto de la compra: \$45.000,00
- tramitado según expediente: 53691/2023
- Estado: nota autorización
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 1

#### **ADQUISICIÓN DE INSUMOS / ACCESORIOS PARA BAÑOS DEL COLEGIO PROVINCIAL JOSÉ MARIA SOBRAL**

- Esta compra tiene como objetivo el reemplazo de los mismos ya que dará como resultado mayor cantidad de baños funcionales para los estudiantes de la comunidad educativa en cuestión.
- Monto de la compra: \$278.700,00
- Tramitado según expediente: 61539/2023
- Estado: nota autorización
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 1

#### **ADQUISICIÓN DE UNA PUERTA DE EMERGENCIA PARA LA ESC. PROV. N°13 "ALTE. GUILLERMO BROWN"**

- Esta compra tiene como objetivo el reemplazo de la misma, para el cierre y uso correcto de la puerta de emergencia, ya que el establecimiento debe contar con esta medida de seguridad en óptimas condiciones.
- Monto de la compra: \$580.000,00
- Tramitado según expediente: 65213/2023
- Estado: nota autorización
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 1

#### **ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REPARACIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL JARDÍN DE INFANTES N°8 "CAMINITOS DE COLORES", de la ciudad de Ushuaia.**

- Esta compra tiene como objetivo hacer el cierre debido al perímetro del jardín de infantes, ya que la reparación y correcto cerramiento del cerco perimetral es de suma importancia para la seguridad de esa comunidad educativa, como así también, para la conservación de los estados edilicios, evitando más deterioro en los mismos.
- Monto de la compra: \$1.369.406,00
- Tramitado según expediente: 70815/2023
- Estado: nota de autorización
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 1

#### **ADQUISICIÓN DE VASOS EXPANSORES Y VÁLVULAS DE ALIVIO PARA CALDERAS DEL JARDÍN DE INFANTES N°20 "LUCERITO DE FUEGO"; DE LA ESCUELA PROV. N°22 "BAHÍA GOLONDRINA", DEL COLEGIO PROV. "LOS ANDES", Y DE COLEGIO PROV. "EVA DUARTE DE PERÓN", de la ciudad de Ushuaia.**

- Esta compra tiene como objetivo realizar el reacondicionamiento de calderas, de los establecimientos mencionados.
- Monto de la compra: \$2.837.286,00
- Tramitado según expediente: 72835/2023
- Estado: nota autorización
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 4



### **ADQUISICIÓN DE 9 (NUEVE) CERRADURAS POMO COPA PARA EL COLEGIO PROVINCIAL "LOS ANDES", de la ciudad de Ushuaia**

- Esta compra tiene como objetivo poder colocar en las puertas que se encuentran funcionando de manera inadecuada y que, a su vez, implica un riesgo innecesario para quienes hacen uso de las mismas diariamente, además de las molestias que ocasionan en el uso cotidiano. Una vez reemplazadas, se va a evitar que alguien se lastime, como así también será un beneficio para el estado de las instalaciones del edificio, soslayando mayor deterioro del mismo.
- Monto de la compra: \$174.286,89
- Tramitado según expediente: 75622/2023
- Estado: nota autorización
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 1

### **SERVICIO DE MANTENIMIENTO BÁSICO EN RECESO DE VERANO, PARA ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES.**

- Monto de la compra: \$ 9.940.000
- Tramitado según Expte.: 2469/23
- ESTADO DE LA OBRA: En curso según lo establecido en el expte.
- Se utilizó para: o recorrido diario del edificio, con el fin de constatar el buen funcionamiento de las instalaciones de agua, luz y gas; y verificar que no surjan inconvenientes como, por ejemplo: pérdidas de agua, corte de luz, entre otros. o Control de equipos de calefacción y sus componentes, Bombas presurizadoras y circuladoras, vasos de expansión.
- Control de sistema eléctrico general. Dicho control incluye la verificación de tableros eléctricos generales y seccionales; como así también del buen funcionamiento de las luminarias interiores y exteriores.
- El mantenimiento básico deberá incluir la provisión de materiales de menor costo, como por ejemplo termocuplas, vidrios templados, fuelles, flexibles, vástagos, cueritos, flotantes de descargas de inodoros tornillos varios, cerraduras, bisagras, pasadores, tomacorrientes, llave de punto, y todo accesorio menor que aporte al buen funcionamiento de los establecimientos.

A continuación, se detallan los Establecimientos a intervenir:

#### **NIVEL ESTABLECIMIENTO INICIAL (10)**

- Jardín de Infantes N°2 "El Barquito Travieso"
- Jardín de Infantes N°8 "Caminito de Colores"
- Jardín de Infantes N°14 "Caramelos Surtidos"
- Jardín de Infantes N°15 "Trencito Nevado"
- Jardín de Infantes N° 18 "Caruchas"
- Jardín de Infantes N° 19 "Telkien"
- Jardín de Infantes N° 20 "Lucerito de Fuego"
- Jardín de Infantes N° 24 "Valle de Andorra"
- Jardín de Infantes N° 28 ● Jardín de Infantes N° 29

#### **PRIMARIO (12) GIMNASIO (3)**

- Escuela Provincial N° 1 "Domingo Faustino Sarmiento"
- Escuela Provincial N° 3 "Monseñor Fagnano"
- Escuela Provincial N° 9 "Comandante Luis Piedra Buena"
- Gimnasio Escuela Provincial N°13 "Almirante Guillermo Brown" "
- Gimnasio Esc. N° 15
- Gimnasio Esc. N° 31
- Escuela Provincial N° 16 "Comandante Luis Piedrabuena"
- Escuela Provincial N° 24 "Juan Ruiz Galán"
- Escuela Provincial N° 30 "Oshovia"
- Escuela Provincial N° 31 "Juana Manso"



Gobierno de  
Tierra del Fuego  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

"2023- 40° ANIVERSARIO DE LA RESTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - ZONA NORTE

Ministerio de  
Educación,  
Cultura, Ciencia  
y Tecnología



- Escuela Provincial N° 34 "Yak-Haruin"
- Escuela Provincial N° 39 "Mirador del Olivia"
- Escuela Provincial N° 40 "María Elena Walsh"
- Escuela Provincial N° 41 "Mario Benedetti"
- Escuela Provincial N° 47 del Valle de Andorra
- Escuela Provincial N° 48

#### SECUNDARIO (7) GIMNASIO (2)

- Centro Polivalente de Arte de Ushuaia Prof. Inés María Bustelo
- Gimnasio del Polivalente de Arte
- Colegio Pcial. "José Martí"
- Gimnasio Colegio Sobral
- Colegio Pcial. "Los Andes"
- Colegio Pcial. "Ernesto Sábato"
- Colegio Prov. "Eva Duarte de Perón"
- Colegio Técnico Pcial. "Olga B. de Arko"
- Col. Pcial. Kloketén

#### EXPERIMENTALES (2)

- Escuela Experimental Las Gaviotas
- Escuela Provincial experimental "Los Calafates"

#### ESPECIALES (2)

- Escuela Especial N°1 - Kayú Chénèn
- C.A.A.D

#### RURALES (2)

- Escuela Provincial N°6 "Entre Ríos" y su Anexo Almanza. SUPERIOR (1)
- I.P.E.S

También se realizaron contratación de servicios de pintura para realizar obras por empresas o cooperativa:

#### SERVICIOS DE PINTURA. -

##### **E-11019/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA COLEGIO PROVINCIAL COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - RIO GRANDE-2023.-**

Este servicio tiene como objetivo la contratación de mano de obra para pintura interior y colocación de membrana líquida en techos en el establecimiento educativo.

- Los edificios afectados por esta obra son: En rio grande 1
- Monto del contrato: \$18.581.900,00
- Tramitado según Expte.: 11019/23
- Inicio de obra: a la espera.
- ESTADO: documentación en curso.

##### **SERVICIO DE PINTURA PARA VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DE LA CIUDAD DE USHUAIA.-**

- Este servicio tiene como objetivo es la contratación de mano de obra para pintura en:
- Muros exteriores: C.A.A.D, Escuela Prov. N°13 "Alte. Guillermo Brown", Jardín Materno Infantil "Veo Veo", Escuela Especial N°1 "Kayú Chenén", Jardín de Infantes N°15 "Trencito Nevado", y Colegio Prov. "Ernesto Sábato"



- Pintura interior de paredes y cielorrasos: C.A.A.D. y la Escuela Provincial N°30 "Oshovia" o Techos: Escuela Provincial N°30 "Oshovia". Monto del contrato: \$6.600.000,00
- Tramitado según Expte.: 11319
- Inicio de obra: documentación en tramite

**SERVICIO DE PINTURA PARA LA ESCUELA PROV. N°9 "COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA" Y LA ESCUELA PROVINCIAL N°24 "JUAN RUIZ GALÁN", DE LA CIUDAD DE USHUAIA.-**


Este servicio tiene como objetivo la contratación de mano de obra para pintura exterior y colocación de membrana líquida en techos en los establecimientos educativos.

- Los edificios afectados por esta obra son: Ushuaia 2
- Monto del contrato: \$10.950.000,00
- Tramitado según Expte.: 10684/2023
- Inicio de obra 11 DE ABRIL 2023
- ESTADO: en proceso de pago parcial mediante E-84200/2023

**SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR PARA COLEGIO PROVINCIAL ""KLOKETEN" Y ESCUELA PROVINCIAL N. ° 31"JUANA MANSO" DE LA CIUDAD DE USHUAIA.-**

Este servicio tiene como objetivo la contratación de mano de obra para pintura exterior y colocación de membrana líquida en techos en los establecimientos educativos.

- Los edificios afectados por esta obra son: Ushuaia 2.
- Monto del contrato: \$9.343.000,00
- Tramitado según Expte.: 10745/23
- Inicio de obra 24 de abril
- Estado: finalizado el 10 de mayo 2023-fecha de pago 28/09/2023

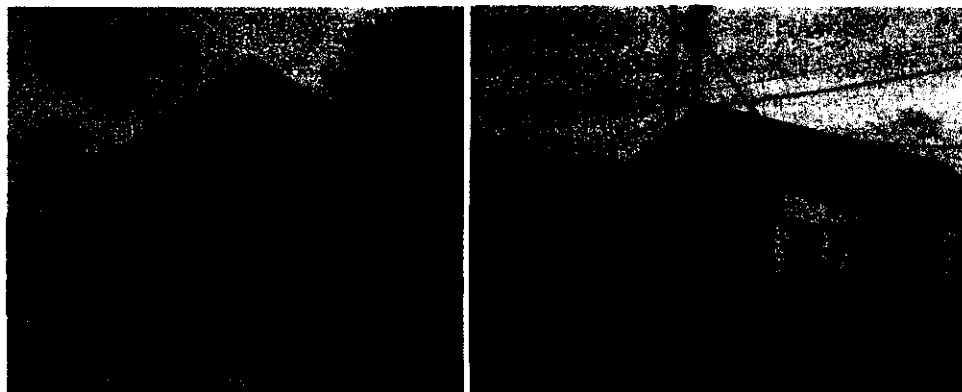






Gobierno de  
Tierra del Fuego  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

"2023- 40° ANIVERSARIO DE LA RESTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - ZONA NORTE

Ministerio de  
Educación,  
Cultura, Ciencia  
y Tecnología

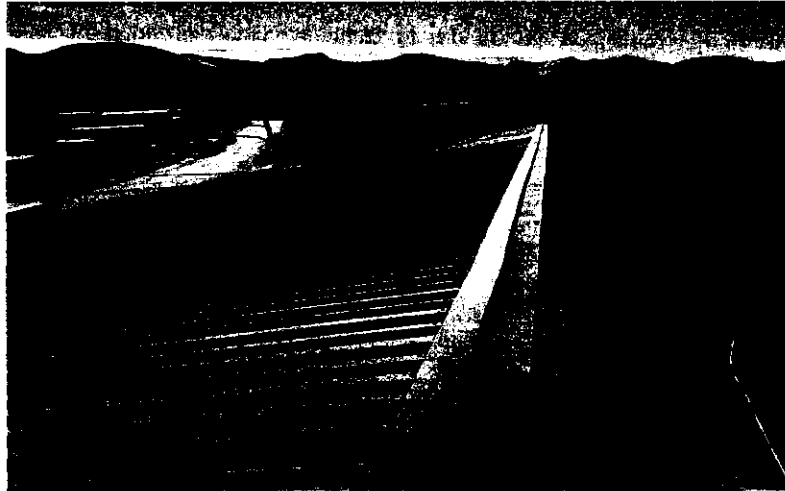

### SERVICIO DE PINTURA PARA VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DE LA CIUDAD DE USHUAIA.-

- Este servicio tiene como objetivo es la contratación de mano de obra para pintura en:
  - **Muros exteriores:** C.A.A.D, Escuela Prov. N°13 "Alte. Guillermo Brown", Jardín Materno Infantil "Veó Veó", Escuela Especial N°1 "Kayú Chenén", Jardín de Infantes N°15 "Trencito Nevado", y Colegio Prov. "Ernesto Sábató"
  - **Pintura interior de paredes y cielorrasos:** C.A.A.D. y la Escuela Provincial N°30 "Oshovia"
  - **Techos:** Escuela Provincial N°30 "Oshovia".
  
- Monto del contrato: \$6.600.000,00
  
- Tramitado según Expte.: 11319/2023
  
- Inicio de obra :07 de septiembre del 2023
  
- **ESTADO: EN PROCESO**

### "SERVICIO DE PINTURA EXTERIOR PARA JARDÍN DE INFANTES N°8 "CAMINITO DE COLORES" Y PINTURA INTERIOR PARA ESCUELA PROVINCIAL N° 39 "MIRADOR DEL OLIVIA" DE LA CIUDAD DE USHUAIA".-

Este servicio tiene como objetivo la contratación de mano de obra para pintura exterior y colocación de membrana líquida en techos en Jardín de Infantes N°8 y mano de obra de pintura interior en Escuela Provincial N°39

- Los edificios afectados por esta obra son: Ushuaia 2
- Monto del contrato: \$12.179.353,30
- Tramitado según Expte.: 10998/23



Gobierno de  
Tierra del Fuego  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

"2023- 40° ANIVERSARIO DE LA RESTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - ZONA NORTE

Ministerio de  
Educación,  
Cultura, Ciencia  
y Tecnología

- Estado: finalizado. fecha de pago 21/09/2023



**SERVICIO DE PINTURA INTERIOR PARA EL CENTRO POLIVALENTE DE ARTE DE USHUAIA  
PROF. INÉS MARÍA BUSTELO.-**

Este servicio tiene como objetivo la contratación de mano de obra para pintura interior en el establecimiento educativo.

- Los edificios afectados por esta obra son: Ushuaia 1
- Monto del contrato: \$10.033.208,00
- Tramitado según Expte.: 11255/23
- Estado: finalizado.fecha de pago 31/08/2023



**SERVICIO DE PINTURA PARA ESCUELA PROVINCIAL Nº 3 "MONSEÑOR FAGNANO" Y  
ESCUELA PROVINCIAL Nº 34 "YAK-HARUIN" DE LA CIUDAD DE USHUAIA.-**

Este servicio tiene como objetivo la contratación de mano de obra para colocación de membrana líquida en techos en los establecimientos educativos.



Gobierno de  
Tierra del Fuego  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

"2023- 40° ANIVERSARIO DE LA RESTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA"


MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - ZONA NORTE

Ministerio de  
Educación,  
Cultura, Ciencia  
y Tecnología



- Los edificios afectados por esta obra son: Ushuaia 2.
- Monto del contrato: \$15.561.000,00
- Tramitado según Expte.: 11227/23
- Inicio de obra el día 17/03/2023
- Estado:finalizado-fecha de pago 31/08/2023



**SERVICIO DE PINTURA PARA LA ESCUELA PROV. N°22 "BAHÍA GOLONDRINA" Y EL JARDÍN DE INFANTES N°10 "CHOWEN", DE LA CIUDAD DE USHUAIA. -**

Este servicio tiene como objetivo la contratación de mano de obra para pintura interior y colocación de membrana líquida en techos en el establecimiento educativo.

- Los edificios afectados por esta obra son: Ushuaia 2.
- Monto del contrato: \$14.950.000,00
- Tramitado según Expte.: 11935/23
- ESTADO: finalizado-fecha de pago 28/08/02023






Gobierno de  
Tierra del Fuego  
Antártida e Islas  
del Atlántico Sur

"2023- 40° ANIVERSARIO DE LA RESTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA  
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA - ZONA NORTE


Ministerio de  
Educación,  
Cultura, Ciencia  
y Tecnología

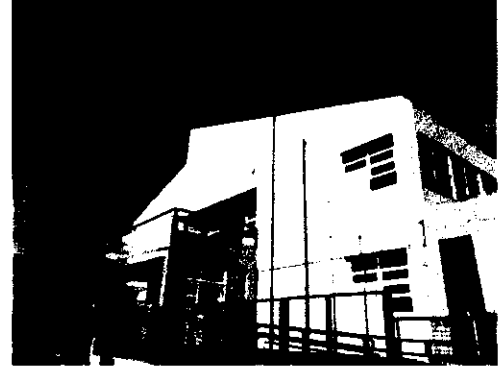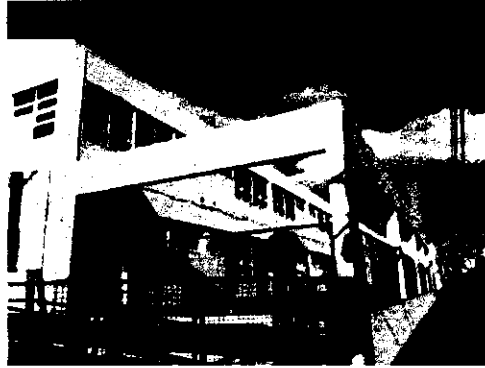

#### SERVICIO DE PINTURA INTERIOR PARA EL COLEGIO. PCIAL. "EVA DUARTE DE PERÓN".-

Este servicio tiene como objetivo la contratación de mano de obra para pintura interior en el establecimiento educativo.

- Los edificios afectados por esta obra son: Ushuaia 1
- Monto del contrato: \$4.870.000,00
- Tramitado según Expte.: 13346/23
- Estado: finalizado -fecha de pago 02/06/2023

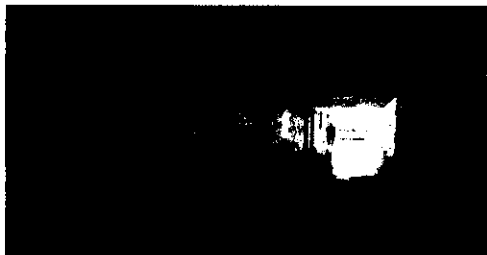

Firmado Electrónicamente por  
AGENTE RIZZI SERGIO JAVIER  
Gobierno de Tierra del Fuego  
DIRECTOR PROVINCIAL DE PROYECTOS ZONA  
NORTE Y CENTRO  
01/12/2023 15:14



Esta Información se  
encuentra resguardada  
en forma digital y/o  
firmada digitalmente



Provincia de Tierra del Fuego,  
Antártida e Islas del Atlántico Sur  
República Argentina  
Ministerio de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología  
Secretaría de Infraestructura

*"2023- 40° Aniversario de la Restauración de la Democracia"*

Nota N° 701/2023.

Letra: S.I (M.E.C.C. y T.)

Río Grande, 03 de noviembre de 2023.

A la  
Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología  
D.I. CUBINO Analia  
S/D

Me dirijo a usted y por su intermedio ante quien corresponda a los efectos de elevar el 4 ° Informe de los avances programados ,de acuerdo a Ley N° 1431 " Programa de Fortalecimiento de Infraestructura Educativa" el mismo abarca el periodo desde el 23 de junio del 2023 hasta el 22 de septiembre del 2023

Sin más, saludo a Ud., muy atentamente. -

M.M.O TURDO, Mauricio  
Secretario de Infraestructura-  
M.E.C.C.yT.

Firmado Electrónicamente por  
MAESTRO MAYOR DE OBRA TURDO MAURICIO  
GUILLERMO  
Gobierno de Tierra del Fuego  
SECRETARIO SECRETARIO DE  
INFRAESTRUCTURA  
03/12/2023 23:55



Esta Información se  
encuentra resguardada  
en forma digital y/o  
firmada digitalmente



"2023 - 40° ANIVERSARIO DE LA RESTAURACIÓN DE LA DEMOCRACIA"

*Provincia de Tierra del Fuego  
Antártida e Islas del Atlántico  
Sur  
República Argentina*

Letra: M.E.C.C. y T.

Ushuaia, 04 de  
diciembre de 2023.-

Referencia: -S/ informe 4° trimestre  
referidos a la Ley N°1431 "Programa de  
Fortalecimiento de Infraestructura  
Educativa".

Al  
Sr. Ministro Jefe de Gabinete  
Lic. Agustín TITA  
S / D

De mi mayor consideración, tengo el agrado de dirigirme a Ud., en mi carácter de Ministra de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología; en relación al Expediente con el registro del corresponde, caratulado: S/ informe 4° trimestre referidos a la Ley N°1431 "Programa de Fortalecimiento de Infraestructura Educativa"..

A fin de solicitar por su intermedio remitir copia del mismo, a la honorable legislatura provincial, para su conocimiento.

*D.I. Analia CUBINO  
Ministra de Educación,  
Cultura, Ciencia y Tecnología.*



Firmado Electrónicamente por  
DISEÑADORA INDUSTRIAL CUBINO ANALIA  
INES  
Gobierno de Tierra del Fuego  
MINISTRO Ministra de Educación, Cultura,  
Ciencia y Tecnología.  
04/12/2023 09:28



Esta Información se  
encuentra resguardada  
en forma digital y/o  
firmada digitalmente
