


12 DIC 2018
 Vicegobernador Arcandó, Juan Carlos
 FIRMA: 

Provincia de Tierra del Fuego
 Antártida e Islas del Atlántico Sur
 USHUAIA 4 de diciembre de 2018
 PRESIDENCIA
 REGISTRO: 4800 | 10 DIC 2018 | N.º: 1036
 FOLIO N.º 19
 CLEROS GONZALEZ
 Auxiliar Administrativo
 Despacho de Presidencia
 PODER LEGISLATIVO

Por la presente y dado que la Ley Provincial de Presupuesto, contemplará viviendas de más de 4 millones de pesos y las nuestras de tan sólo 1,6 millones de pesos,

32 viviendas Kepan Ushuaia \$ 109.739.508,58 = \$ 3.429.359,64 por vivienda.

128 viviendas Mysten Ushuaia \$ 437.895.726,98 = \$ 3.421.060,36 por vivienda.


29 viviendas Casa Base Ushuaia \$ 49.000.000 = \$ 1.689.655,17 por vivienda.


24 viviendas Mirador del Olivia Ushuaia \$ 100.799.067,05 = \$ 4.199.961,12 por vivienda

solicitamos pueda ayudarnos a que este proyecto que defiende el comercio y los puestos de trabajo locales, a través del **COMPRE FUEGUINO** del 100% de los insumos que utiliza para la construcción de las viviendas, y que ha decidido no emplear la obra pública para el beneficio de unos pocos, **ahorrando de esa manera más de un millón de pesos por vivienda**. Y que sumado a lo anterior, ha construido **viviendas dignas, como manda nuestra Constitución Provincial**, requiere, para poder continuar desarrollándose en forma virtuosa -compensando la enorme diferencia de precios con las otras viviendas- una ayuda en máquinas. Estas máquinas no sólo se emplearán para la fabricación de insumos de las 29 viviendas en cuestión. Además de **generar puestos de trabajo** en dicha fabricación, proveerá de estos insumos a las 500 familias que se han integrado al nuevo proyecto de barrio de la cooperativa de viviendas Nuestro Techo y al mercado local en general.

El listado de máquinas y algunos ejemplos de lo que con ellas se pretende producir, se adjunta a continuación.

Agradeciendo su atención y a la espera de una respuesta, saluda atentamente:


 Branca Javier.

SECRETARIA
 LEGISLATIVA

 Juan Carlos ARCANDO
 Vicegobernador
 Presidente del Poder Legislativo

Secretario Cooperativas de Trabajo Casa Base y de Viviendas Nuestro Techo.

02901-1551-3123.

11/12/18

Antes de
Firma

MIA
sto

Presupuesto 2019

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN U OBRAS

Provincial de Vivienda

Denominación del proyecto u obra (3)	Fecha			Clase (7)	Ubicación Geográfica (8)	Avance físico % (9)	Avance físico % (10)	Costo Total (11)	Ejecución acumulada al 30/05/18 (12)	Ejecución estimada al 31/12/18 (13)	Programación Financiera		
	Inicio (4)	Finalización (5)	Contractual (6)								Año 2019 (14)	Año 2020 (14)	Resto de los años (14)
55 viviendas - tolhuin	10/11/2018	15/04/2019			TOLHUIN	62,37	83	6.785.967,00	4.793.587,00	6.693.571,00	72.396,00	0,00	0,00
108 viviendas - margen sur - Renglon I	14/02/2017	15/03/2019			RIO GRANDE	56,18	77,57	24.175.389,00	12.194.066,00	17.793.086,00	6.392.303,00	0,00	0,00
108 viviendas - margen sur - Renglon II	14/02/2017	15/03/2019			RIO GRANDE	58,71	79,19	21.897.792,00	11.690.270,00	16.453.053,00	5.434.739,00	0,00	0,00
Mejoramiento del Hábitat - Infraestructura I	20/09/2017	15/10/2018			RIO GRANDE	0	43,92	14.145.224,00	0,00	6.212.582,00	7.932.642,00	0,00	0,00
Nuevo Acceso a la Urbanización Río Pipo	27/10/2017	15/02/2019			USHUAIA	53,84	71,93	1.402.263,00	897.485,00	1.193.498,00	208.797,00	0,00	0,00
Urbanización 11 de Noviembre - Apertura de Calles	06/11/2017	18/02/2019			USHUAIA	54,37	89,37	5.235.800,00	0,00	2.879.745,00	2.356.155,00	0,00	0,00
Rehabilitación y Puesta en Valor - 300 Viv. R I	06/11/2017	01/10/2018			USHUAIA	29,86	41,72	8.981.684,00	2.651.931,00	3.747.158,00	5.234.525,00	0,00	0,00
Rehabilitación y Puesta en Valor - 300 Viv. R II	23/11/2017	21/10/2018			USHUAIA	32,17	58,7	12.123.558,00	3.900.148,00	6.674.057,00	5.249.501,00	0,00	0,00
Rehabilitación y Puesta en Valor - 300 Viv. R III	17/11/2017	15/10/2018			USHUAIA	37,43	55,91	5.782.409,00	2.164.358,00	3.232.945,00	2.549.464,00	0,00	0,00
22 Viviendas - Coop. Ara Santa Fe	06/07/2018	02/05/2019			USHUAIA	0	82,21	12.496.140,00	0,00	10.273.077,00	2.223.063,00	0,00	0,00
GEF VIVIENDA SUSTENTABLE	01/03/2019	28/12/2019				0	0	18.377.042,00	0,00	0,00	18.377.042,00	0,00	0,00
ATE RED ELÉCTRICA 120 VIV SECCIÓN X	01/09/2018	28/02/2019			RIO GRANDE	0	86	15.909.212,00	0,00	13.522.830,00	2.386.382,00	0,00	0,00
ATE RED DE GAS 120 VIV SECCIÓN X	01/09/2018	28/02/2019			RIO GRANDE	0	85	5.818.371,00	0,00	4.773.915,00	842.456,00	0,00	0,00
Remod. y refunc. - etapa 2 - edificio IPV	01/02/2019	02/05/2019			USHUAIA	0	0	3.450.000,00	0,00	0,00	3.450.000,00	0,00	0,00
Gimnasio colegio monseñor aleman	11/06/2018	11/06/2019			USHUAIA	19,31	42	32.893.023,00	6.351.643,00	13.815.070,00	12.726.311,00	0,00	0,00
Ampliación iglesia sagrada familia	18/05/2018	14/03/2019			RIO GRANDE	15	75	5.345.034,00	801.755,00	4.006.776,00	1.336.258,00	0,00	0,00
48 viviendas APEL infraestructura urbana	12/01/2017	06/09/2018			USHUAIA	81,11	94,83	685.053,00	717.667,00	839.296,00	45.757,00	0,00	0,00
Pavimentación Parque Industrial Etapa I	20/02/2017	15/03/2018			RIO GRANDE	0	0	22.428.258,00	0,00	19.931.991,00	2.496.266,00	0,00	0,00
SEDE SOCIAL APA aeronauticos	08/01/2018	03/01/2019			RIO GRANDE	48,69	90,92	22.038.509,00	10.730.550,00	20.037.412,00	2.001.097,00	0,00	0,00
SUM Asociación de Taximetrista Unidos	02/02/2018	28/01/2019			RIO GRANDE	50,42	91,14	22.581.632,00	11.385.659,00	20.880.900,00	2.000.732,00	0,00	0,00
PROGRAMA INSPECCION DE OBRAS	01/01/2019	31/12/2019				0	0	3.500.000,00	1.495.207,00	372.400,00	1.632.393,00	0,00	0,00
PROGRAMA BARRIO COLOMBO	01/01/2019	31/12/2019				0	0	5.000.000,00	0,00	1.500.000,00	3.500.000,00	0,00	0,00
PROGRAMA DISEÑO DE OBRA	01/01/2019	31/12/2019				0	0	2.000.000,00	0,00	0,00	2.000.000,00	0,00	0,00
PLAN EMERGENCIA	01/01/2019	31/12/2019				0	0	3.750.000,00	0,00	750.000,00	3.000.000,00	0,00	0,00
PLAN DE SANEAMIENTO DOMINIAL	01/01/2019	31/12/2019				0	0	3.000.000,00	126.500,00	177.000,00	2.696.500,00	0,00	0,00
PROGRAMA HOGAR FUEGUINO	01/01/2019	31/12/2019				0	0	10.000.000,00	0,00	2.795.298,00	7.204.704,00	0,00	0,00
PROGRAMA "COMPRE FUEGUINO"	01/01/2019	31/12/2019				0	0	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
Ampliación concejo deliberante - etapa II	15/12/2018	08/02/2020			USHUAIA	0	21,53	31.297.079,00	0,00	6.738.261,00	19.647.054,00	4.911.784,00	0,00
URBANIZACION BTF	01/01/2019	31/12/2019			USHUAIA	0	0	30.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	0,00	0,00
29 VIV COOP CASA BASE	01/03/2019	21/10/2020			USHUAIA	0	0	49.000.000,00	0,00	0,00	30.000.000,00	19.000.000,00	0,00
32 Viviendas KEPAN USHUAIA	15/02/2019	29/12/2020			USHUAIA	0	0	32.921.852,58	0,00	0,00	6.564.371,00	26.337.482,00	0,00
24 viviendas mirador del olivia USHUAIA	15/10/2019	28/12/2020			USHUAIA	0	0	30.239.720,05	0,00	0,00	5.445.150,00	24.796.570,00	0,00
128 Viviendas MYSTEN USHUAIA	15/10/2019	28/12/2020			USHUAIA	0	0	131.368.717,98	0,00	0,00	13.158.872,00	118.231.846,00	0,00
34 VIVIENDAS BARRIO MALVINAS ARGENTINAS	15/10/2019	28/12/2020			RIO GRANDE	0	0	31.723.218,35	0,00	0,00	7.936.805,00	23.792.413,00	0,00
134 VIVIENDAS BARRIO MALVINAS ARGENTINAS RIO GRAN	15/10/2019	28/12/2020			RIO GRANDE	0	0	125.026.801,71	0,00	0,00	12.502.880,00	112.524.122,00	0,00
Laboratorio Río Grande	01/02/2019	02/05/2019			RIO GRANDE	0	0	2.300.000,00	0,00	0,00	2.300.000,00	0,00	0,00
55 viviendas - tolhuin	10/11/2018	15/04/2019			TOLHUIN	52,37	83	89.995.937,00	47.130.872,00	74.696.627,00	15.299.310,00	0,00	0,00

Los Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"
Muriel Alemei MARTINEZ



Antecedente

Ver

2

MIA
sto

Presupuesto 2019


PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN U OBRAS

Provincial de Vivienda

Denominación del proyecto u obra (3)	Fecha			Clase (7)	Ubicación Geográfica (8)	Avance físico % (9)	Avance físico % (10)	Costo Total (11)	Ejecución acumulada al 30/06/18 (12)	Ejecución estimada al 31/12/18 (13)	Programación Financiera		
	Inicio (4)	Finalización (5)	Contractual (6)								Año 2019 (14)	Año 2020 (14)	Resto de los años (14)
108 viviendas - margen sur Región I	14/02/2017	15/03/2019			RIO GRANDE	56,19	77,57	75.941.629,00	42.671.601,00	58.907.922,00	17.033.707,00	0,00	0,00
108 viviendas - margen sur Región II	14/02/2017	15/03/2019			RIO GRANDE	68,71	79,19	74.246.693,00	43.648.844,00	58.875.148,00	15.471.547,00	0,00	0,00
Nuevo Acceso a la Urbanización Río Pipo	27/10/2017	15/02/2019			USHUAIA	63,84	71,93	93.341.761,00	50.255.204,00	67.140.729,00	28.201.032,00	0,00	0,00
Urbanización 11 de Noviembre - Apertura de Calles	06/11/2017	18/02/2019			USHUAIA	54,37	89,37	20.211.227,00	10.868.844,00	18.062.773,00	2.148.454,00	0,00	0,00
22 Viviendas - Coop. Submarino Ara Santa Fe	06/07/2018	02/05/2019			USHUAIA	0	25	22.811.499,00	0,00	0,00	19.439.959,00	3.371.540,00	0,00
Infraestructura - Urbanización Río Pipo - Sector III	17/10/2017	07/10/2019			USHUAIA	21,91	30,22	344.748.771,00	75.534.456,00	179.717.535,00	144.784.484,00	20.236.752,00	0,00
48 viviendas APEL - ushuaia	18/01/2017	30/09/2018			USHUAIA	85,05	100	69.432.066,00	59.051.972,00	65.529.983,00	3.902.083,00	0,00	0,00
48 viviendas APEL - infraestructura urbana - ushuaia	12/01/2017	06/09/2018			USHUAIA	82,89	100	11.622.198,00	9.790.418,00	11.210.988,00	511.208,00	0,00	0,00
19 Viviendas AMUGENAL	01/02/2019	27/03/2020			USHUAIA	0	0	13.966.969,00	0,00	0,00	13.966.969,00	0,00	0,00
64 Viviendas HANUKA	01/02/2019	27/03/2020			USHUAIA	0	0	43.888.861,00	0,00	0,00	43.888.861,00	0,00	0,00
Ciuga B de ARKO	15/11/2018	13/02/2019			USHUAIA	0	50	5.979.844,00	0,00	2.989.422,00	2.989.422,00	0,00	0,00
9 VIVIENDAS-MACIZO E-MACIZO 30-PARCELA 3	15/10/2019	10/08/2020			RIO GRANDE	0	0	6.323.227,00	0,00	0,00	6.323.227,00	0,00	0,00
58 VIVIENDAS SECCION G-REGLON 1 y 2	15/10/2019	28/12/2020			RIO GRANDE	0	0	30.036.123,00	0,00	0,00	9.010.837,00	21.025.286,00	0,00
9 VIVIENDAS SECCION K-MACIZO 147A-PARCELA 13	15/10/2019	10/08/2020			RIO GRANDE	0	0	5.064.548,00	0,00	0,00	5.064.548,00	0,00	0,00
54 VIVIENDAS-BARRIO MALVINAS ARGENTINAS	15/10/2019	28/12/2020			RIO GRANDE	0	0	25.533.580,00	0,00	0,00	7.680.074,00	17.873.506,00	0,00
24 VIVIENDA- CHACRA 13	15/10/2019	28/12/2020			RIO GRANDE	0	0	14.893.193,00	0,00	0,00	4.467.958,00	10.425.235,00	0,00
42 VIVIENDAS ATSA	15/10/2019	28/12/2020			RIO GRANDE	0	0	22.527.093,00	0,00	0,00	6.758.128,00	15.768.965,00	0,00
32 VIVIENDAS "SUPASS"	15/10/2019	28/12/2020			USHUAIA	0	0	28.329.124,00	0,00	0,00	7.898.737,00	18.430.387,00	0,00
32 Viviendas "PRENSA"	15/10/2019	28/12/2020			USHUAIA	0	0	29.310.992,00	0,00	0,00	6.793.298,00	20.517.694,00	0,00
48 Viviendas SUEF	15/10/2019	28/12/2020			USHUAIA	0	0	47.131.134,00	0,00	0,00	14.139.340,00	32.991.794,00	0,00
32 Viviendas AMPS	15/10/2019	28/12/2020			USHUAIA	0	0	33.515.473,00	0,00	0,00	10.054.842,00	23.460.631,00	0,00
Fueguinos Autoconvocados	15/10/2019	28/12/2020			USHUAIA	0	0	38.410.576,00	0,00	0,00	11.823.173,00	26.587.402,00	0,00
32 Viviendas KEPAN USHUAIA	15/10/2019	28/12/2020			USHUAIA	0	0	78.817.658,00	0,00	0,00	15.363.531,00	61.454.126,00	0,00
24 viviendas mirador del olivia USHUAIA	15/10/2019	28/12/2020			USHUAIA	0	0	70.559.347,00	0,00	0,00	12.700.882,00	57.858.465,00	0,00
128 Viviendas MYSTEN USHUAIA	15/10/2019	28/12/2020			USHUAIA	0	0	308.527.009,00	0,00	0,00	30.852.701,00	275.874.308,00	0,00
34 VIVIENDAS BARRIO MALVINAS ARGENTINAS	15/10/2019	28/12/2020			RIO GRANDE	0	0	74.020.843,00	0,00	0,00	18.505.211,00	55.515.632,00	0,00
134 VIVIENDAS BARRIO MALVINAS ARGENTINAS RIO GRAN	15/10/2019	28/12/2020			RIO GRANDE	0	0	291.729.204,00	0,00	0,00	29.172.920,00	262.556.284,00	0,00
Urbanización Tolhuin	15/10/2019	09/10/2020			TOLHUIN	0	0	91.832.285,00	0,00	0,00	18.326.457,00	73.305.828,00	0,00
Ap. calles y redes de infra. 350 lotes B° Colombo	15/08/2019	10/08/2019			USHUAIA	0	40	55.042.723,00	0,00	22.017.089,00	33.025.634,00	0,00	0,00
GEF VIVIENDA SUSTENTABLE	01/03/2019	24/02/2020				0	0	34.075.841,41	0,00	0,00	23.852.949,00	10.222.892,00	0,00
PAVIMENTACION PARQUE INDUSTRIAL 2DA ETAPA	01/03/2019	24/02/2020			RIO GRANDE	0	0	75.000.000,00	0,00	0,00	52.500.000,00	22.500.000,00	0,00
Pavimento B° malvinas argentinas 2° Etapa	15/11/2018	10/10/2019			RIO GRANDE	0	0	82.230.248,00	0,00	21.379.864,00	60.850.384,00	0,00	0,00
Mejoramiento Barrio Chacra II	01/01/2019	31/12/2019			RIO GRANDE	0	0	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00
Mejoramiento Barrio Chacra IV	01/01/2019	31/12/2019			RIO GRANDE	0	0	140.000.000,00	0,00	0,00	140.000.000,00	0,00	0,00
Iluminación Barrios IPV	01/01/2019	31/12/2019			RIO GRANDE	0	0	6.522.000	0,00	0,00	6.522.000	0,00	0,00
TOTAL								3.371.166.319,09	408.812.435,00	765.723.968,00	1.237.597.881,00	1.369.871.123,00	0,00

Myriam Noemi MARTINEZ




"Las Islas Malvinas, Georgias y Sandwich del Sur son y serán Argentinas"











*“Listado Orientativo
De
Máquinas
Para Donar”*


- Bloquera BV 3. Cantidad: 1
- Mezcladora de Régimen Forzado Rauzi MR 200. Cantidad: 1
- Sistema de alimentación de hormigón CTR/BV 3. Cantidad: 1
- Molde de 5 bloques de 20x20x40. Cantidad: 1
- Molde de 7 bloques de 15x20x40. Cantidad: 1
- Molde de 5 bloques U para encadenado de 20x20x40. Cantidad: 1
- Molde de 16 adoquines tipo UNI. Cantidad: 1
- Molde de 16 adoquines rectangular. Cantidad: 1
- Bandejas de Desmolde para bloques y adoquines.
- Tablas fenólicas para transporte de material moldeado. Cantidad: 200
- Carro para transporte de material moldeado. Cantidad: 1

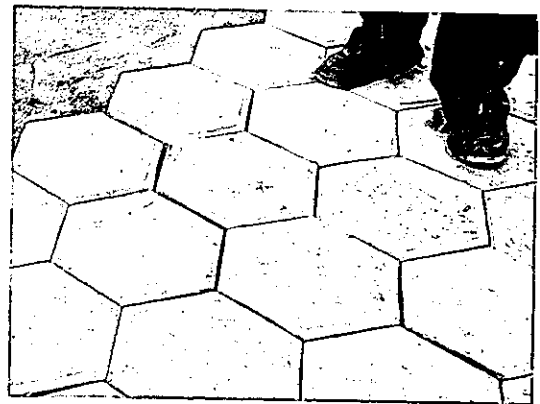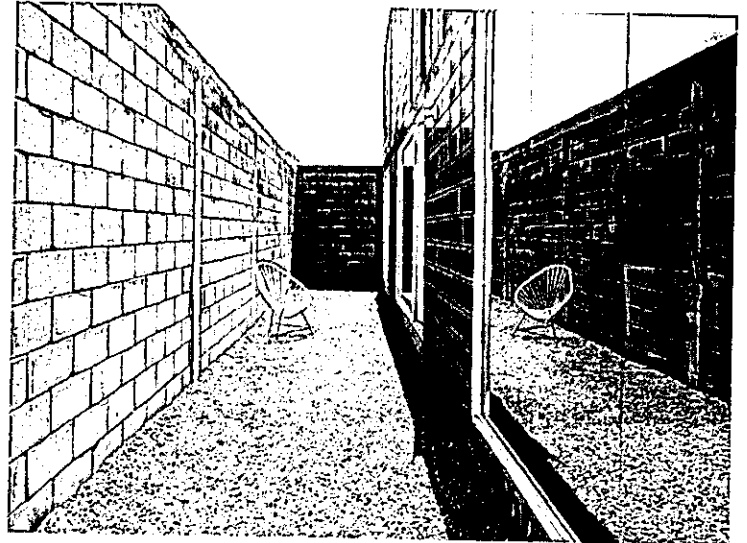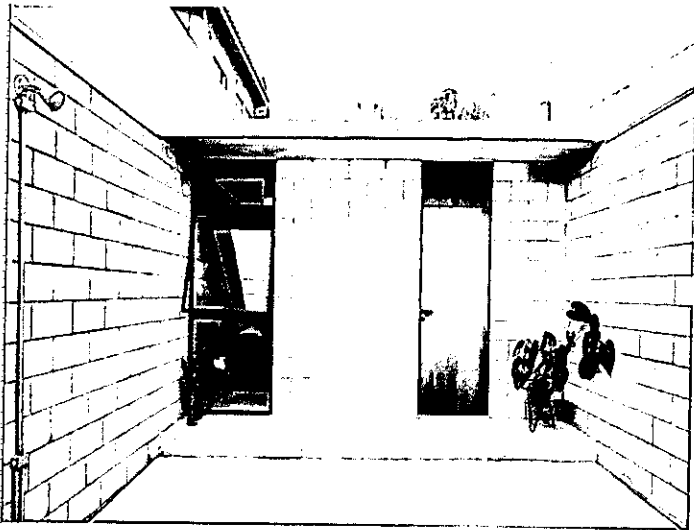



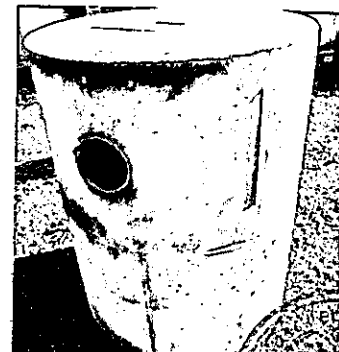

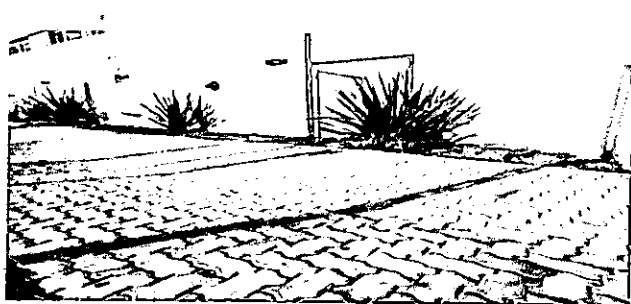


- Pegadora De Tapacantos Preencolados Casadei V 315. Cantidad: 1
- Escuadradora Carpinteria Sm-3200d Con Incisor / Melamina. Cantidad: 1
- Router Pantografo Cnc Fresadora 1500 X 150. Cantidad: 1
- Taladradora De Banco Barbero Abm 22/25 Trifasica. Cantidad: 1
- Sierra Circular De Banco Makita Mlt100 Disco 255 Caballito. Cantidad: 1
- Sierra Circular Makita 1200w Profesional + 3 Discos Maletin. Cantidad: 1
- Atornillador Taladro Percutor Makita 18v Dhp453z S/ Bateria. Cantidad: 2
- Martillo Carpintero Mango De Madera Herramientas Stanley. Cantidad: 4

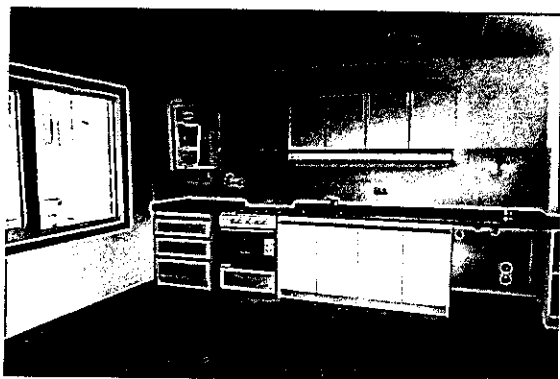

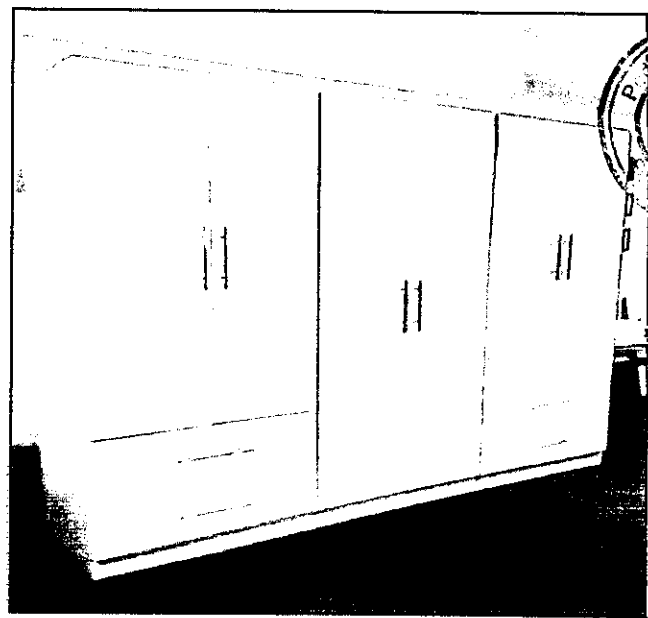

- Plegadora Hidráulica Nueva Con Control. Cantidad: 1
- Soldadora Titan Mig Mag Inverter Trifasica / Monofasica Isat. Cantidad: 1
- Guillotina De Chapa Marca Duub De 2.50 Mts 2mm. Cantidad: 1
- Cilindradora Roladora 1500 Mm Motorizada Nueva. Cantidad: 1
- Soldadora Inverter-tig Ac/dc 250 Amp Neo. Cantidad: 3
- Equipo Oxicorte 6 M3 Acetileno Y Oxigeno Completo Y Carro. Cantidad: 1
- Amoladora Angular 7pul (180mm) Makita Ga7020 2200w. Cantidad: 2
- Sierra Sensitiva Makita 2414nb 2000w + 5 Discos. Cantidad: 1
- Atornillador Makita Fs 2701 570 W Para Techista Con Torque. Cantidad: 2

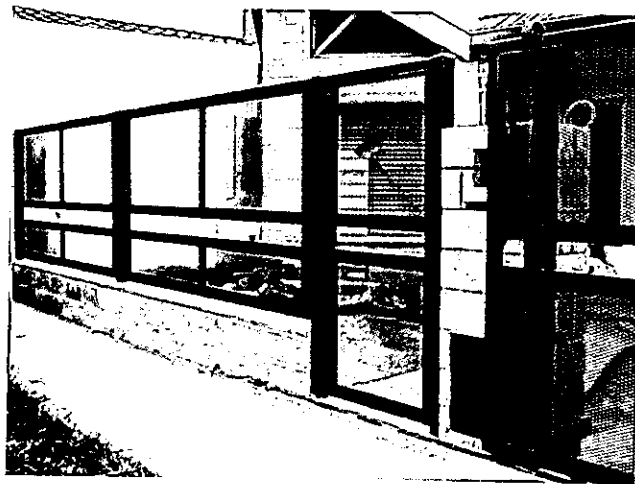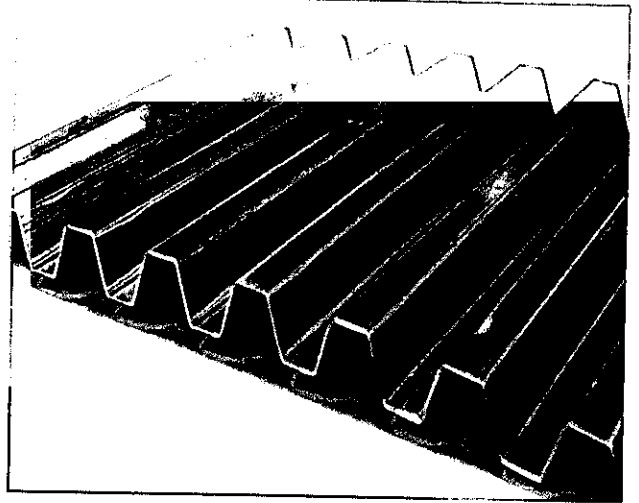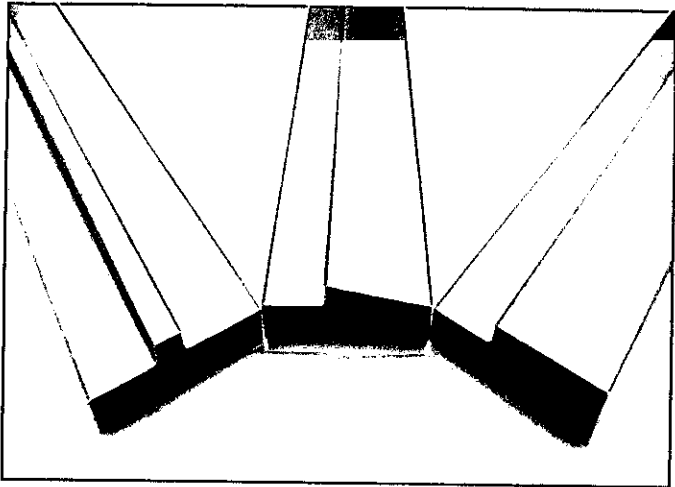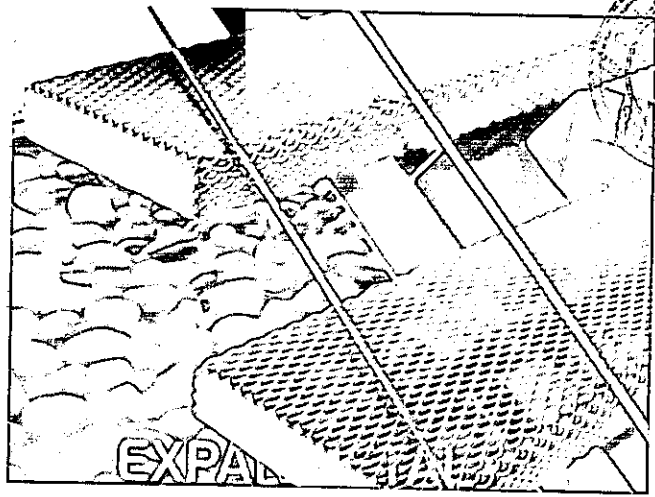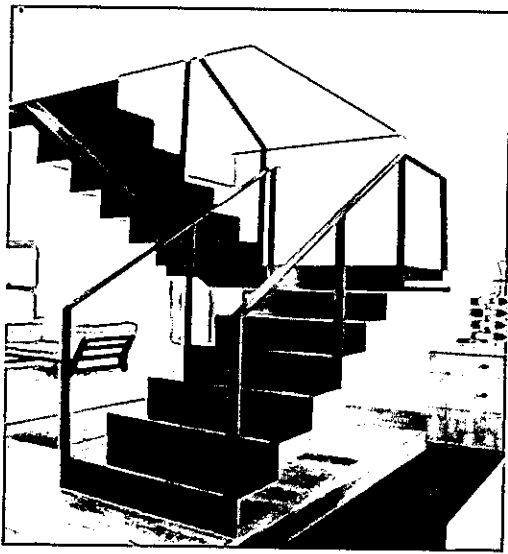

- Tronzadora con topes medidores
- Fresadora copiadora
- Fresadora retestadora
- Prensa manual o neumática para matrices

