

PODER LEGISLATIVO



PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO,
ANTÁRTIDA E ISLAS DEL ATLÁNTICO SUR
REPÚBLICA ARGENTINA

COMUNICACIONES OFICIALES

Nº: 016

PERIODO LEGISLATIVO: 2024.

Extracto:

MINISTERIO DE EDUCACIÓN NOTA Nº 1076/24
ADJUNTANDO INFORME SOBRE "PROGRAMA DE
FORTALECIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA"
CORRESPONDIENTE AL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO
2023.

Entró en la Sesión de: _____

Girado a la Comisión Nº: _____

Orden del día Nº: _____



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur
 República Argentina

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

301	09 ABR. 2024	11:26
FOLIOS		

Cristian RIGONI FUENTES
 Jefe Dpto. Tramite Documental
 Dirección Despacho Presidencia
 Poder Legislativo

"2024 - 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA
 DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"



NOTA N° 1076/ 2024.-
 LETRA: U.M - M. ED.-

RIO GRANDE, 8 de abril de 2024.-
 SEÑORA PRESIDENTE:

Por medio de la presente me dirijo a usted a efectos de remitirle los informes de avances de las obras y servicios, programados a través de la Ley N°1431 "Programa de Fortalecimiento de Infraestructura Educativa" durante el transcurso del cuarto trimestre, que abarca el período desde el 23 de septiembre del 2023 hasta el 22 de diciembre del 2023.

Lic. Pablo Gustavo Daniel LOPEZ SILVA
 Ministro de Educación

A LA SEÑORA
 PRESIDENTE DE LA
 LEGISLATURA PROVINCIAL
 Dña. Mónica Susana URQUIZA
 S/D.-

PODER LEGISLATIVO
 SECRETARÍA LEGISLATIVA

10 ABR 2024

MESA DE ENTRADA
 N° 016 HS. 12:50 FIRMA: [Signature]

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

[Signature]


María E. Domínguez
 Directora de Administración Unidad Ministro
 Subsecretaría de Apoyo Institucional
 Ministerio de Educación

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"

Firmado Electrónicamente por
LICENCIADO/A LOPEZ SILVA PABLO GUSTAVO
DANIEL
Gobierno de Tierra del Fuego
MINISTRO MINISTRO DE EDUCACION
08/04/2024 15:21




Esta información se
encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente



Nancy E. Dominguez
Sector de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

SECRETARIA
LEGISLATIVA




Damián Alberto LÖFFLER
Vicepresidente 1º
PODER LEGISLATIVO

10 ABR 2024



Provincia de Tierra del Fuego, Antártida
e Islas del Atlántico Sur
República Argentina



«2024 - 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994»

NRO
MED-N-8585-2024


AÑO
2024

FECHA 15/03/2024

EXTRACTO

Grupo de Trámites: PROC.ADM - PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Sub-Trámite: REMISIÓN INTERNA DE DOCUMENTACIÓN
Ubicación: Zona Norte
Ámbito Origen: (1640)MINISTERIO DE EDUCACION
Usuario: SERGIO JAVIER RIZZI
Área Origen: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA - MED
Detalle: Informe N°5 de la ley 1431/22 y relevamiento Ley 1501 para presentar a la Legislatura

Esta información se
encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente


Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

Firmado Electrónicamente por
MAESTRO MAYOR DE OBRA TURDO MAURICIO
GUILLERMO
Gobierno de Tierra del Fuego
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
15/03/2024 13:11



Esta información se
encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaria de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE LA REPÚBLICA ARGENTINA"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



Esta información se
encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente

Walter E. Bordini
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

Río Grande, 11 de marzo de 2024
Letra: S.IE. - M.ED.
Nota N° 177 / 2024

A LA LEGISLATURA DE LA PROVINCIA DE T.D.F.A.I.A.S.

S / D

Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de brindar información referida a la Ley provincial N° 1431 del "PROGRAMA FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA EN LOS ESTABLECIMIENTOS DE GESTIÓN ESTATAL, EN TODAS SUS MODALIDADES Y NIVELES DEPENDIENTES DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CULTURA, CIENCIA Y TECNOLOGÍA DE LA PROVINCIA" y Ley provincial N° 1501 que prorroga la anterior.

Relevamiento de situación

Se adjunta relevamiento de la situación de los establecimientos y las posibles tareas a realizar. Se adjunta la planilla "Relevamiento zona Norte y Centro" y "RELEVAMIENTO REALIZADO HASTA DICIEMBRE DEL 2023" que corresponde a la Zona Sur.

Ambas, corresponden al último relevamiento realizado, donde se incorpora al mismo todos los trabajos, sean estos pendientes, trabajos nuevos, correcciones y/o parte de la garantía de obras ya concluidas sin discriminar lo ya licitado, de lo que faltaría realizar.

Este relevamiento luego será analizado y procesado por personal técnico de esta secretaría, para determinar prioridades, delegar a cada sector específico para su solución o propuesta de mejora, o lo que se considere necesario para mejorar la situación relevada, y de ser necesario, descartar aquellos ítems que se consideren resueltos, innecesarios o sea una duplicidad de tareas.

Se trata de un relevamiento general, sin asignación de trabajos.

Nuevos expedientes

Los expedientes nuevos hasta el día 10 de febrero de 2024 son los siguientes

- E- 2132/24 "ADQUISICIÓN DE 2 (DOS) TERMOTANQUES: UNO PARA EL JARDÍN DE INFANTES N°2 "BARQUITO TRAVIESO"; Y OTRO PARA LA ESCUELA PROVINCIAL N°48 DE LOS ALAKALUFES". Fecha de inicio: 04/01/2024.
- E- 4911/24 "ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS". Fecha de inicio: 16/01/2024.



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

MINISTERIO DE EDUCACIÓN
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA



- E- 6575/24 "Adquisición de Materiales para el mantenimiento preventivo en los establecimientos educativos de la provincia de Tierra del Fuego". Fecha de inicio: 23/01/2024.
- E- 7041/24 "ADQUISICIÓN DE VASOS EXPANSORES Y VÁLVULAS DEALIVIO". Fecha de inicio: 25/01/2024.
- E- 496/24 "Servicio regulación de Gas". Fecha de inicio: 02/01/2024.
- E- 1003/24 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN". Fecha de inicio: 03/01/2024.
- E- 996/24 "SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN". Fecha de inicio: 03/01/2024.
- E-75483-23 "ADQUISICIÓN DE UN CALEFACTOR PARA EL JARDÍN DE INFANTES N° 4 Y UNO PARA EL CENTRO EDUCATIVO Y DE FORMACIÓN
- E-77607-23 ADUISIONDE TERMOTANQUE PARA LA ESCUELA N° 32 EN LA CIUDAD DE RIO GRANDE

Sin más saluda a usted Atte.

Esta información se
encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaria de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

RELEVAMIENTO REALIZADO HASTA DICIEMBRE DEL 2023 EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS


ESTABLECIMIENTOS	TRABAJOS PENDIENTES
Jardín de Infantes N°2	Baño sala naranja, colocar ceramicos en pared faltantes
	Pérdida del inodoro del baño que está a lado de la cocina
	Filtración j2 en cielorraso sobre caldera en sum, sector de aulas (azul, amarilla y sala de maestros)
	Se va a retirar termotanque
Jardín de Infantes N°7	-
Jardín de Infantes N°8	Sala verde se descubrio que esta tapada la cloaca, porque desagotan el agua y la devuelve
	En el baño privado uno de los inodoros pierde agua
	La canilla de la cocina gotea
	Cocina perdida en una grifería
	1 tubo para cambiar 1 foco para cambiar
Jardín de Infantes N°10	Sellar filtración en terraza que da al hall
Jardín de Infantes N°14	Verificar y reparar filtración de conducto salida de gases jardín 14, caldera 2
	Reparación bomba, colocación accesorio T radiador pasillo.
Jardín de Infantes N°15	Perdida en techo de gabinete
	Reparación monocomando baño niños, tapar piletas abiertas (2) reparar piso ceramico.
Jardín de Infantes N°18	Sala Violeta no funciona la mochila de baño
	Biblioteca cerámicos faltantes en baño
	Grifería suelta
	Dos plafones circulares quemados
	Sala verde grifería suelta
	Baño izquierdo sector cocina en box 2 no funciona el boton de descarga
Jardín de Infantes N°19	Radiador roto
	Sala verde un plafón circular embutir
Jardín de Infantes N°20	Sala amarilla y sala verde, están perdiendo los radiadores
	10 reflectores en sum (50w)
	Colocar durlock en gabinete
	Colocar carcasa de fan coil (andamio)
	Filtraciones manchas en techo
	1 termotanque para retirar en sector pomys 1 plafon quemado en pomys
Jardín de Infantes N°24	-
Jardín de Infantes N°28	-
Jardín de Infantes N°29	Sala de maquina: verificar posible gotera
	Baño sala azul canilla pierde monocomando
Jardín Materno Infantil Veo Veo	
	Termotanqe pierde por la union de caño izquierdo (cocina inundada)

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

 Nany F. Dominguez
 Directora de Asesoría Técnica, Unidad Ejecutiva
 Subsecretaría de Apoyo Institucional
 Ministerio de Educación

Escuela Provincial Nº 1	Sala de máquinas colocar rejilla cuando se pueda
	Baño docentes pb ala derecha picaporte
	Retirar pegotes
	1 caldera sin extractor de gases
	Desagotar sotano
Escuela Provincial Nº 3	Ventanas brazo de empuje varios faltantes
	Gimnasio baño mujeres 1er box pierde
	Luces: 2 tira led pasillo. 3 cocina tira led. 1 planta alta. plafones circulares: aula 2ºD titilan 2. aula 4º titilan 3. aula 5ºD 1 titila. aula 4ºtitila 1
	Porton oxidado - bisagra rota
	Puerta de acceso al generador del pasillo descuadrada
	Faltan tapas de inodoros en varios box
	Baño nenas perdida en grifería
	Baño docentes en dirección filtración en techo verificar
	Aula 4C calefactor con cámara fisurada
	Se salieron 33 azulejos, se salvaron 18 y se rompieron 15 (baño varones)
Escuela Provincial Nº 6	-
Escuela Provincial Nº 6 -	-
Escuela Provincial Nº9	Baño accesible no cierra
	Ventanas sin tope
	Baños de 1er grado cerrados
	Limpieza canaleta (caño 110 y codo que se ve desde el sum)
	Baño accesible colocar placa
Escuela Provincial Nº 13	Limpieza camara de grasa exterior
	Colocación de rejas de ventiluz
Gimnasio Escuela Provincial Nº 13	Filtración en aulas de abajo
	Grifería suelta
	Flotante con tornillo
	Baño de nenas no tiene ceramicos
	Caja en el ducto de calefacción
	Agujeros en el techo del pasillo de sum
	Puerta que conecta esc. y gim cerradura rota
	Filtración en techos y paredes en sala de maquinas
Escuela Provincial Nº 15	6 luces galponeras rosquilla E-40 quemados
	Baño niñas falta ceramicos en camara
	Tercer aula planta alta a la izquierda: pierde radiador y esta frio
	Primer aula a la izquierda planta alta: liston led y un estanco quemados
	FILTRACIÓN EN TECHO DE GABINETE
Gimnasio Escuela Provincial Nº 15	Verificar 2 equipos en entretecho, realizar acceso a ellos
	Reparar filtraciones en cubierta e ingreso de palomas a entretecho
	Pintar paredes y piso de aula 1er piso, color verde y reparar ventana, zocalo
	Filtración en sala de música ventana y cielorraso
Escuela Provincial Nº 16	1 equipo ciroc s/quemador

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente



 Nancy E. Domínguez
 Directora de Administración Unidad Ministro
 Subsecretaría de Apoyo Institucional
 Ministerio de Educación



Escuela Provincial Nº 22	1er piso baño mujeres: Reparar mochila en 3 boxs. 1 box cerrado
	Reflectores del sum no funcionan
Escuela Provincial Nº 24	Tapas asiento: 2 baño nenas y 2 nenes
	Verificar grifería
	Picaporte en gabinete psicopedagógico
	3 luces galponeras E-40
	Acomodar cables en informática (cablecanal)
	Filtración en sala de informática
	Puerta nicho de gas descuadrada
Escuela Provincial Nº 30	Soldar bisagra ingreso
	Reparación 2 calderas tubulares (corto y perdida)
	5 luces galponeras sum primer piso
	Aula 1 planta baja 6 velas
	1°ero B 2°do C 5 velas
	1° ero A y C 4 velas
	Luz quemada planta baja baño mujeres plafon circular
	Falta ceramicos en escalera
	Aula 7, 8 velas primer piso
	Cocina planta baja 1 tira led
	5°c 1 plafón 1 vela primer piso
	Aula 6 -1 plafón 6 velas primer piso
	Aula 4 - 1 plafón 8 velas primer piso
	Aula 5 - 7 velas primer piso
Sala multiproposito - 5 velas primer piso	
Comedor - 7 velas primer piso	
Escuela Provincial Nº 31	Colocar estanco doble en sala de máquinas
	Falta rejilla 3 a tm
	Limpieza patio
	Hacer tapa de acceso
	Baño varones: repara agujero en pered
	Realizar reparación y puerta accesible en cielorraso baño varones gim
Escuela Provincial Nº 34	El primer box nenas mochila no corta
	Parche en pasillo
	Cambiar placa en baño varones
	Baño nenas...cambiar tapon de desagüe de mochila.
	Baño nenes. Fijar canilla.
	Limpieza de patio, cortar pasto y sacar pino caido.
	Cortar pasto de patio frontal entre Esc 3 y Esc 34.
	Porteria: cielorraso y paredes, ceramicos
	Filtración en pared del sum (lindera con porteria esc.3)
	Colocar ceramicos en pared baño
	Faltan 3 tapas de asiento de baño
	Terminaciones en ventanas de secretaria
Pintura pasillos y SUM	

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
 Subsecretaría de Apoyo Institucional
 Ministerio de Educación

Escuela Provincial N° 39	Baño niños dos box clausurados, no se puede ingresar
	Baño niñas S.U.M 3°box no ingresa agua
	S.U.M ventana clausurada
	1°A dos plafones circulares quemados
	Aula 3 un plafón circular quemado
	Aula 5 un plafón cuadrado quemado
	Cable canal desprendido
Escuela Provincial N° 40	Reparar filtración sala de maestros
Escuela Provincial N° 41	Baño mujeres en sum: falta 1 tapa de asiento
	Plafón redondo en baño de varones sector de aula 1 quemado
	Placa cementicia en exterior
	Cambio de placas de durlock en sum
	Aula 7 un toma fuera de su lugar
	Una llave de luz sin funcionar
	Baño varones en sum: 2 box pierden por fuelle
Escuela Provincial N° 47	Planta baja entrada, fancoil pinchado
	Varios plafones se estan por caer en planta baja
	Canilla floja laboratorio de ciencia
	1 Caldera apagada, esta pinchada
	Pegar cerámicos donde se levantaron
Escuela Provincial N° 48	Aula 1 Faltan 3 velas
	Aula 5 2 velas
	Aula 6 3 velas
	Aula 4 2 velas
	Sala maestros 2
	Gabinete 1 plafón
	Baño hombre 1 tapa
	Baño mujeres 3 tapas
	Aula 2 - 9 velas
	Pasillo subsuelo faltan 3 plafones
	Restos de material en el piso
	7 reflectores quemados
Escuela Provincial N°49 (almanza)	Desagotar cámara, pintar exterior, corte de pasto, revisar caldera
	Baño de profesores no corta la canilla
	Planta baja baño varone: REPARAR 4 PLAFONES CIRCULARES LED
	Planta baja baño varone: CAMBIAR 3ERA CANILLA
	Baño de mujeres reparar 1 luz led circular
	Cocina planta baja falta fijar canilla
	1er piso baño damas: falta cambiar 2 led circulares
	1er piso baño damas: cambiar botón redondo de mochila 3er box
	1er piso baño damas: 1er box cambiar tapon de mochila
Baño varones: cambiar 3 led circular	

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
 Directora de Administración y OTRAS, Ministerio de Educación
 Subsecretaría de Apoyo Institucional
 Ministerio de Educación



Colegio Pcial. "José Martí"	Ingreso a los baños cambiar 6 cerámicos de piso grandes	
	Sector ingreso a los baños sin luz (son 7 plafones led redondo cortos)	
	Aula 4: cambiar 4 led cuadrados de 60x60	
	Aula 3: cambiar un panel led de los viejos 60x60	
	Aula 3: agregar tapa ciega a los botones de luz	
	3ro C: cambiar led 60x60	
	Aula 7: verificar un radiador (esta frío, el otro anda)	
	Aula 7: ver a la izquierda 4 plafones de tubo led que no enciende	
	Segundo piso:	
	En sector escalera cambiar 3 plafones de 60x60	
	Aula 12: cambiar teclas de luces completas	
	Aula 13: cambiar plafón luz led 60x60	
	Baño varones: faltan dos tapas de inodoros box 3 y 4	
	Baño mujeres: falta kit completo de mochila	
	Baño mujeres: cambiar 3 luces circulares	
	Aula 14: falta panel del techo	
	Aula 15: falta panel del techo	
	Cambiar tubo led corto frente a aula 15	
	Tercer piso:	
	Sala de profesores: falta panel de techo 60x60	
	Cuarto de entrevistas: cambiar 3 tubos de panel	
	Cambiar cerámico de piso a la izquierda frente a aula 3	
	Colegio Técnico Pcial. "Olga B. de Arko"	Aulas 12 1 era piso. Puerta aluminio raspa en el piso
		Pintar sector dibujado, no sale con trapo
		Limpiar desagüe baño accesible pb
Perdida en canilla		
Verificar calderas Caldaia y equipos aire		
Baño varones 2do piso pierde inodoro		
Pierde radiador		
Reparar 4 fuelles		
Encintar bien cable y poner tapa		
3er piso baño mujeres (fijar 2 canillas) 1 box cerrado.		
Centro Polivalente de Arte de Ushuaia Prof. Inés María Bustelo	Baño a la derecha	
	Colocar placas en sala de piano	
	Cambiar termocupla bifida	
	Reparar manguera, soterrar manguera	
Colegio. Pcial. "Dr. José María Sobral"	Pared del gimnasio rota	
	Cambiar 5 cerámicos... escalera que baja al gimnasio	
	Ingreso al gimnasio. Cambiar 10 azulejos.	
	Bacha picada del gimnasio antes de bajar mano derecha.	
	1er piso ala derecha...ventiluz caido 1°4°	
	Falta cerradura y picaporte 1er piso aula nueva ala derecha.	
	Falta panel de techo. 1er piso ala derecha. aula 1°3°	
	Picaporte aula 3°5°	

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/s firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

FOLIO 10
FOLIO 12

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

	Sin tapa de mochila y de inodoro Baños hombre box 6 planta alta y sin puerta 3 plafones para cambiar aula 4º1º y puerta si picaporte Verificar varios durlock rotos en pasillo planta baja Box mujeres sin puerta Baños mujeres box 3 y 4 sin puerta planta alta Pierde del flexible box 5 baño hombre planta baja
Colegio Pcial. "Los Andes"	Aula 8 planta alta falta picaporte y cerradura Baño planta alta sin botón de descarga Aula 7 planta alta falta picaporte y cerradura Un reflector de 200w quemado Planta baja: entrada al sum falta cerámicos Baños en pasillo planta baja: falta botón de descarga Sin grifería Aula 1 ,2 y 5 , falta un tubo en cada una Reparar fancoil del sum: Esta pinchado S.U.M: 5 galponerade 100w E-40 quemadas
Colegio Pcial. "Ernesto Sábato"	Baños de hombre ala vieja planta alta perdida en la unión Caldera ala nueva apagada Mantenimiento tubos radiantes Caldera ala vieja, falla sensor de temperatura Aula 1D filtración en cieloraso a la derecha
Col. Pcial. Kloketén	FALTA PICAPORTE EN 1ER BOX baño de mujeres planta baja FALTA REPARAR 1ER DESAGUE DE LAVAMANOS (FASTIX). BAÑO DISCAPACITADOS PLANTA BAJA: FALTA 6 CERÁMICOS BAÑO VARONES PLANTA BAJA: CAMBIAR PALANCA DE 1 MOCHILA. BAÑO VARONES PLANTA BAJA:CAMBIAR FLOTADOR DE 1 MOCHILA BAÑO VARONES PLANTA BAJA: FALTA COLOCAR 2 RETAZOS DE CERAMICOS EN BORDE DE LAVAMANOS. PATIO INTERNO TRASERO: RETIRAR BASURA. 1ER PATIO INTERNO: RETIRAR BASURA DE OBRA Y ESQUELETOS DE PUPITRES REPARAR CAJA TOMA CORRIENTE EXTERIOR. PLANTA ALTA BAÑO VARONES : FIJAR CANILLA. PLANTA ALTA BAÑO VARONES: FALTA CADENA DE MOCHILA REPARAR BISAGRAS DE TAPA DE TABLERO ELECTRICO PRINCIPAL
Colegio Prov. "Eva Duarte de Perón"	Cambiar placa en cielorraso de baño accesible (aulas) Ver trifásico exterior Limpiar filtros de fan coil Ver factibilidad de instalar una canilla en portería Reparar baño de maestros Mantenimiento tubos radiantes Cambiar inodoro y mochila en sala de profesores
Colegio Técnico Prov. "Antonio Martín Marte"	Colocar piso cerámico en 2 aulas

FOLIO
 13
 FOLIO
 13

Experimentales Los Calafates	Realizar 3 estanterías
Experimental Las Gaviotas	Limpieza de radiadores y fancoil. Verificación caldera
	Filtración de agua en techo
Escuela Especial Nº 1 - Kayú Chénèn	-
Escuela de Educación Integral - E. d.E.I. (ESC Nº13)	-
Las Bandurrias	-
CAAD	Reparar filtración de agua en cuebierta
	3 Calefactores con perdida de gas
IPES	1 Caldera apagada 1er piso
IPI	CANALETA limpiar y colocarle fastix a la unión chapa con policarbonato

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
 Directora de Administración Unidad Ministro
 Subsecretaría de Apoyo Institucional
 Ministerio de Educación



INSTITUCION	TRABAJOS PENDIENTES
Jardin N° 1: La Calesita Encantada	TERMINACION DE OBRAS CONTRATADA POR EL MINISTERIO DE OBRAS Y SERVICIOS, NO CORRESPONDE A LA LEY DE FORTALECIMIENTO
Jardin N° 3: Mundo de Colores	COLOCACION DE ILUMINARIAS INTERIOR EN PASILLOS Y SALAS, ARREGLO INTEGRAL EN BAÑOS DE LAS SALAS. SE DEBE REALIZAR LA LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE LOS
Jardin N° 4: Arco Iris	ARREGLO INTEGRAL DE LA SALA DE MAQUINAS O PUESTA A PUNTO DE LOS MISMOS. CONSTRUCCION DE RAMPAS DE ACCESIBILIDAD. CONSTRUCCION DE LA PLATEA Y ESPACIO
Jardin N° 5: Tol Olejce	PINTURA INTERIOR DE LAS SALAS Y PASILLOS, ARREGLO DE LOS BAÑOS. MEJORAR
Jardin N° 6: Crecer Jugando	PINTURA INTERIOR EN LAS SALAS Y PASILLOS, ARREGLO DE LOS JUEGOS EXTERIORES
Jardin N° 9: Tutú Marambá	PINTURA INTERIOR DE LAS SALAS Y PASILLOS, CONTROL DE LAS CAMARAS DE
Jardin N° 11: Chepa'chen	REPARAR LOS JUEGOS DE LA PLAZA, PINTURA INTERIOR DE LAS SALAS Y PASILLOS. CONTROL Y LIMPIEZA DE LOS DUCTOS Y EQUIPOS DE AIRE. TERMINAR LA OBRA DE
Jardin N° 12: Payasos, Globos y Chupetines	PINTAR LAS REJAS DE COLOR NEGRO, PUESTA EN VALOR DE LA SALA DE MAQUINAS, PINTAR LA FACHADA.
Jardin N° 13: Zhioshi	CAMBIO DE PISOS, SECTOR PARA DEPOSITO, ARREGLO DEL TECHO POR FILTRACIONES,
Jardin N° 16: Raices y Alas	PINTAR LA GALERIA CON NOGAL, ARREGLAR JUEGOS DE LA PLAZA, LIMPIEZA DE
Jardin N° 17: Olas de Fantasia	PINTADO DE REJAS Y DE LOS JUEGOS DE LAS PLAZAS, PINTADO DE LA FACHADA Y TECHO, PINTAR INTERIOR EN LAS SALAS Y PASILLOS, LIMPIEZA DE EQUIPOS DE AIRE Y
Jardin N° 21: Dias de Magia	GRIFERIAS CON PERDIDAS, CAMBIO DE CALDERA Y TERMOTANQUE, MODIFICACION DE
Jardin N° 22: Huellitas Fueguinas	ILUMINACION EXTERIOR, MEJORAR SISTEMAS DE CALEFACCION AGREGAR RADIADORES.
Jardin N° 23: Tol Klévele	SECTOR PARA GABINETE, CAMBIO DE PICAPORTES EN SEIS AULAS, CAMARAS DE
Jardin N° 25: Brisitas del Sur	ILUMINACION EXTERIOR, PINTURA INTERIOR EN LAS SALAS, PASILLOS Y DIRECCION.
Jardin N° 26: Tejiendo Sueños	FANCOIL CON PERDIDAS, SIN CALEFACCION EN LA BIBLIOTECA.
Jardin N° 27: Botecito de Papel	OLOR A CLOACAS EN LAS SALAS CONTROLAR, ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR.
Jardin N° 5 (Anexo)	CONTROL DE LOS SISTEMAS DE CALEFACCION Y EDIFICIO POR LA GARANTIA DE OBRA.
E N° 2: Dr. Benjamin Zorrilla	VER SISTEMA DE ILUMINACION EXTERIOR, PINTADO DE LA COCINA Y COMEDOR, BAÑO
E N° 4: Remolcador A.R.A. Guaraní	CERRAR LUDOTECA (PARA HACER OFICINAS), EN LA COCINA SE ENCUENTRA ROTA UNA LLAVE DE AGUA Y RADIADOR PINCHADO / ILUMINACION EXT, VERIFICAR GARANTIA POR EL SISTEMA DE CALEFACCION EN OBRA, ARREGLO DE LAS REJAS EN EL INGRESO.
E N° 5: Jose Maria Beauvoir	REALIZAR LA COLOCACION DE PISOS NUEVOS Y LA REALIZACION DE BAÑOS ACORDES, CONTROLAR SISTEMA DE CALEFACCION POR LA GARANTIA DE LA OBRA, ILUMINACION
E N° 7: El Abrazo ded Maipú	PUESTA EN VALOR DE LOS SISTEMAS DE CALEFACCION, BAÑOS DEL GIMNASIO YA SE ENCUENTRAN DETERIORADOS, PROVISION Y COLOCACION DE EQUIPOS DE
E N° 8: General Jose de San Martín	REPARAR LOS JUEGOS DE LA PLAZA, REPARAR REJAS DEL INGRESO, TECHO CON FILTRACIONES EN EL SUM / SOLDAR EL HIDRO, Y PONER EN VALOR SALA DE MAQUINAS
E N° 10: General Manuel Belgrano	TERMOTANQUE PINCHADO EN LA COCINA, MEJORAR RAMPAS DE ACCESO, MODIFICACIONES INTERNAS EN DIRECCION Y SECRETARIA, LIMPIEZA DE LOS EQUIPOS
E N° 11: Pioneros Fueguinos	ARREGLO DEL VIVERO, MANTENIMIENTO DE LOS CALEFACTORES Y EQUIPOS DE AIRE,
E N° 14: Solidaridad Latinoamericana	VER LOS BAÑOS QUE TIENEN UNA PERDIDA DE AGUA CONSTANTE EN PLANTA BAJA Y EN PLANTA ALTA (OBRA DE BAÑOS NUEVOS), BAÑO DE DISCAPACITADOS, CAMBIO DE PISOS, CAMBIO DE ABERTURAS, CONSTRUCCION DE RAMPAS PARA EL ACCESO,
E N° 17: Comisario Ramon Luiso Cortes	PUESTA EN VALOR DEL VIVERO, MANTENIMIENTO DE LOS CALEFACTORES Y EQUIPOS DE AIRE, MANTENIMIENTO DE ABERTURAS DE ALUMINIO, PINTURA EXTERIOR Y ARREGLO
E N° 19: Primera Legislatura	VER PERDIDA DE AGUA EN LA CISTERNA, ARREGLO DE BAÑOS, ARREGLO DE REJAS AL ACCESO, ARREGLO DE LOS JUEGOS EXTERIORES, PUESTA EN VALOR DE LA SALA DE
E N° 20: Angela Loij	PINTADO DE LAS REJAS, LIMPIEZA DE LOS CALEFACTORES, IUMINACION INTERIOR Y
E N° 21: Provincias Unidas	CAMBIO DE EQUIPO DE AIRE DEL SUM, CAMBIO DE ABERTURAS, PUESTA EN VALOR DE
E N° 23: Org. De los Estados	RAMPAS PARA ACCESOS (CON PUERTAS DE EMERGENCIAS) / ILUMINACION EXTERIOR,
E N° 32: IYU.	LIMPIEZA DE LOS DUCTOS Y EQUIPOS DE CALEFACCION
E N° 35: Jorge Luis Borges	PINTADO DE PAREDES EXTERIORES DONDE HAY GRAFITIS Y DEL SUM, LIMPIEZA DE
E N° 42: Gabriela Mistral	PINTAR INTERIOR, VERIFICAR GARANTIA DE OBRA (UCP)
E N° 44: Valientes de Malvinas	PINTAR INTERIOR / PINTADO DE LA COCINA, DEMARCACION DEL PISO DEL SUM E ILUMINACION INTERIOR. PUESTA EN VALOR DE LAS ABERTURAS. ILUMINACION
E N° 45: Congreso de Tucumán	PINTADO DEL TECHO DE LA COCINA, ILUMINACION INTERIOR Y EXTERIOR, CONSTRUCCION DE VEREDA DE ACCESO, ACOMETIDA DE AGUA NUEVA, CANASTOS DE
E N° 46: Gral. Martin Miguel de Escuela Provincial - Los	PINTAR INTERIOR, VERIFICAR GARANTIA DE OBRA (UCP), VER EQUIPOS DE AIRE DEL SUM ILUMINACION EXTERIOR
Col. Pcial. Antartida Argentina	LLAVE DE GAS DEL ANAFE PIERDE SE DEBERIA HACER MANTENIMIENTO, PROBLEMAS
Col. Pcial. Comandante Luis Piedrabuena	PURGADO DE RADIADORES / LIMPIEZA DE LA CALDERA / LIMPIEZA DE EQUIPOS DE AIRE. VER MODIFICACIONES PARA EL ESPACIO DE LA COCINA. ILUMINACION EXTERIOR
Col. Pcial. Soberania Nacional	VER EQUIPOS DE AIRE DE CALEFACCION / PROYECTOS / TIRAJES
Col. Pcial. Alicia Moreau de Justo	PONER LAS REJAS EN LAS OFICINAS SEGÚN PEDIDO. PUESTA EN VALOR LA SALA DE MAQUINAS. PONER CALEFACCION A LA SECRETARIA Y ADMINISTRACION. CONTROLAR
Col. Pcial. De Educacion Tecnologica Rio Grande	CAMBIO DE EQUIPOS DE AIRE, LIMPOEZA DE DUCTOS Y EQUIPOS DE CALEFACCION DE AIRE. SE ENCUENTRA EN OBRA. CONSTRUCCION DE ASCENSOR Y PUESTA EN VALOR DEL
Centro Poli. de Arte R.G. Prof. Diana Cotorruelo	ILUMINACION EXTERIOR. VER SISTEMAS DE CALEFACCION QUE COMPARTE CON EL JARDIN 5. ARREGLOS DE LOS PISOS DE PARQUET. VER OBRA DE BAÑOS NUEVOS.
Col. Pcial. Haspen "Prof. Luis Adam Felippa"	REPARAR DURLOCK EN EL GIMNASIO / TRABAJO DE HERRERIA LAS REJAS SE ENCUENTRAN EN LA SALA DE MAQUINAS / ESCALERA DE EMERGENCIA A REPARAR

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o digitalmente


F. Domínguez
Unidad Ministro
Secretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

GOB. Provincia del Fuego, Antártida e Islas
 FOLIO 13
 GOB. Provincia del Fuego, Antártida e Islas
 FOLIO 15
 No. 15
 Secretaría Legal

Col. Pcial. Dr. Ernesto Guevara	VER GRIFERIAS, CALEFACCION EN LOS SECTORES MAS ALEJADOS A LA SALA DE MAQUINAS. CONSTRUCCION DE OFICINAS CENTRO DE ESTUDIANTES. COLOCACION DE
Col. Pcial. Dr. Esteban Laureano Maradona	ILUMINACION INTERIOR, PISOS NUEVOS, CAMBIO DE COLECTORES.
Col. Pcial. Dr. René Favalaro	PURGAR SISTEMAS DE CALEFACCION / CAMBIO DE RADIADORES / SISTEMA DE DESCARGA EN LA MOCHILAS DE AMBOS BAÑOS. PUESTA EN VALOR DE LAS SALAS DE
Col. Pcial. Padre Jose Zink	MANTENIMIENTO DE LAS LLAVES DE GAS DEL SUM Y VER FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS DE CALEFACCION, VERIFICAR GARANTIA DE OBRA, VER VENTANAS DE PVC QUE
Col. Pcial. Ramon Alberto Trejo	ARREGLAR DOS CALDERAS QUE NO FUNCIONAN, VERIFICAR FILTRACIONES GARANTIA DE
Centro Politecnico Superior Malvinas Argentinas	VER CALDERA NUEVA QUE NO ENCIENDE
Escuela Especial Nº 2 - Casita de	COLOCAR LAS REJAS QUE YA ESTAN CORTADAS SON 120 VARILLAS EN REJAS
Escuela Especial Nº 3 - Integración Plena	PINTADO INTERIOR
Escuela Especial Nº 4	
Centro Terapéutico Educativo	TIRAJES SUELTOS EN TECHO DE LOS EQUIPOS DE AIRE / LIMPIEZA DE LOS CALORAMAS /
Centro de Actividades Alternativas para Discapacitados	VER CALDERAS QUE TIENE PARCHES CON GOMA EN LAS FUSIONES
Escuela de Educación Integral "Sin Fronteras"- Sede - Río	REGULARIZAR GAS / ILUMINACION EXT
Centro de Educacion Permanente para Jovenes y	
Centro de Estimulacion	REGULAR TEMPERATURA / VERIFICAR Y ARREGLAR ABERTURADE VENTANAS
Escuela Provincial Nº 2 para Adolescentes y Adultos - Wikam	LIMPIEZA DE LOS DUCTOS Y EQUIPOS DE CALEFACCION
Gimnasio Esc. 2	ILUMINACION INTERIOR (COORDINACION DE DEPORTES CUENTA CONTARA CON LOS
Gimnasio Esc. 14	
Gimnasio Polivalente	EQUIPOS DE AIRE PARA LIMPIAR / VER PISO
Gimnasio CPET	
IPES	REPARAR TIRAJES DE LOS EQUIPOS DE CALEFACCION / REFLECTOR EXTERIOR
CENT 35	SE ENCUENTRA EN OBRA POR LA REFACCION INTERNA

- * TODAS LAS PRIMARIAS CUENTAN CON COMEDOR, POR LO TANTO SE DEBE REALIZAR MANTENIMIENTO EN LOS
- * LIMPIEZA DE CANALETAS EN TODAS LAS INSTITUCIONES.
- * EN TODOS LO EDIFICIOS DONDE SE REALIZARON OBRAS SE DEBERÁN TENER EN CUENTA LAS GARANTÍAS DE OBRAS.


Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente


 Ivancy E. Dominguez
 rector de Administración Unidad Ministro
 Subsecretaría de Apoyo Institucional
 Ministerio de Educación

Firmado Electrónicamente por
MAESTRO MAYOR DE OBRA TURDO MAURICIO
GUILLERMO
Gobierno de Tierra del Fuego
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
EDUCATIVA
15/03/2024 13:10



Esta información se
encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente



Nancy E. Dominguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



Esta información se
encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente


Nancy E. Domínguez
Secretaría de Administración Unidad Ministerial
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

Río Grande, 29 febrero 2024
Letra: D.P.P.Z.N.yC
Nota: N° 056 /2024

Al Sr. Ministro de Educación
Lic. Pablo López Silva
S / D

Por medio de la presente me dirijo a usted a fin de informar los avances de las obras y servicios, programados a través de la Ley N°1431 "Programa de Fortalecimiento de Infraestructura Educativa" durante el transcurso del cuarto trimestre, que abarca el período desde el 23 de septiembre del 2023 hasta el 22 de diciembre del 2023.

E-79023/2023 CAMBIO DE ABERTURAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LA PROVINCIA DE TIERRA DEL FUEGO A.I.A.S

Esta obra tiene como objetivo poner en valor las ventanas, puertas de emergencia y puertas de ingreso e internas, solucionando con esto las filtraciones de agua, ingreso de viento y mejorar la estética del cada edificio.

- Los edificios afectados por esta obra son: En Río Grande 18, en Tolhuin 3 y en Ushuaia 24.-
- Al tratarse de una obra por renglones, se firmaron los siguientes contratos:
 - Resolución 116/23: \$ 72.156.990,20
 - Resolución 117/23: \$ 6.705.713,76
 - Resolución 121/23: \$ 43.723.307,06
 - Resolución 122/23: \$ 61.301.217,55
 - Resolución 120/23: \$ 93.43.209,00
 - Resolución 118/23: \$ 49.998.292,19
 - Resolución 119/23: \$ 50.944.701,13
- Tramitado según Expte.: E – 79023 - 2023
- Plazo de ejecución SETENTA Y CINCO (75) DIAS CORRIDOS.
- ESTADO DE OBRA: se encuentra en proceso.

Resolución 116/23:

- ✓ RENGLO 8- ESCUELA PROVINCIAL N° 23: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 45,20 %.
- ✓ RENGLO 12- COLEGIO PROVINCIAL SOBERANÍA NACIONAL: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 29,14 %.
- ✓ RENGLO 17- GIMNASIO ESCUELA N° 21: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 64,24 %.

Cuenta con una extensión de plazo, y al 22 de septiembre de 2023 con una suspensión de obra.

Resolución 117/23:

- ✓ RENGLO 7- ESCUELA PROVINCIAL N° 8: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 100 %.

Resolución 121/23:

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA


MINISTERIO DE EDUCACIÓN



Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

Lancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

- ✓ RENGLON 1 - JARDIN DE INFANTES N° 1: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 1,81 %.-
 - ✓ RENGLON 2- JARDIN DE INFANTES N° 6: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 0,73 %.-
 - ✓ RENGLON 3- JARDIN DE INFANTES N° 9: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 49,16 %.-
 - ✓ RENGLON 6- JARDIN DE INFANTES N° 17: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 34,25 %.-
 - ✓ RENGLON 11- COLEGIO PROVINCIAL ANTARTIDA ARGENTINA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 0,90 %.-
 - ✓ RENGLON 13- CENTRO TERAPEUTICO EDUCATIVO: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 14,76 %.-
 - ✓ RENGLON 14- CENTRO DE ACTIVIDADES ALTERNATIVAS PARA DISCAPACITADOS: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 1,76%.-
 - ✓ RENGLON 15- CENTRO DE EDUCACION PERMANENTE PARA JOVENES Y ADULTOS CON DISCAPACIDAD: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 14,96 %.-
 - ✓ RENGLON 16- GIMNASIO ESCUELA N° 2: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 5,82 %.-
 - ✓ RENGLON 18- GIMNASIO CPET: Al 23 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 75%.-
- Cuenta una extensión de plazo, y al 22 de diciembre de 2023 con una suspensión de obra

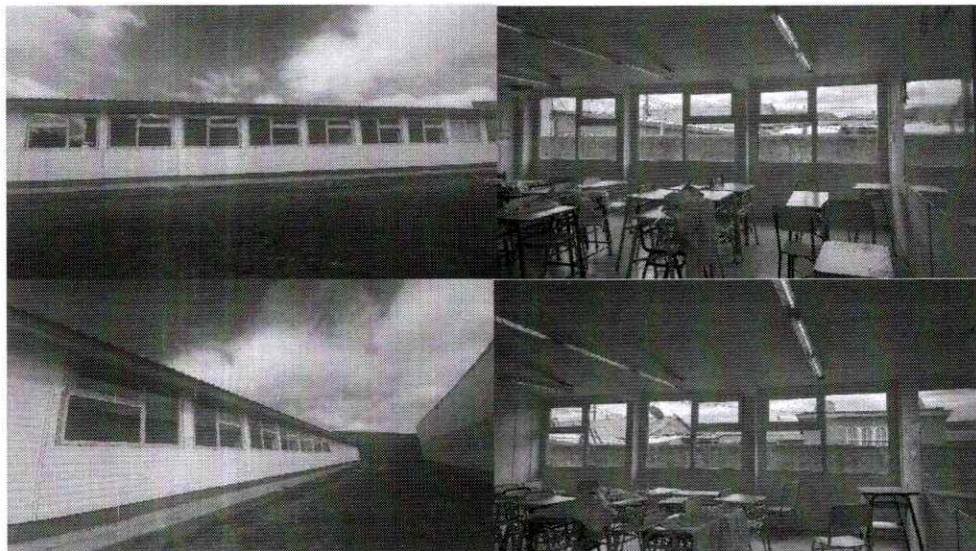

Resolución 122/23:

- ✓ RENGLON 4- JARDIN DE INFANTES N° 11: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 92,74%.-
 - ✓ RENGLON 5- JARDIN DE INFANTES N° 16: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 64,54 %.-
 - ✓ RENGLON 9- ESCUELA PROVINCIAL N° 32: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 68,73 %.-
 - ✓ RENGLON 10- ESCUELA PROVINCIAL N° 35: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 46,30 %.-
- Cuenta una extensión de plazo de obra.

Resolución 119/23:

- ✓ RENGLON 25- JARDIN DE INFANTES N° 18 - USHUAIA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 100 %.-
- ✓ RENGLON 28- ESCUELA N° 3/34 - USHUAIA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 100 %
- ✓ RENGLON 29- ESCUELA N° 9 - USHUAIA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 100 %



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



- ✓ RENGLON 40- COLEGIO PROVINCIAL ERNESTO SABATO - USHUAIA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 100 %

Resolución 142/23:

- ✓ RENGLON 19- JARDIN N°13 - TOLHUIN: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 0 %
- ✓ RENGLON 20- ESCUELA ESPECIAL N°4 - TOLHUIN: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 0 %
- ✓ RENGLON 21- CENTRO DE ARTES Y OFICIOS - TOLHUIN: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 0 %
- ✓ RENGLON 23- JARDIN DE INFANTES N° 8 - USHUAIA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 90 %
- ✓ RENGLON 24- JARDIN DE INFANTES N° 10 - USHUAIA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 0 %
- ✓ Renglón N° 27: JARDÍN MATERNAL VEO-VEO- USHUAIA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 90 %
- ✓ RENGLON 31- ESCUELA N° 15 - USHUAIA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 30 %
- ✓ RENGLON 32- ESCUELA N° 22 - USHUAIA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 0 %
- ✓ RENGLON 33- ESCUELA N° 30 - USHUAIA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 0 %
- ✓ RENGLON 36- ESCUELA N° 41 - USHUAIA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 0 %
- ✓ RENGLON 38- COLEGIO PROVINCIAL EVA DUARTE DE PERON - USHUAIA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 0 %
- ✓ RENGLON 39- COLEGIO PROVINCIAL POLIVALENTE DE ARTE - USHUAIA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 0 %
- ✓ RENGLON 42- COLEGIO PROVINCIAL OBA - USHUAIA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 50 %
- ✓ RENGLON 43- GIMNASIO 640 - USHUAIA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 0 %
- ✓ RENGLON 44- GIMNASIO POLIVALENTE DE ARTES - USHUAIA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 0 %

Resolución 212/23:


- ✓ RENGLON 22- JARDIN DE INFANTES N° 2 - USHUAIA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 95 %
- ✓ RENGLON 26- JARDIN DE INFANTES N° 19 - USHUAIA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 95 %
- ✓ RENGLON 30- ESCUELA N° 13 - USHUAIA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 100 %
- ✓ RENGLON 34- ESCUELA N° 31 - USHUAIA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 95 %
- ✓ RENGLON 35- ESCUELA N° 39 - USHUAIA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 95 %
- ✓ RENGLON 37- ESCUELA N° 47 - USHUAIA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 0 %
- ✓ RENGLON 41- COLEGIO PROVINCIAL KLOKETEN - USHUAIA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 95 %
- ✓ RENGLON 45- ESCUELA PROVINCIAL N° 24 - USHUAIA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 50 %

E- 78772/2022 CAMBIO DE ABERTURAS EN ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS EN LA CIUDAD DE RIO GRANDE Y TOLHUIN

Esta obra tiene como objetivo poner en valor las ventanas, puertas de emergencia y puertas de ingreso e internas, solucionando con esto las filtraciones de agua, ingreso de viento y mejorar la estética de cada edificio.

"Las Islas Malvinas, Georgias del Sur, Sándwich del Sur y los espacios marítimos e insulares correspondientes son argentinos"

Esta información encuentra resguardada en formato digital y firmada digitalmente.



Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministerial
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



- Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 5, en Tolhuin 1.
- Al tratarse de una obra por renglones, se firmaron los siguientes contratos:
- ✓ Resolución 402 - Renglón 1: \$ 27.837.140,01
- ✓ Resolución 403 - Renglón 2: \$ 49.248.700,26
- ✓ Resolución 404 - Renglón 3 y 4: \$ 48.693.893,20
- ✓ Resolución 405 - Renglón 5: \$ 11.752.691,14
- ✓ Resolución 406 - Renglón 6: \$ 18.069.398,20

Resolución 402/23:

RENGLON 1- ESCUELA PROVINCIAL N° 10: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 75.60%.-

Cuenta una extensión de plazo de obra.

Resolución 403/23:

RENGLON 2- ESCUELA PROVINCIAL N° 19: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 43,80%

Cuenta una extensión de plazo de obra.

Resolución 404/23:

RENGLON 3- ESCUELA PROVINCIAL N° 21: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 12,87 %.

RENGLON 4-ESCUELA ESPECIAL N°2- "CASITA DE LUZ ": Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 1,57 %.

Resolución 405/23:

RENGLON 5-ESCUELA ESPECIAL N°3- "INTEGRACION PLENA": Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 69.75 %.

Cuenta una extensión de plazo, y al 22 de diciembre de 2023 con una suspensión de obra

Resolución 406/23:

RENGLON 6- ESCUELA PROVINCIAL N° 5- "JOSE MARIA BEAUVOIR": Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance de 100%.-

E-80941/202 - REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N° 13 - ALMIRANTE GUILLERMO BROWN

Esta obra tiene como objetivo intervenir en la demolición y refacción de los techos ubicados en aulas y SUM, reeducación de las baterías de baños de planta baja y planta alta, demolición de tabiques existentes, retiro de artefactos y el nuevo armado de los mismos, con artefactos, revestimientos y carpinterías nuevas. Se prevé también la intervención en la instalación eléctrica general, la instalación de nuevas luminarias y tomacorrientes y de una nueva central de alarma, detectores de humo, de gas, térmicos y de movimientos.

Con todas estas intervenciones se genera un espacio apto y seguro para un buen funcionamiento del edificio. –

- Los edificios afectados por esta obra son: En Ushuaia 1(Uno).
- Monto del contrato: \$225.052.776,11.
- Inicio de obra el día 26/01/2023 con un plazo de ejecución de 60 (SESENTA) días corridos.
- Plazo de garantía de CIENTO OCHENTA (180) días corridos.
- ESTADO DE OBRA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado del 98,5%, sólo resta la colocación de espejo en sanitarios de alumnos, en planta alta y baja, cambio de 4 chapas en revestimiento exterior nuevo observado por la inspección.

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

N. María E. Damascó
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación




Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

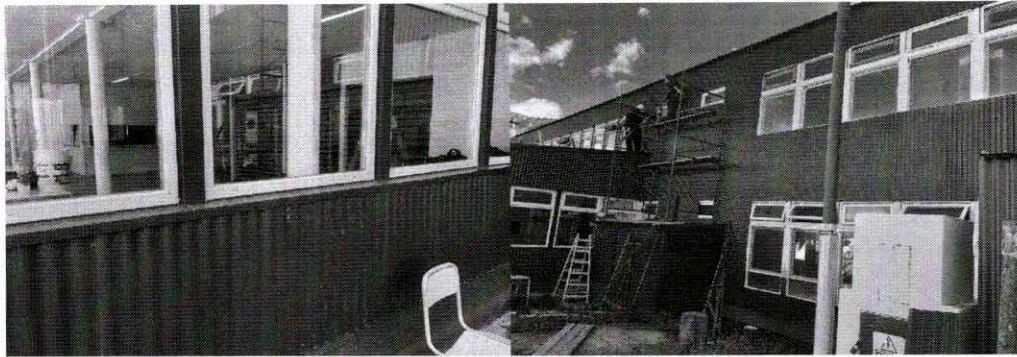

E-80349/2022 - "REFACCION INTEGRAL - SALA DE MAQUINAS E INSTALACION NUEVA DE GAS - ESCUELA Nº 4 / 43 - RIO GRANDE"

Esta obra tiene como objetivo intervenir y reacondicionar la sala de máquinas en su totalidad, y con esto lograr un óptimo funcionamiento en los sistemas de provisión de gas, agua fría-caliente y de calefacción.

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Unidad Ejecutiva de Administración
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

- Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 1
- Monto del contrato: \$ 35.458.304,71
- Tramitado según Expte.: E – 80349/22
- Inicio de obra 13 /02/2023 con un plazo de ejecución de CUARENTA Y CINCO (45) días.
- Plazo de garantía de CIENTO OCHENTA (180) días de corridos.
- ESTADO DE OBRA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 75,15%.

Cuenta una extensión de plazo, y al 22 de diciembre de 2023 con una suspensión de obra.

E-81183/2022 - REFACCION INTEGRAL - SALA DE MÁQUINAS E INSTALACION NUEVA DE GAS Y CALEFACCION - ESCUELA Nº 5 – TOLHUIN.

Esta obra tiene como objetivo intervenir y reacondicionar la sala de máquinas en su totalidad y realizar el cambio completo del Sistema de calefacción, y con esto lograr un óptimo funcionamiento en los sistemas de provisión de gas, agua fría-caliente y de calefacción y se mejora la seguridad de la institución.

- Los edificios afectados por esta obra son: En Tolhuin 1.
- Monto del contrato: \$ 47.619.206,09
- Tramitado según Expte.: E – 81183/22
- Inicio de obra 07/02/2023 con un plazo de ejecución de NOVENTA (90) días corridos.
- Plazo de garantía de CIENTO OCHENTA (180) días corridos.
- ESTADO DE OBRA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance del 30%.

Cuenta una extensión de plazo de obra

E-80297/2022 - "IMPERMEABILIZACIÓN DE TECHOS EN EDIFICIOS ESCOLARES DE LA CIUDAD DE RIO GRANDE Y TOLHUIN"



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



Esta obra tiene como objetivo la impermeabilización y puesta en valor de las cubiertas de techos de establecimientos educativos seleccionados. Logrando con ello la impermeabilización de las cubiertas y solucionando problemas históricos de esos edificios.

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez

Dirección de Apoyos Unidad Ministerial
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

- Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 12, en Tolhuin 2.
 - Monto del contrato: \$ 231.832.194,37
 - Tramitado según Expte.: E – 80297/22
 - Inicio de obra 03/02/2023 con un plazo de ejecución de SESENTA Y CINCO (75) días.
 - Plazo de garantía de TRESCIENTOS SESENTA Y CINCO (365) días corridos.
 - ESTADO DE OBRA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 84,41 %.
- Cuenta una extensión de plazo, y una suspensión de obra. Se reinició la obra el día 11-12-2023.

E-84253/2022 - "OBRA INTEGRAL BAÑOS COLEGIO PROVINCIAL COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA – RIO GRANDE"

Esta obra tiene como objetivo planteamos realizar el reacondicionamiento de los baños y el cambio de aberturas exterior en el establecimiento, para que cumplan con las reglas del buen arte.

- Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 1
- Monto de contrato: \$ 64.306.125,31
- Tramitado según Expte.: 84253/22
- Inicio de obra 02/02/2023 con un plazo de ejecución de CUARENTA Y CINCO (45) días.
- Plazo de garantía de CIENTO OCHENTA (180) días corridos.
- ESTADO DE OBRA: Al 22 de diciembre de 2023 se encuentra finalizada al 100%.

E- 85719/2022 - "REMODELACION DE BAÑOS Y CAMBIOS DE CARPINTERÍAS EN C.P.E.T Ingeniero Fabio Carlos Reiss. RIO GRANDE". -

Esta obra tiene como objetivo realizar el mejoramiento y remodelación de los baños, y el cambio de carpinterías exteriores en el establecimiento, para que cumplan con las reglas del buen arte.

- Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 1.
 - Monto del contrato: \$ 69.123.584,07
 - Tramitado según Expte.: E – 85719/22
 - Inicio de obra 01/03/2023 con un plazo de ejecución de CUARENTA Y CINCO (45) días.
 - Plazo de garantía de CIENTO OCHENTA (180) días corridos.
 - ESTADO DE OBRA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 37 %.
- Cuenta una extensión de plazo, una suspensión de obra

E-85666/2022 - "CAMBIO DE ABERTURAS Y BAÑOS EN COLEGIO PROVINCIAL HASPEN –PROF. LUIS ADAM FELIPPA"

Esta obra tiene como objetivo realizar el mejoramiento y remodelación de los baños, y el cambio de carpinterías exterior e interior del establecimiento, para que cumplan con las reglas del buen arte.

- Los edificios afectados por esta obra son: En Rio Grande 1.
- Monto del contrato: \$ 45.782.015,17
- Nuevo monto de contrato:\$59.454.890,07
- Tramitado según Expte.: E – 85666/22



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez

Directora de Administración y Gestión
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

E-85724/2022 - REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N° 22 "BAHÍA GOLONDRINA" y JARDÍN N°10 "CHOWEN" – USHUAIA.

Esta obra tiene como objetivo intervenir en la demolición y readecuación de las baterías de baños de planta baja y planta alta, el armado de salas de máquinas (1 por cada establecimiento), la intervención en la instalación eléctrica general, la instalación de nueva luminarias y tomacorrientes, intervención en la instalación de gas. También se realizará la provisión y mano de obra para la pintura interior completa, de las barandas y escaleras exteriores. Con todas estas intervenciones se genera un espacio apto y seguro para un buen funcionamiento del edificio.

- Inicio de obra 9/02/2023 con un plazo de ejecución de CUARENTA Y CINCO (45) días.
- Ampliación del plazo CIENTO VEINTISIETE (127) días.-Res. M.E.C.C. y T. N° 4299/2023
- Plazo de garantía de CIENTO OCHENTA (180) días corridos.
- ESTADO DE OBRA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 90%.
Cuenta una extensión de plazo, una suspensión de obra

E-87527/2022 - REFACCIONES INTEGRAL COLEGIO PROVINCIAL DR. JOSE MARIA SOBRAL"- USHUAIA.

Esta obra tiene como objetivo intervenir en la refacción de las salas de producción de cocinas, la intervención en la instalación eléctrica general, la instalación de nueva luminarias y tomacorrientes. Con todas estas intervenciones se genera un espacio apto y seguro para un buen funcionamiento del edificio.

- Los edificios afectados por esta obra son: En Ushuaia 1
- Monto del contrato: \$47.787.514,93.
- Tramitado según Expte.: E -87527/2022.
- Inicio de obra 7/02/2023 con un plazo de ejecución de CUARENTA Y CINCO (45) días corridos.
- Plazo de garantía de CIENTO OCHENTA (180) días corridos.
- ESTADO DE OBRA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado del 80%. quedando pendiente la documentación ante camuzzi

E-86023/2022 - REFACCIÓN INTEGRAL TALLER COLEGIO TÉCNICO PROV. O.B.A. – USHUAIA.

Esta obra tiene como objetivo intervenir en el acondicionamiento del piso del área de taller, readecuación de las baterías de baños y el sector de portería, en la instalación eléctrica general y la instalación de nuevas luminarias. Se realizará la construcción de un cielorraso suspendido de PVC en ambos sectores. Con todas estas intervenciones se genera un espacio apto y seguro para un buen funcionamiento del edificio.

- Los edificios afectados por esta obra son: En Ushuaia 1
- Monto del contrato: \$26.080.732,23.



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

- Tramitado según Expte.: E - 86053/2022.
- Plazo de ejecución de TREINTA (30) días corridos.
- Plazo de garantía de CIENTO OCHENTA (180) días corridos.
- ESTADO DE OBRA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado del 98%.

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaria de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

E-7283/2022 - REFACCIONES EN ESCUELA PROVINCIAL N°15 CENTENARIO DE USHUAIA - 1ra. ETAPA

Esta obra tiene como objetivo intervenir en la realización de un Sistema de calefacción nuevos a través de Calderas por agua caliente y equipos Fan Coil, y reacondicionar y ampliar la sala de máquinas en su totalidad, y con esto lograr un óptimo funcionamiento en los sistemas de provisión de gas y de calefacción. Con esta mejora se genera una mejor prestación del servicio de calefacción, con un sistema más moderno y seguro.

- Los edificios afectados por esta obra son: En Ushuaia 1
- Monto del contrato: \$78.062.325,18.
- Tramitado según Expte.: E - 7283/2022.
- Plazo de ejecución de TREINTA (30) días corridos.
- Plazo de garantía de CIENTO OCHENTA (180) días corridos.
- ESTADO DE OBRA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado del 70%.

E-36657/2023 - "REFACCIONES EN JARDÍN DE INFANTES N° 7 "PIEDRA LIBRE" - USHUAIA".

Esta obra tiene como objetivo restituir la capacidad estructural del suelo y de las cimentaciones del edificio el cual fue comprometido estructuralmente a través del paso de los años como consecuencia de los asentamientos diferenciales que sufrió la estructura, producto de la modificación de la capacidad portante del suelo, generando que el sector de contrapiso de hormigón armado delantero cediera unos 5 cm aproximadamente, provocando roturas en pisos, mamposterías y desprendimiento de ciellorrasos, entre otros.

- Los edificios afectados por esta obra son: En Ushuaia 1
- Monto del contrato: \$110.056.444,20
- Tramitado según expediente:36657/2023
- Plazo de ejecución de CIENTO VEINTE (120) días corrido
- plazo de garantía de CIENTO OCHENTA (180) días corridos.
- ESTADO DE OBRA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado del 73,26 %.



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



Esta información se encuentra resguardada en formato digital firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación



E-35180/2023 - "REFACCIÓN INTEGRAL CENTRO POLIVALENTE DE ARTE DE USHUAIA PROF. INÉS MARÍA BUSTELO" - USHUAIA.

Esta obra tiene como objetivo lograr canalizar los chorrillos del patio trasero del establecimiento. También se volverá a habilitar la escalera principal del gimnasio de dicho establecimiento. la correcta función de todos los espacios del establecimiento educativo, problemáticas que ponen en riesgo a los alumnos, profesores y demás personas que operan dentro del establecimiento, y que deben ser solucionada de forma inmediata.

- Los edificios afectados por esta obra son: En Ushuaia 1
- Monto del contrato: \$26.628.964,27
- Tramitado según expediente: 35180/2023
- Plazo de ejecución de TREINTA (30) días corridos
- plazo de garantía de CIENTO OCHENTA (180) días corridos
- ESTADO DE OBRA: Al 22 de diciembre de 2023 tiene un avance aproximado de 85,63 %.



Gobierno de
Tierra del Fuego,
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN




Esta información se
encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad M. de E.
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

E-8588/2023 - REMODELACIÓN DE FACHADA Y CAMBIO DE CAPINTERIAS EN CENTRO EDUCATIVO Y DE FORMACIÓN LABORAL DR. MANUÉL BELGRANO-RÍO GRANDE"-2023

El objetivo de la obra tiene por finalidad la remodelación de fachada y el cambio de aberturas del Establecimiento Educativo Centro de formación Laboral Dr. Manuel Belgrano, ubicada en Mynkyol 119 en la ciudad de Río Grande, que presenta: Mal estado de ventanas y Puertas interiores deterioradas o en mal estado, falta y oxidación de rejas perimetrales. Y el deterioro de la fachada del establecimiento. Planteamos realizar el mejoramiento de aberturas, reacondicionamiento de la fachada y la reja de la línea municipal, para que cumplan con las reglas del buen arte. La idea es lograr que el edificio se convierta en un espacio más simbólico, actualizando la fachada y carpinterías. Permitiendo una identificación mayor del mismo e intégralo al crecimiento barrial.

- Los edificios afectados por esta obra son: 1 En Río Grande 1
- Monto del contrato: \$46.308.670,07.
- Tramitado según Expte.: E - **8588/2023**.
- Plazo de ejecución de TREINTA (30) días corridos.
- Inicio de obra: 1/5/2023.
- ESTADO DE OBRA: Al 22 de diciembre de 2023 se encuentra con un avance 100 %

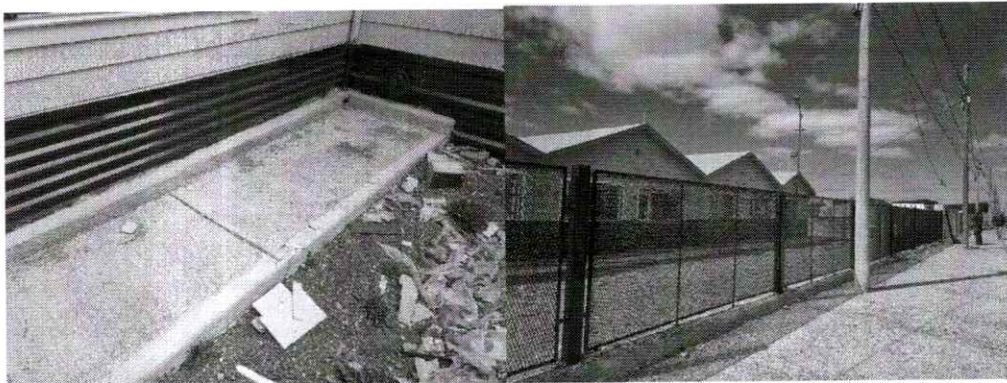

E-7464/2023 - REFACCIÓN INTEGRAL - JARDÍN DE INFANTES Nº 9 - RÍO GRANDE – 2023

El edificio a intervenir es el del JARDIN Nº 9 – "TUTU MARAMBA", de nivel inicial, los mismos tienen por objetivo dar una respuesta a las necesidades educativas de la comunidad actual y las futuras, potencializar al mejoramiento de la calidad de vida, la inclusión urbana y social de sus habitantes. Ubicada en la zona centro de la ciudad de Río Grande, es uno de los principales edificios formativos de nivel inicial de la zona. Para cumplir con su cometido, los servicios generales que conforman el edificio, deben funcionar al 100%, principalmente el sistema de calefacción que tiene como misión mantener las temperaturas de confort acorde a la normativa, sin presentar ningún tipo de interferencia, ya que la aparición de alguna anomalía conlleva a la suspensión y por consiguiente pedidas de días en el calendario anual académico, tema recurrente en estos últimos tiempos, dado el estado del sector a intervenir. Sistema de Calefacción: Por lo antes expuesto se procede a intervenir y reacondicionar la Sala de Máquinas en su totalidad y realizar el cambio completo de las cañerías del Sistema de calefacción del Establecimiento. Rampas de Acceso: El proyecto nace ante a partir de la inclusión de estudiantes con discapacidad al establecimiento y pedido reiterado por parte del equipo directivo provincial de nivel inicial para la creación de una rampa de ingreso al edificio educativo.


- Los edificios afectados por esta obra son: 1 En Río Grande 1
- Monto del contrato: \$22.501.578,93.



Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

- Tramitado según Expte.: E - **7464/2023**.
- Plazo de ejecución de TREINTA (30) días corridos.
- Inicio de obra: 25/4/2023.
- ESTADO DE OBRA: Al 22 de diciembre de 2023 se encuentra con un avance de 95 %

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministerial
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

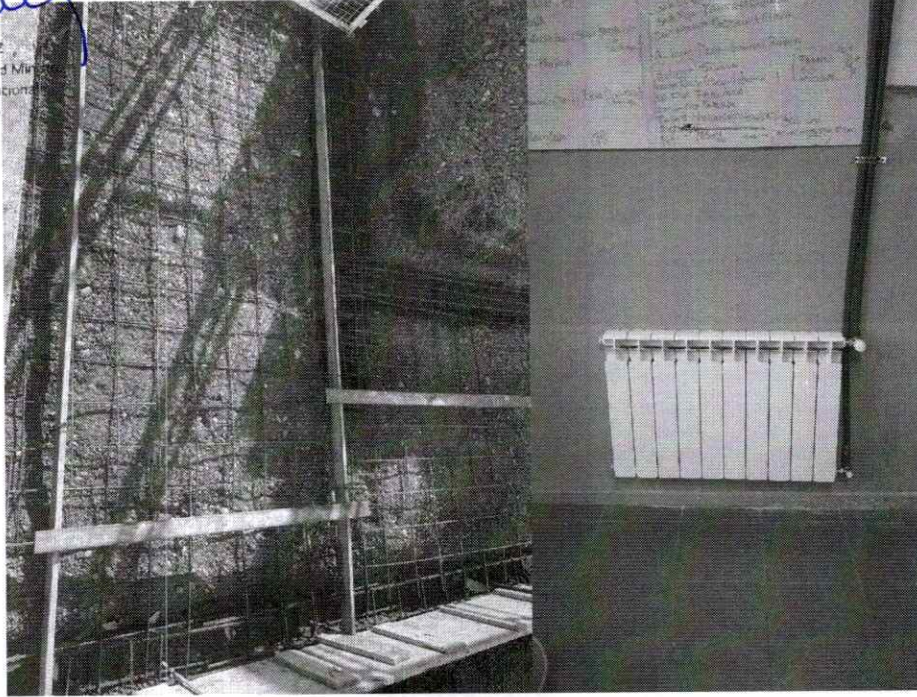

E-7458/2023 - REFACCIÓN SALA DE MÁQUINAS E INSTALACIÓN NUEVA DE GAS - COLEGIO TREJO NOEL - TOLHUIN – 2023

El objetivo de la obra es intervenir y reacondicionar la Sala de Máquinas en su totalidad y realizar el cambio completo del Sistema de calefacción del Sector más antiguo del Establecimiento, y con esto lograr un óptimo funcionamiento en los sistemas de provisión de gas, agua fría-caliente y de calefacción.

- Los edificios afectados por esta obra son: 1 En Rio Grande 1
- Monto del contrato: \$36.414.993,51.
- Tramitado según Expte.: E - **7458/2023**.
- Plazo de ejecución de TREINTA (30) días corridos.
- Inicio de obra: 5/5/2023.
- ESTADO DE OBRA: Al 22 de diciembre de 2023 se encuentra con un avance de 95%

E-9322/2023 - REMODELACION INTERNA - CENTRO EDUCATIVO DE NIVEL TERCARIO Nº 35 "PROFESOR JULIAN JOSE GODOY - RIO GRANDE – 2023

El proyecto de remodelación internas del establecimiento educativo responde a la solicitud por parte de los directivos provincial de nivel terciario para construir 5 (cinco) aulas, una de ellas está destinada para enfermería, remodelar los 4 (cuatro) sanitarios y 2 (dos) cocinas de la salas de profesores, cambio de iluminarias y circuitos independientes en las 9 (nueve) aulas existentes, revestir las escaleras con goma antideslizante, la reubicación del aula de tutores, como ampliación del edificio, urbanización que se encuentra en constante crecimiento, lo que acrecienta la necesidad de dar una mayor cobertura de vacantes para adultos pertenecientes a dicha comunidad. La remodelación consta de 5 (cinco) aulas que se organizan en dos plantas (334,77m2 superficies) a través de un eje principal de acceso.



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN

- Los edificios afectados por esta obra son: 1 En Rio Grande 1
- Monto del contrato: \$79.043.502,22.
- Tramitado según Expte.: E - 9322/2023.
- Plazo de ejecución de TREINTA (30) días corridos.
- Inicio de obra: 5/5/2023.
- ESTADO DE OBRA: Al 22 de diciembre de 2023 se encuentra con un avance de 9,03%

Cuenta una extensión de plazo de obra.



Compras

Además de lo descripto, se realizaron compras de materiales e insumos para realizar obras por administración, con personal de la Secretaría de Infraestructura:

ADQUISICIÓN DE FAN COIL, PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.

- Esta compra tiene como objetivo el normal funcionamiento de calefacción en los establecimientos solicitados, Estos trabajos serán supervisados por personal de la subsecretaría de infraestructura zona sur.
- Monto de la compra: \$17.580.000,00
- Tramitado según expediente.: 40558/23
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 6
- Estado: nota autorización al 22 de diciembre sigue igual

ADQUISICIÓN DE DOS PUERTAS PARA LA ESCUELA PROV. N°39 "MIRADOR DEL OLIVIA"

- Esta compra tiene como objetivo cambiar las dos puertas que fueron afectadas por un intento de robo en el establecimiento, Estos trabajos serán supervisados y realizados por personal de la subsecretaría de infraestructura zona sur.
- Monto de la compra: \$99.602,00
- Tramitado según expediente.: 42770/23
- Estado: nota autorización, al 22 de diciembre sigue igual.
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 1

ADQUISICIÓN DE INSUMOS VARIOS PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

- Esta compra tiene como objetivo reparaciones mínimas y de prioridad, en el mantenimiento diario de las instalaciones eléctricas, sanitarias, de gas, calefacción y carpinterías en general en varias instituciones de la ciudad de Ushuaia, Estos trabajos serán supervisados y realizados por personal de la subsecretaría de infraestructura zona sur.
- Monto de la compra: \$1.978.268,34
- Tramitado según expediente.: 43263/23
- Estado: nota autorización, al 22 de diciembre sigue igual
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 15

ADQUISICIÓN DE BOMBAS CIRCULADORAS PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.

- Esta compra tiene como objetivo el normal funcionamiento del sistema de agua de dichas instituciones, ya que, con el paso del tiempo, el uso continuo se desgasta la vida útil de los artefactos, Estos trabajos serán supervisados y realizados por personal de la subsecretaría de infraestructura zona sur.
- Monto de la compra: \$2.005.900,00
- Tramitado según expediente.: 44405/23
- Estado: nota autorización, al 22 de diciembre sigue igual
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 5



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



Esta información se

encuentra resguardada
en formato digital y
firmada digitalmente

ADQUISICIÓN DE ABERTURAS PARA LA ESC. ESPECIAL N°1 'KAYÙ CHENÈN', LA ESC. PROV. N° 48 'MUJERES VETERANAS DE GUERRA DE MALVINAS', Y OFICINA DE JUNTA DE CLASIFICACIÓN Y DISCIPLINA Y ADM. DE PERSONAL.

- Esta compra tiene como objetivo el cambio de ventanas oxidadas, y de mejor calidad para mejor ventilación ya que las que están son de paño fijo, Estos trabajos serán supervisados por personal de la subsecretaría de infraestructura zona sur.
- Monto de la compra: \$2.030.816,00
- Tramitado según expediente.:49236/23
- Estado: nota autorización, al 22 de diciembre sigue igual
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 3

ADQUISICIÓN DE PANELES ACÚSTICOS PARA AULAS DE MÚSICA DEL CENTRO POLIVALENTE DE ARTE USHUAIA "PROF. INÉS MARÍA BUSTELO"

- Esta compra tiene como objetivo aislar correctamente el sonido; la falta de esta provoca interrupciones constantes que impiden un normal dictado de clases, Estos trabajos serán supervisados por personal de la subsecretaría de infraestructura zona sur.
- Monto de la compra: \$1.701.400,00
- Tramitado según expediente.: 49127/23
- Estado: nota autorización, al 22 de diciembre sigue igual
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 1

ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS ELÉCTRICOS PARA DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS

- Esta compra tiene como objetivo cambiar y/o colocar diversos artefactos eléctricos, debido a que se encuentran sin funcionamiento o faltantes, de los edificios públicos educativos situados en la ciudad de Ushuaia, de esta forma logrando así resolver cualquier inconveniente en casos de emergencia, para mantener en óptimas condiciones todos los espacios públicos educativos, Estos trabajos serán supervisados y realizados por personal de la subsecretaría de infraestructura zona sur.
- Monto de la compra: \$17.431.000,00
- Tramitado según expediente.:52189/23
- Estado: nota autorización, al 22 de diciembre sigue igual
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 48

ADQUISICIÓN DE 1 (UN) TURBOCALEFACTOR PARA LA OFICINA DE P.O.M. y S. EN CALLE KUANIP N°1182

- Esta compra tiene como objetivo lograr que el sector de mesa de entrada de dicha oficina logre contar con la temperatura adecuada, mayormente los días de temperaturas bajas, el trabajo de instalación será realizado por personal de mantenimiento de esta Subsecretaría.
- Monto de la compra: \$45.000,00
- tramitado según expediente: 53691/2023
- Estado: nota autorización, al 22 de diciembre sigue igual
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 1

ADQUISICIÓN DE INSUMOS / ACCESORIOS PARA BAÑOS DEL COLEGIO PROVINCIAL JOSÉ MARIA SOBRAL

- Esta compra tiene como objetivo el reemplazo de los mismos ya que dará como resultado mayor cantidad de baños funcionales para los estudiantes de la comunidad educativa en cuestión.
- Monto de la compra: \$278.700,00
- Tramitado según expediente: 61539/2023
- Estado: nota autorización, al 22 de diciembre sigue igual.
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 1

ADQUISICIÓN DE UNA PUERTA DE EMERGENCIA PARA LA ESC. PROV. N°13 "ALTE. GUILLERMO BROWN"



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30º ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



- Esta compra tiene como objetivo el reemplazo de la misma, para el cierre y uso correcto de la puerta de emergencia, ya que el establecimiento debe contar con esta medida de seguridad en óptimas condiciones.
- Monto de la compra: \$580.000,00
- Tramitado según expediente: 65213/2023
- Estado: nota autorización, al 22 de diciembre sigue igual.
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 1

ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA REPARACIÓN DEL CERCO PERIMETRAL DEL JARDÍN DE INFANTES N°8 'CAMINITOS DE COLORES', de la ciudad de Ushuaia.

- Esta compra tiene como objetivo hacer el cierre debido al perímetro del jardín de infantes, ya que la reparación y correcto cerramiento del cerco perimetral es de suma importancia para la seguridad de esa comunidad educativa, como así también, para la conservación de los estados edilicios, evitando más deterioro en los mismos.
- Monto de la compra: \$1.369.406,00
- Tramitado según expediente: 70815/2023
- Estado: nota de autorización, al 22 de diciembre sigue igual.
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 1

ADQUISICIÓN DE VASOS EXPANSORES Y VÁLVULAS DE ALIVIO PARA CALDERAS DEL JARDÍN DE INFANTES N°20 "LUCERITO DE FUEGO"; DE LA ESCUELA PROV. N°22 "BAHÍA GOLONDRINA", DEL COLEGIO PROV. "LOS ANDES", Y DE COLEGIO PROV. "EVA DUARTE DE PERÓN", de la ciudad de Ushuaia.

- Esta compra tiene como objetivo realizar el reacondicionamiento de calderas, de los establecimientos mencionados.
- Monto de la compra: \$2.837.286,00
- Tramitado según expediente: 72835/2023
- Estado: nota autorización, al 22 de diciembre sigue igual.
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 4

ADQUISICIÓN DE 9 (NUEVE) CERRADURAS POMO COPA PARA EL COLEGIO PROVINCIAL "LOS ANDES", de la ciudad de Ushuaia

- Esta compra tiene como objetivo poder colocar en las puertas que se encuentran funcionando de manera inadecuada y que, a su vez, implica un riesgo innecesario para quienes hacen uso de las mismas diariamente, además de las molestias que ocasionan en el uso cotidiano. Una vez reemplazadas, se va a evitar que alguien se lastime, como así también será un beneficio para el estado de las instalaciones del edificio, soslayando mayor deterioro del mismo.
- Monto de la compra: \$174.286,89
- Tramitado según expediente: 75622/2023
- Estado: nota autorización, al 22 de diciembre sigue igual.
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 1

ADQUISICIÓN TERMOTANQUES PARA ESCUELA PROVINCIAL N°24 "JUAN RUIZ GALÁN"; ESCUELA PROVINCIAL N°16 "DR. ARTURO MATEO BAS", ESCUELA PROVINCIAL N°30 "OSHOVIA", ESCUELA PROVINCIAL N°34 "YAK-HARUIN", ESCUELA PROVINCIAL N°15 "CENTENARIO DE USHUAIA", ESCUELA PROVINCIAL N°41 "MARIO BENEDETTI", COLEGIO TÉCNICO PROVINCIAL "OLGA B. DE ARKO", COLEGIO PROVINCIAL "ERNESTO SÁBATO"

- Esta compra tiene como objetivo dar solución a los problemas existentes para el normal funcionamiento de las mencionadas instituciones, por lo cual, se debe realizar el reemplazo de los termotanques que se encuentran rotos y/o fuera de uso, perjudicando el normal funcionamiento.
- Monto de la compra: \$1.768.000,00
- Tramita según expediente: 77373/2023
- Estado: nota autorización, al 22 de diciembre sigue igual.
- Los edificios afectados por esta compra son: En Ushuaia 8



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



Esta información se encuentra respaldada en formato digital y firmada digitalmente.

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

ADQUISICIÓN DE 12 (DOCE) SISTEMAS DE DESCARGA DE PARED PARA SANITARIOS DE DIFERENTES ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS.

- Esta compra tiene como objetivo poder habilitar los sanitarios que se encuentran clausurados por no encontrarse en condiciones de ser utilizados. Dar respuesta a esta problemática, hace posible el uso requerido por las comunidades educativas que albergan las instituciones mencionadas más arriba; evitando el malestar que genera la falta de sanitarios; y a su vez, permitiría un uso más adecuado, sin sobrecargar la utilización de los que se encuentran habilitados.
- Monto de la compra: \$4.200.000,00
- Tramitado según expediente: 85749/2023
- Estado: nota autorización, al 22 de diciembre sigue igual.
- Los edificios afectados por esta compra son: en Ushuaia 5.

ADQUISICIÓN DE 2 (DOS) TERMOTANQUES: UNO PARA EL JARDÍN DE INFANTES N°2 "BARQUITO TRAVIESO"; Y OTRO PARA LA ESCUELA PROVINCIAL N°48 DE LOS ALAKALUFES.

- Esta compra tiene como objetivo el cambio de dos termotanques que se encuentran fuera de uso y perjudican el normal funcionamiento de las áreas que afectan. Específicamente, el del Jardín de Infantes, deja al sector cocina sin agua caliente; y el de la Escuela Provincial N°48, afecta a toda la institución, lo que implica que toda la escuela no posee agua caliente.
- Monto de la compra: \$ 1.520.000,00
- Tramitado según expediente: 87141/2023
- Estado: nota autorización, al 22 de diciembre sigue igual.
- Los edificios afectados por esta compra son: en Ushuaia 5.

S-SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LOS EQUIPOS GENERADORES DE AIRE CALIENTE EN RECESO DE VERANO, PARA ESTABLECIMIENTOS ESCOLARES.

- Este servicio tiene como objetivo proceder a la contratación de un proveedor, con fines de ejecutar las tareas generales descritas, para realizar reparaciones en equipos fuera de uso y poder asistir a las urgencias edilicias que surgen durante el uso de los establecimientos, mientras se desarrollan las actividades de verano y así poder garantizar el buen funcionamiento de los equipos, la protección de los inmuebles y evitar daños mayores, beneficiando la conservación de los mismos y manteniéndolos en buenas condiciones durante más tiempo.
- Monto de la contratación: \$13.581.800,00
- Tramitado según expediente: 6709/2023
- Los edificios afectados por esta compra son: en Ushuaia 26
- Estado: finalizado, se pagó el 30 de octubre de 2023

S-SERVICIO DE READECUACION DE INSTALACION DE GAS DE LA ESCUELA PROVINCIAL N° 31 "JUANA MANSO" -USHUAIA

- Este servicio se contrató con el fin de dar solución a el siniestro ocurrido el día miércoles 08/03/23, en el cual se produjo un principio de incendio en una de las dependencias del sector de secretaría del establecimiento antes mencionado, por tal motivo se requiere dar intervención de un gasista matriculado para realizar los trabajos de cambio de artefactos, colocación de artefactos, mantenimiento de artefactos instalados, colocación de conductos adecuados en artefactos, cambio de cableado eléctrico, sujeción de cañería existente, cambio de ductos. solicitud de inspección ocular y final del establecimiento.
- Monto de la contratación: \$ 5.910.000,00
- Tramitado según expediente: 35578/2023
- Los edificios afectados por esta contratación son: en Ushuaia 1
- Estado: documentación de pago en proceso.

Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Miembro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE TUBOS RADIANTES, SERVICE Y PUESTA A PUNTO DE CALDERAS DEL COLEGIO PROV. 'ANTONIO MARTE' – ESC. PROV. N°47 DEL VALLE DE ANDORRA"

- Este servicio se contrató con el fin de dar cumplimiento a lo recomendado por la Inspección dependiente de la Subsecretaría de Infraestructura Zona Sur, para realizar el servicio de limpieza y reparación de la totalidad de los tubos radiantes, con fines de ejecutar las tareas generales, reparaciones en equipos fuera de uso y/o defectuosos, y así poder garantizar el buen funcionamiento de los sistemas de calefacción, la protección de los inmuebles y evitar daños mayores.

Se aclara que ambas instituciones comparten el edificio.

- Monto de la contratación: \$2.850.000,00
- Tramitado según expediente: 68877/2023
- Los edificios afectados por esta contratación son: en Ushuaia 1
- Estado: finalizado, se pagó el 20 de diciembre de 2023

"SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y PUESTA A PUNTO DEL SISTEMA DE CALEFACCIÓN DE CALDERAS, PARA EL JARDÍN DE INFANTES N°2 'EL BARQUITO TRAVIESO' - USHUAIA"

- Este servicio se contrató con el fin de dar cumplimiento a lo recomendado por la Inspección dependiente de esta Subsecretaría. La cual demanda tareas de mantenimiento y reacondicionamiento de los sistemas de calefacción de todo el edificio, específicamente de 2 (dos) calderas y 32 (treinta y dos) radiadores, a fin de prevenir los problemas de bajas temperaturas, que conllevan a la suspensión de actividades y pérdida de clases.
- Monto de la contratación: \$ 1.624.001,00
- Tramitado según expediente: 71338/2023
- Los edificios afectados por esta contratación son: en Ushuaia 1
- Estado: pase a dictamen.

También se realizaron contratación de servicios de pintura para realizar obras por empresas o cooperativa:

SERVICIOS DE PINTURA. -

E-11019/2023 - SERVICIO DE PINTURA PARA COLEGIO PROVINCIAL COMANDANTE LUIS PIEDRABUENA - RIO GRANDE-2023.-

Este servicio tiene como objetivo la contratación de mano de obra para pintura interior y colocación de membrana líquida en techos en el establecimiento educativo.

- Los edificios afectados por esta obra son: En rio grande 1
- Monto del contrato: \$18.581.900,00
- Tramitado según Expte.: 11019/23
- Inicio de obra: a la espera.
- ESTADO: 22 de diciembre documentación en curso.

SERVICIO DE PINTURA PARA VARIAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DE LA CIUDAD DE USHUAIA.

- Este servicio tiene como objetivo es la contratación de mano de obra para pintura en:
- Muros exteriores: C.A.A.D, Escuela Prov. N°13 "Alte. Guillermo Brown", Jardín Materno Infantil "Veó Veó", Escuela Especial N°1 "Kayú Chenén", Jardín de Infantes N°15 "Trencito Nevado", y Colegio Prov. "Ernesto Sábato"



Gobierno de
Tierra del Fuego
Antártida e Islas
del Atlántico Sur

"2024- 30° ANIVERSARIO DE LA DISPOSICIÓN TRANSITORIA PRIMERA DE LA CONSTITUCIÓN NACIONAL DE 1994"

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

MINISTERIO DE EDUCACIÓN



- Pintura interior de paredes y cielorrasos: C.A.A.D. y la Escuela Provincial N°30 "Oshovia" o Techos: Escuela Provincial N°30 "Oshovia". Monto del contrato: \$6.600.000,00
- Tramitado según Expte.: 11319
- Estado: pagado el 9 de noviembre del 2023.

Esta información se
encuentra resguardada
en formato digital y/o
firmada digitalmente

Nancy E. Dominguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación

Firmado Electrónicamente por
AGENTE RIZZI SERGIO JAVIER
Gobierno de Tierra del Fuego
DIRECTOR PROVINCIAL DE PROYECTOS ZONA
NORTE Y CENTRO
08/04/2024 12:59



Esta información se encuentra resguardada en formato digital y/o firmada digitalmente

Nancy E. Domínguez
Directora de Administración Unidad Ministro
Subsecretaría de Apoyo Institucional
Ministerio de Educación
